
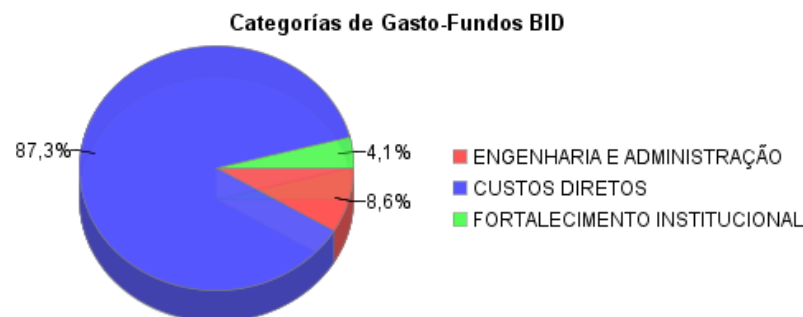
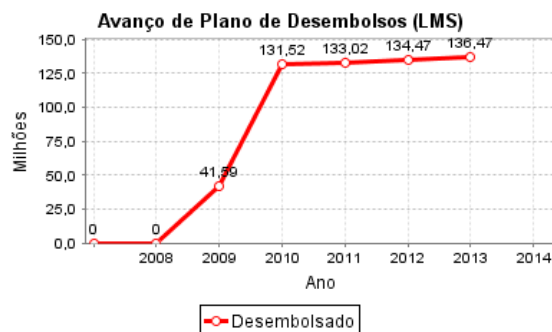



## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
Setor:	TRANSPORT				
Número da Operação:	1957/OC-BR	Atual:	176.775.000,00	Original BID:	176.775.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	135.473.454,10	Corrente BID:	176.775.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	76,64	Pari-passu:	66,00
Operação Relacionada:	BR-T1089, BR-T1276	Saldo:	41.301.545,90	Cofinanciamento/País:	93.110.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	269.885.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2013

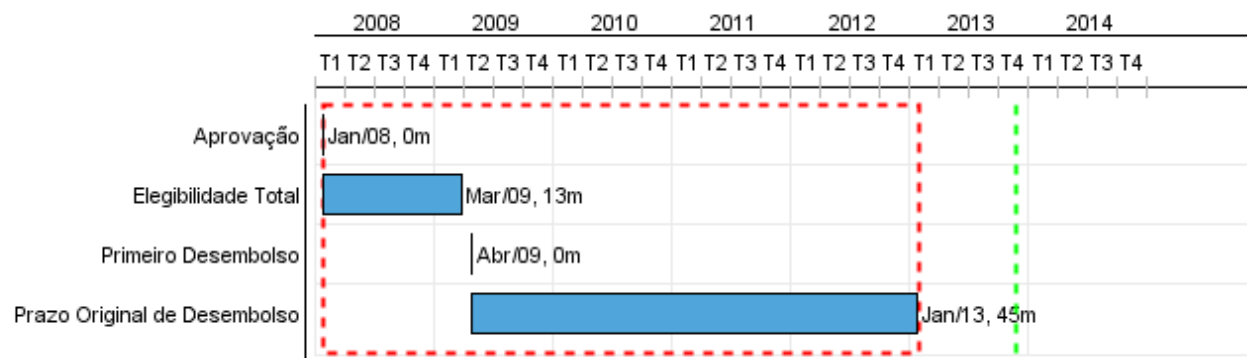

## Progresso Acumulado até 2013

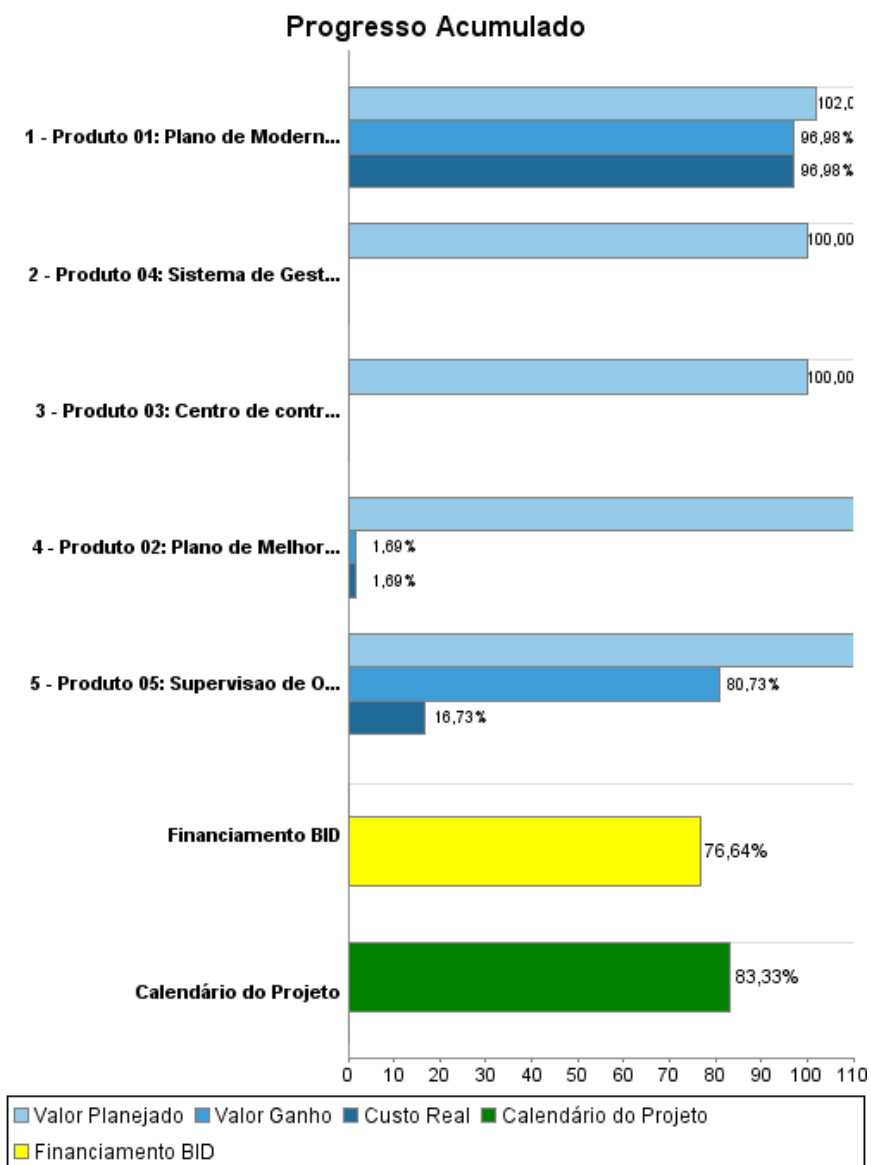

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Mobilidade e acessibilidade da população do Distrito Federal, melhorada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Opiniões favoráveis (boa a excelente) dos habitantes do DF.	%	17,40	2008	P A	30,00	30,00
Tempo de viagem dos usuários do sistema de Ônibus.	Minutos	67,00	2008	P A	56,00	56,00
Tempo de viagem dos usuários que utilizam operação integrada.	Minutos	86,00	2008	P A	82,00	82,00
Tempo de espera nas paradas de ônibus.	Minutos	30,00	2008	P A	15,00	12,00
Índice de Passageiro por Quilômetro (IPK).	IPK	9,00	2008	P A	12,00	12,00
Custos de operação dos ônibus.	US\$ / km	0,86	2008	P A	0,78	0,78

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Condições de mobilidade e acessibilidade da população do Distrito Federal, em particular aquela de menores recursos, aumentando a integração dos núcleos urbanos da área metropolitana de Brasília - Melhorada.</b>									
Produto 01: Plano de Modernização para integração do transporte público coletivo (TPC), implementado.	Plano				1,00	7.000.000,00	564.281,00		213.433.000,00
Produto 02: Plano de Melhora na Circulação e nas condições de segurança do transporte motorizado e não motorizado, implementado.	Plano				1,00	5.000.000,00	20.000,00		21.100.000,00
Produto 03: Centro de controle operacional de trânsito, operando.	Centro				1,00				4.285.000,00
Produto 04: Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público, implementado.	sistema				1,00				5.100.000,00
<b>Fortalecimento Institucional</b>									
Produto 05: Supervisão de Obras, contratada.	contratos	1,00	1,00		4,00	1.000.000,00			4.800.000,00
<b>Outros - Administração e Supervisão do Programa</b>									
Administração do Programa	N/A					989.000,00	1.384.993,00		16.450.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>13.989.000,00</b>	<b>1.969.274,00</b>		<b>265.168.000,00</b>
