

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HA-X1014	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/18/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/18/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Rural Water and Sanitation Program (II)	<b>Loan Number</b>	GRT/WS-12147-HA
<b>Executing Agency</b>	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	GRAVEL,DENIS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Investment Grants	<b>Country</b>	HAITI
<b>Lending Instrument</b>		<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>			


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-X1014	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	9,969,232.36	99.69%	30,767.64
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	9,969,232.36	99.69%	30,767.64

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

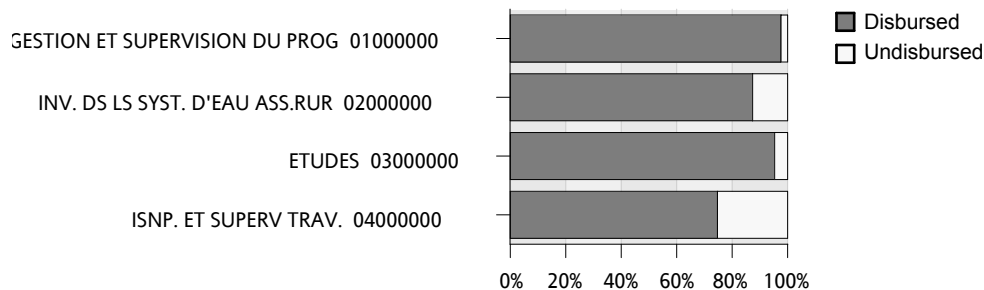

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Nuevos consumidores que reciben servicios de agua potable a través de sistemas nuevos o rehabilitados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	3.2.1 Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Households (#)	0.0	2010	P			5,000.00	10,000.00			10,000.00
					P(a)	3,400.00	4,200.00	2,000.00	1,800.00	600.00		12,000.00
					A	3,350.00	4,500.00	666.00	2,735.00	1,203.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Recepcion obras civiles

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No						
	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A						0.00	
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A						0.00	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Establecimiento Educativo y/o Mercado Publico beneficiado con nuevo acceso o acceso mejorado a agua potable	Establecimiento	0.0	2010	P							
					P(a)			5.00	4.00	0.00		9.00
					A		0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes Semestrales, informes de seguimiento

<b>Pro-Gender</b>		No	<b>Pro-Ethnicity</b>		No
-------------------	--	----	----------------------	--	----

**Outcome Nbr. 2:** Nuevos consumidores que reciben servicios de saneamiento a través de sistemas nuevos o rehabilitados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.0	Personas Beneficiadas en los centros educativos y centros de salud	Personas	0.0	2010	P							
					P(a)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00		1,800.00
					A			1,874.00	200.00	0.00	0.00	

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Establecimientos educativos y/o mercados publicos beneficiados con acceso nuevo o mejorado a saneamiento por redes o con nueva solución individual de saneamiento adecuada	Establecimiento Educativo	0.0	2010	P							
					P(a)			5.00	4.00	2.00		11.00
					A			6.00	1.00	0.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes Semestrales e informes de seguimiento

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

**Outcome Nbr. 3:** Metodología para la realización de Proyectos rurales (diseño, construcción, operación y mantenimiento).

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
3.1	Metodología publicada	Metodología	0.0	2010	P	1.00						1.00
					P(a)	1.00		0.00	1.00	0.00		1.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Publicacion del manual.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

**Outcome Nbr. 4:** Sistemas en Operacion

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
4.1	Sistemas financieramente sostenibles (ingresos > costos de administración, operación y mantenimiento)	Sistema	0.0	2010	P							
					P(a)			28.00	15.00	5.00		48.00
					A		0.00	36.00	23.00	0.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales. Seguimiento de los indices de funcionamiento del sistema. Evaluacion final

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

4.1	Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño (Poblaciones entre 1.000 y 10.000 hab)	Sistema	0.0	2010	P							
					P(a)	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00		5.00
					A	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales, Seguimiento de indices de operacion, Evaluacion final.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
4.2	Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño (Poblaciones menores de 1.000 hab)	Sistema	0.0	2010	P						
					P(a)	30.00	22.00	2.00	0.00	0.00	55.00
					A	30.00	23.00	3.00	0.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales, seguimiento de los indices de operacion, evaluacion final

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 5:** Refuerzo Institucional

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
5.1	Entidades Rurales Departamentales siguiendo las directrices de la metodología elaborada (URD)	Entidad	0.0	2010	P						
					P(a)		0.00	1.00	0.00		1.00
					A		0.00	1.00	1.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes del DMR (Departamento Medio Rural) DINEPA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 6:** Poblacion afectada por geohelminthos.

**Observation:** Durante el año 2013, el MSPP ha realizado una sola campaña de desparasitado (#38797863) que se realizó en Junio. Esta campaña se reporta en los outputs. En el documento « Evaluation de la prévalence des helminthiases intestinales chez les enfants de 6 à 15 ans scolarisés en Haïti, Octobre 2013 » (#38797769). Se indica que la prevalencia de parásitos en el Departamento del Artibonite es del 4.3%. La población seleccionada ha sido los niños entre 5 a 15 años.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
6.1	Población de las comunidades beneficiarias del programa infectada por geohelminthos en Artibonite	Porcentaje	33.0	2003	P	25.00	20.00	15.00	10.00		10.00
					P(a)	25.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

6.1	Población de las comunidades beneficiarias del programa infectada por geohelminths en Artibonite	Porcentaje	33.0	2003	A	29.00	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
Details												
Means of verification: Informe anual del Ministerio de Salud Pública / Estudio especial suministrado por la división de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 7: Rentabilidad Interna del Proyecto

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
7.1	Tasa Interna de rentabilidad Economica	Porcentaje	12.0	2010	P				12.00			12.00
					P(a)				12.00	12.00		12.00
					A				0.00	0.00	0.00	
Details												
Means of verification: Antes/Despues de la evaluacion. Base de referencia en funcion de la evaluacion economica.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Inversiones en Sistemas de agua y saneamiento en el medio rural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
1.1	Sistemas comunales de agua potable construidos o rehabilitados (poblaciones entre 1.000 y 10.000 personas)	Sistema	P	12	5,263,000
			P(a)	7	4,273,845.74
			A	6	3,392,281.29
1.2	Bloques sanitarios construidos y operativos en escuelas públicas y mercados publicos	Bloques Sanitarios	P	10	268,000
			P(a)	9	426,465.71
			A	8	377,510.27
1.3	Entrega de los datos del Inventario para el Departamento (del Artibonite)	Inventario	P	0	0
			P(a)	1	198,250.5
			A	1	198,250.5
1.4	Sistemas Comunitarios de agua potable construidos o rehabilitados (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Sistemas	P	0	0
			P(a)	56	969,360.27
			A	56	919,360.27

#### Component Nbr. 2 Promoción, extensión comunitaria e iniciación y seguimiento de proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
2.1	Campañas de sensibilización e información	Campaña	P	15	165,000
			P(a)	4	246,109.39
			A	4	183,044.11
2.2	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Organizacion	P	0	0
			P(a)	10	32,000
			A	9	29,856.74
2.3	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Organizacion	P	0	0
			P(a)	56	32,000
			A	56	22,000
2.4	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Organizacion	P	0	0
			P(a)	10	32,000
			A	9	29,856.24
2.5	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Organizacion	P	0	0
			P(a)	56	32,000
			A	56	22,000
2.6	Talleres de Formacion	Taller	P	0	0
			P(a)	7	63,589.35
			A	7	61,687.2

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
Output	Unit of Measure				
3.1 Entidad Gubernamental sub-nacional equipadas	Entidad	P		0	11,837
		P(a)		2	222,215.45
		A		3	217,100.91
3.2 Entidades gubernamentales sub-nacionales en operacion y haciendo el seguimiento de las actividades programadas y de los Consultores de apoyo	Entidad	P		0	0
		P(a)		5	438,434.44
		A		5	403,332.38
3.3 Manual de Gestion de sistemas rurales elaborado	Manual	P		0	0
		P(a)		1	26,297.79
		A		0	41,348.55
3.4 Manual de Reglamento de tarifas de sistemas rurales elaborado	Reglamento	P		0	0
		P(a)		0	10,000
		A		0	0

#### Component Nbr. 4 Erradicacion de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
Output	Unit of Measure				
4.1 Campaña anual de deparasitación (de geohelminthos) realizada.	Campaña	P		6	560,000
		P(a)		7	500,000
		A		7	500,000

#### Other Cost

Administracion	P		60,760
	P(a)		1,238,065.21
	A		1,131,439.37
Auditorias	P		
	P(a)		311,050.93
	A		234,977.89
Imprevistos	P		
	P(a)		200,000
	A		0

#### Total Cost

Total Cost	P		10,213,597
	P(a)		9,540,548.43
	A		8,052,909.37



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
