

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1124	Chief of Operations Validation Date	10/05/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Quito Metropolitan Urban Transport System	Loan Number	2882/OC-EC-1
Executing Agency	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO (EPMQ)	Sector/Subsector	TR - TRANSPORT
Team Leader	ORDUZ,FERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	EC-L1111
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1111	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	90,000,000	90.00%	10,000,000
EC-L1124	100,000,000	100,000,000	253,000,000	0	353,000,000	100,000,000	23,063,294	23.06%	76,936,706
Aggregated	200,000,000	200,000,000	253,000,000	0	453,000,000	200,000,000	113,063,294	56.53%	86,936,706

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

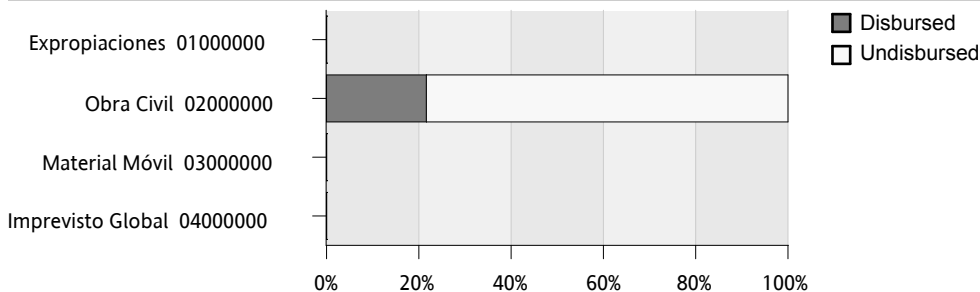

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir a mantener la participación modal del transporte público en viajes motorizados.

Observation:

Observation:						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Porcentaje de participación modal del Transporte Público en Viajes Motorizados	Porcentaje	76.0	2012	P	76.00
					P(a)	76.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta de Movilidad 2018 de la Secretaría de Movilidad						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Movilidad urbana en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Tiempo de viaje para usuarios del transporte público	Minutos promedio por pasajero	38.5	2012	P		23.10
					P(a)		23.10
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de Movilidad EDM11 y Encuesta a Usuarios de Metro Quito 2018; ambos elaborados por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ)

Observations: Tiempo de viaje puerta a puerta (incluye caminata, espera y trayecto en el vehículo) de usuarios del sistema de buses que tomarán el sistema Metro. En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto este tiempo de viaje sería de 42.5 minutos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.2	Pasajeros por día en el Sistema de Metro	Pasajeros	0.0	2012	P		369,714.00
					P(a)		369,714.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Observations: Se estima que el 87% de los usuarios del metro provendrán de usuarios regulares del transporte público, 10% de autos particulares y 3% nuevos viajes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.3	Nivel de ocupación de pasajeros del Metro	Pasajeros por m2	0.0	2012	P		6.00
					P(a)		6.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.4	Porcentaje de usuarios satisfechos con el Metro	Porcentaje	0.0	2012	P		65.00
					P(a)		65.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Porcentaje de usuarios satisfechos con el Metro	Porcentaje	0.0	2012	A		
Details							
Means of verification: Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Metro de Quito, realizada por la EPMMQ							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Outcome Nbr. 2: Eficiencia operacional en el sistema integrado de transporte público del DMQ mejorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Costos de operación de la flota vehicular de Quito	Millones de USD por año	999.0	2012	P		1,181.00
					P(a)		1,181.00
					A		

Details							
Means of verification: Modelo Socio-Económico 2018 con base en los costos de insumos. Incluye encuesta de actualización de los costos de insumos. EPMMQ							
Observations: En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto este costo de operación sería de US\$ 1249 millones.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.2	Porcentaje de rutas alimentadoras del Metro en funcionamiento	Porcentaje	0.0	2012	P		100.00
					P(a)		100.00
					A		

Details							
Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ							
Observations: El funcionamiento de las Rutas Alimentadoras significa que (i) los recorridos actuales de buses han sido reestructurados, (ii) El sistema de tarifas está integrado entre buses y metro, y (iii) los pasajeros tiene la facilidad física de transferirse al si							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.3	Porcentaje de la flota de Buses del DMQ bajo un sistema de recaudo unificado	Porcentaje	30.0	2012	P		90.00
					P(a)		90.00
					A		

Details							
Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Significa que la tecnología del Sistema es compatible e interoperable con el sistema de recaudo del Proyecto Metro.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Nivel relativo de las emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero mantenido

Observation: Se pedirá asesoramiento a un experto ambiental y este indicador será reformulado

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
3.1	Emisiones de Gases de Efecto Invernadero	Millones de toneladas por año	1201.0	2012	P		1,407.00
					P(a)		1,407.00
					A		

Details

Means of verification: Modelo Socio-Económico 2018; EPMMQ y registros de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Quito.

Observations: Emisiones totales de la flota de transporte público y la flota de vehículos particulares. En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto las emisiones sería de 1.472 millones de toneladas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Obra civil, instalaciones Terminadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Túnel revestido terminado	Km de túnel	P	5	22	28,493,668	109,027,955
			P(a)	5	22	13,086,577.97	92,182,619
			A	2.41	2.41	16,011,137.18	58,812,565.21
1.2	Estaciones en obra gris terminadas	Número de estaciones	P	1	15	16,851,387	64,480,020
			P(a)	1	15	6,952,961.81	51,158,496.35
			A	0	2	8,506,794.18	31,247,398.72
1.3	Talleres y cochera terminados para recepción de trenes	Número de cocheras	P	1	1	5,616,786	21,492,025
			P(a)	1	1	987,556.04	11,372,030.01
			A	0	0	1,208,252.86	4,438,188.83
1.4	Instalaciones terminadas	Sistema	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	2,972,904.18	12,696,190.47
			A	0	0	3,636,282.16	13,359,568.45

Component Nbr. 2 Componente II. Material Rodante Entregado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Material Rodante Recibido	Número de trenes	P	0	18	0	0
			P(a)	0	18	0	0
			A	0	0		0

Component Nbr. 3 Componente III. Fiscalización, Gerencia Técnica y Supervisión Terminada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Informes Mensuales de Fiscalización	Número de informes	P	12	44	0	0
			P(a)	12	44	0	0
			A	6	16		0
3.2	Informes Trimestrales de Gerencia Técnica	Número de informes	P	4	14	0	0
			P(a)	6	14	0	0
			A	2	2		0
3.3	Informes de Resultados de Fiscalización Material Rodante	Número de informes	P	12	28	1,000,000	5,000,000
			P(a)	12	28	1,000,000	5,000,000
			A	3	3	1,063,955.17	5,000,000

Other Cost

	Auditorias y evaluación	P			0	0
		P(a)			0	0
		A				0
	Expropiaciones	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			8,834,214.11	8,834,214.11
	Imprevisto global	P			0	0
		P(a)			0	0
		A				0
	Reajuste de precios (inflación)	P			0	0
		P(a)			0	0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			51,961,841	200,000,000
		P(a)			25,000,000	172,409,335.83
		A			39,260,635.66	121,691,935.32

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
