

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1023	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/20/17
Last Update	03/22/17	Country Representative Validation Date	04/20/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	My School is Making Progress	Loan Number	2018/OC-GU, 2018/OC-GU-1, 2018/OC-GU-2, 2018/OC-GU-3
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION DE GUATEMALA	Sector/Subsector	ED - EDUCATION
Team Leader	MORDUCHOWICZ,ALEJANDRO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	GUATEMALA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1023	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	111,956,252.41	74.64%	38,043,747.59
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	111,956,252.41	74.64%	38,043,747.59

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

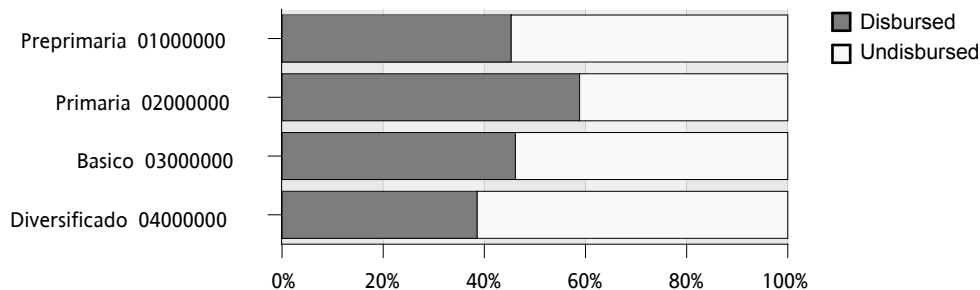

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Calidad de la educación preprimaria y primaria en Guatemala mejorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Cobertura neta de preprimaria (5 y 6 años) en los 166 municipios focalizados	Tasa	0.39	2011	P		0.65
					P(a)		0.52
					A		

Details

Means of verification: Construcción de nuevas escuelas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Incorporación en edad apropiada (7 años o menor) a la primaria en los 166 municipios focalizados	Tasa	0.84	2011	P		0.89
					P(a)		0.88
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Promoción anual de 1° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.68	2011	P		0.80
					P(a)		0.75
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Promoción anual de 2° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.77	2011	P		0.80
					P(a)		0.80
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.5	Promoción anual de 3º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.82	2011	P		0.80
					P(a)		0.84
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.6	Deserción de 1º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.07	2011	P		0.05
					P(a)		0.05
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.7	Deserción de 2º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.04	2011	P		0.03
					P(a)		0.03
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.8	Logro en las pruebas en competencias básicas de lectoescritura y matemática en 1° y 3° grado en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/12)	Porcentaje	0.0	2014	P		60.00
					P(a)		5.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details							
Means of verification: Registro de las pruebas evaluadas							
Observations: Esta meta se levantará en el 2012							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.9	Docentes con dominio del idioma de la comunidad trabajando en los tres primeros grados de la primaria en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/13)	Porcentaje	0.0	2013	P		45.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Observations: Esta meta se levantará en el 2013							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.10	Tiempo de clase efectivos en las escuelas de los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/2013)	Dias	132.0	2013	P		132.00
					P(a)		180.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de maestros de dias impartidos de clase							
Observations: Esta meta se levantará en 2013							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.11	Niños y niñas beneficiados por la rehabilitación de escuelas	Students (#)	0.0	2011	P		48,000.00
					P(a)		48,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de matriculación							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
	Afro-descendant				P		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Afro-descendant				P(a)		
					A		
	Boys				P		
					P(a)	24,000.00	
					A		
	Girls				P		
					P(a)	24,000.00	
					A		
	Indigenous				P		
					P(a)	28,800.00	
					A		
	Men				P		
					P(a)		
					A		
	Post-secondary				P		
					P(a)		
					A		
	Pre-primary				P		
					P(a)	14,400.00	
					A		
	Primary				P		
					P(a)	31,200.00	
					A		
	Secondary				P		
					P(a)	2,400.00	
					A		
	Women				P		
					P(a)		
					A		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.12	Deserción de 3er grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.04	2011	P		
					P(a)		0.03
					A		
Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento de la infraestructura escolar

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Construcción, reparación, ampliación y equipamiento de otros niveles educativos.	Escuelas	P		5		10,000,000
			P(a)	0	12	0	2,831,154
			A	4	10	87,734	2,674,190
1.2	Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones mayores - Emergencia)	Escuelas	P		0		0
			P(a)	35	150	5,000,000	18,558,918
			A	25	105	1,519,085	14,473,949
1.3	Aulas dotadas con mobiliario escolar	Aulas	P		0		0
			P(a)	600	1,285	1,000,000	3,000,000
			A	0	0	0	0
1.4	Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones menores - OPF)	Escuelas	P		0		0
			P(a)	17	3,481	170,000	23,801,181
			A	0	3,401	123,154	23,294,931
1.5	Escuelas de preprimaria y primaria, con aulas reparadas y/o nuevas	Escuelas	P		0		0
			P(a)		88		8,455,561
			A		85		6,441,051
1.6	Aulas construidas de preprimaria y primaria, mediante módulos prefabricados	Aulas	P		0		0
			P(a)		1,285		24,600,000
			A		0		0
1.7	Escuelas de preprimaria y primaria con remozamientos	Escuelas	P		0		0
			P(a)		240		13,200,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Docentes de primer ciclo de primaria recibiendo capacitacion y acompañamiento en lectoescritura y matematicas en los 166 municipios focalizados.	Teachers (#)	P	2,000	11,000	3,271,852	13,721,209
			P(a)	0	19,584	0	927,227
			A	0	19,584	0	927,227
2.2	Escuelas monolingües y bilingües con bibliotecas escolaes en los 166 municipios focalizados.	Escuelas	P		27,800		18,298,862
			P(a)	10,000	27,800	2,200,000	42,637,139
			A	0	27,800	0	30,809,353
2.3	Desarrollo e implementacion de evaluaciones didácticas en lengua y matemáticas en los tres primeros grados de las escuelas de los 166 municipios focalizados realizadas periódicamente.	Evaluaciones	P	1	4	250,000	1,620,233
			P(a)	0	3	0	942,673
			A	0	3	0	942,673
2.4	Sistema de caracterizacion sociolingüística de 6000 escuelas rurales.	Escuelas	P		6,000		100,000
			P(a)	0	4,170	0	209,766
			A	0	4,170	0	209,766
2.5	Diseño del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar.	Sistema	P		1		40,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.6	Implementacion del piloto del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar, en 500 escuelas beneficiarias por el programa.	Escuelas	P		500	20,000	220,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.7	Implementacion del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		1,403,517
			A		1		1,403,517

Other Cost

	Adminstración del Programa	P			1,774,000	9,000,000
		P(a)			1,500,000	9,432,864
		A			603,379	5,620,152
	Gastos incurridos entre 2009 y 2012 que no pudieron asignarse en su momento debido a la naturaleza por resultados del programa	P				0
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			29,565,852	150,000,304
		P(a)			20,670,000	150,000,000
		A			2,333,352	86,796,809

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Docentes con dominio del idioma de la comunidad trabajando en los tres primeros grados de la primaria en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/13)	Modify Outcome Indicator	Se actualizaron datos históricos según informes de progreso y EFAS.	01/31/2017	01/31/2017
