

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | PN-G1003 | Chief of Operations Validation Date | 04/04/18 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2017 | Division Chief Validation Date | 04/04/18 |
| Last Update | 04/03/18 | Country Representative Validation Date | 05/01/18 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Operation Name | Rural and Indigenous Water and Sanitation Program in Panama | Loan Number | GRT/WS-13329-PN |
| Executing Agency | MINISTERIO DE SALUD | Sector/Subsector | AS-AGR - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN |
| Team Leader | GRAU BENAIGES, JAVIER | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Investment Grants | Country | PANAMA |
| Lending Instrument | | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| Impacts Category | B | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| PN-G1003 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 15,000,000 | 7,500,000 | 4,762,208.47 | 63.50% | 2,737,791.53 |
| Aggregated | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 15,000,000 | 7,500,000 | 4,762,208.47 | 63.50% | 2,737,791.53 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

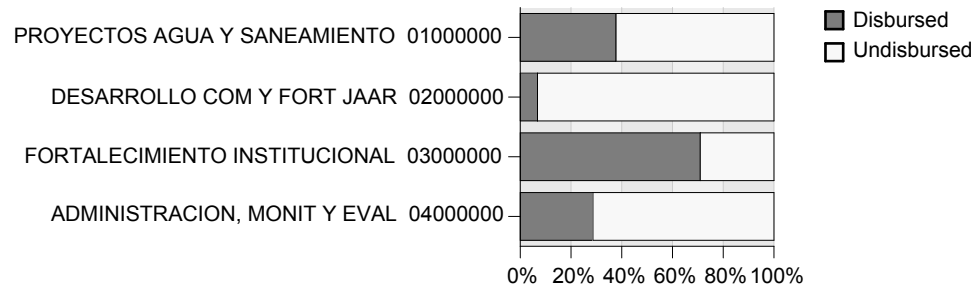

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento del acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas de la región de Panamá Este, la Provincia de Darién y la Comarca Guna Yala.

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.1 | Cobertura de agua potable a nivel nacional | % | 92.90 | 2012 | P | | 93.30 |
| | | | | | P(a) | | 93.30 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Línea de Base (Censo 2010). Informe MINSA sobre la base de datos censales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.2 | Cobertura de saneamiento a nivel nacional | % | 94.50 | 2012 | P | | 94.90 |
| | | | | | P(a) | | 94.90 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Línea de Base (Censo 2010). Informe MINSA sobre la base de datos censales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|--|----------------|---------------|------|------|------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|
| 1.1 | Hogares indígenas con acceso domiciliar a agua potable en zona de intervención | Households (#) | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 876.00 | 2,139.00 | | | | 7,696.00 |
| | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.00 | 1,690.00 | 500.00 | 548.00 | 7,696.00 |
| | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 277.00 | 514.00 | | | |

Details

Means of verification: Informes semestrales del MINSA

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|-----------------|---------------|----|
| | Afro-descendant | P | |
| | | P(a) | |
| | | A | |
| | Indigenous | P | |
| | | P(a) | |
| | | A | |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|---|----------------|---------------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.2 | Hogares indígenas con solución de saneamiento en zona de intervención | Households (#) | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 876.00 | 2,139.00 | | | | 4,575.00 |
| | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.00 | 1,690.00 | 1,000.00 | 1,242.00 | 4,575.00 |
| | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00 | | | |

Details

Means of verification: Informes semestrales del MINSA

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|-----------------|---------------|----|
| | Afro-descendant | P | |
| | | P(a) | |
| | | A | |
| | Indigenous | P | |
| | | P(a) | |
| | | A | |

| Indicator | Unit of | Baseline | Baseline | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|---------|----------|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|-----------|---------|----------|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | Measure | | Year | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--|--------|
| 1.3 | Hogares no indígenas con acceso domiciliar a agua potable en zona de intervención | Households (#) | 411.00 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 372.00 | | | | 929.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | | 929.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | | | |

Details

Means of verification: Informes Semestrales del MINSA

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Afro-descendant | | | | P | | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | | | |
| | Indigenous | | | | P | | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | | | |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|--|----------------|---------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|----------|
| 1.4 | Hogares no indígenas con solución de saneamiento en zona de intervención | Households (#) | 538.00 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 372.00 | | | 1,056.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Details

Means of verification: Informes Semestrales del MINSA

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Afro-descendant | | | | P | | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | | | |
| | Indigenous | | | | P | | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | | | |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|--|--------------------|---------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1.5 | Consumo de agua (litros/persona/día) en comunidades rurales (zona de intervención) | litros/persona/día | 16.00 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|---------------|---------------|------|------|----------|----------|-------|-------|------|----------|
| 1.5 | Consumo de agua (litros/persona/día) en comunidades rurales (zona de intervención) | litros/persona/día | 16.00 | 2012 | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Evaluación Económica Ex-post | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
| 1.6 | Costo de provisión de agua a un hogar típico (US\$/m3) en zona de intervención | US\$/m3 | 6.19 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | | | | 0.50 |
| | | | | | P(a) | | | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Evaluación Económica Ex-post | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
| 1.7 | Cobertura de agua potable en zona de intervención | % | 58.80 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 99.00 | | | | 99.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 74.00 | 99.00 | | 99.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.80 | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Informe MINSA sobre datos censales. | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
| 1.8 | Cobertura de Saneamiento en zona de intervención | % | 24.20 | 2013 | P | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 65.00 | | | | 65.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 45.00 | 65.00 | | 65.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Informe MINSA sobre la base de datos censales | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
| 1.9 | Hogares cuyas aguas residuales son tratadas | Households | 0.00 | 2013 | P | 0.00 | 0.00 | 1,022.00 | 2,511.00 | | | | 3,533.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|------|---------------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1.9 | Hogares cuyas aguas residuales son tratadas | (#) | 0.00 | 2013 | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.00 | 2,335.00 | 1,000.00 | 1,760.00 | 3,533.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00 | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Informes semestrales del MINSA | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | | No | | | | | |
| | Indigenous | | | | P | | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | 1,954.00 | 798.00 | | 2,752.00 |
| | | | | | A | | | | 0.00 | 0.00 | | | |

Outcome Nbr. 2: Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de JAAR y CCAS

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| 2.1 | % de sistemas contruidos operando según especificaciones técnicas de diseño | % | 47.10 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | | | | 75.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | | | |

Details

Means of verification: Informes Semestrales del MINSA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|--|--|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |
|------------|--|----|--|--|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| 2.2 | % de sistemas contruidos financieramente sostenibles | % | 47.10 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | | | | 75.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | | | |

Details

Means of verification: Informes Semestrales del MINSA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|--|--|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |
|------------|--|----|--|--|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| 2.3 | % de JAARs con al menos una mujer en su junta directiva | % | 0.00 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | | | | 66.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| Details | | | |
|---|----|----------------------|----|
| Means of verification: Informes Semestrales del MINSA. | | | |
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |

Outcome Nbr. 3: Fortalecimiento Institucional del MINSA

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|----------|
| 3.1 | Sistemas de agua en zona de intervencion monitoreados en tiempo real a traves del sistema SIASAR | % | 0.00 | 2012 | P | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | | | | 100.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | | 100.00 |
| | | | | | A | | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Reportes SIASAR | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-------------------------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2017 | EOP 2018 | 2017 | EOP 2018 |
| 1.1 | Sistema de agua potable construidos nuevos | Sistemas | P | | 44 | | 5,736,000 |
| | | | P(a) | 13 | 44 | 1,416,047.44 | 5,736,000 |
| | | | A | 9 | 13 | 1,365,307.6 | 2,609,291.71 |
| 1.2 | Soluciones de saneamiento construidas nuevas | Soluciones (caseta sanitaria) | P | | 3,847 | | 6,397,000 |
| | | | P(a) | 784 | 3,847 | 500,000 | 6,397,000 |
| | | | A | 773 | 773 | 455,102.54 | 1,184,823.99 |

Component Nbr. 2 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de JAAR

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| | | | | 2017 | EOP 2018 | 2017 | EOP 2018 |
| 2.1 | JAAR's constituidas | JAAR | P | | 44 | | 34,000 |
| | | | P(a) | 21 | 44 | 14,410 | 34,000 |
| | | | A | 21 | 44 | 14,410 | 34,000 |
| 2.2 | Miembros de las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento capacitados | Personas | P | | 15 | | 38,000 |
| | | | P(a) | 6 | 20 | 19,000 | 38,500 |
| | | | A | 11 | 15 | 13,500 | 13,500 |
| 2.3 | Miembros de las JAAR's capacitados en operación, mantenimiento y gestión empresarial | Personas | P | | 1,100 | | 501,000 |
| | | | P(a) | 300 | 1,100 | 40,000 | 501,000 |
| | | | A | 800 | 1,050 | 36,000 | 71,406 |
| 2.4 | Miembros de las JAAR's capacitados en educación sanitaria y ambiental | Personas | P | | 1,100 | | 40,000 |
| | | | P(a) | 400 | 1,100 | 12,000 | 40,000 |
| | | | A | 800 | 1,050 | 11,500 | 11,500 |

Component Nbr. 3 Fortalecimiento Institucional del MINSA

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2017 | EOP 2018 | 2017 | EOP 2018 |
| 3.1 | Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) constituidos | Departamentos | P | | 3 | | 377,000 |
| | | | P(a) | 0 | 3 | 160,560 | 377,000 |
| | | | A | 0 | 3 | 158,560 | 345,395.23 |
| 3.2 | Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) equipados | Departamentos | P | | 3 | | 616,000 |
| | | | P(a) | 2 | 3 | 118,050.19 | 616,000 |
| | | | A | 2 | 3 | 110,050.19 | 289,949.82 |
| 3.3 | Plan de Comunicación del Programa elaborado | Plan | P | | 1 | | 57,000 |
| | | | P(a) | | 1 | 0 | 57,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | SIASAR en operación | Sistema | P | | 1 | | 278,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 25,000 | 278,000 |
| | | | A | 0 | 1 | 24,000 | 49,568.4 |
| 3.5 | Técnicos de los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) capacitados en gestión de proyectos y aspectos técnicos de APS | Persona | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 50 | 100 | 0 | 218,169.62 |
| | | | A | 50 | 100 | 150,791.6 | 218,169.62 |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|---|------|--|--|------------|-----------|
| | Administración, monitoreo y evaluación, auditoría | P | | | | 926,000 |
| | | P(a) | | | 113,118.86 | 926,000 |
| | | A | | | 503,498.82 | 803,261.1 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | | 15,000,000 |
| | | P(a) | | | 2,418,186.49 | 15,218,669.62 |
| | | A | | | 2,842,720.75 | 5,630,865.87 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Type of Change | Reasons | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|--|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Output | Miembros de las JAAR's capacitados en educación sanitaria y ambiental | Modify Output | Si bien las capacitaciones han avanzado de manera satisfactoria, en algunas de ellas se va a seguir capacitando en el 2018. | 03/09/2018 | 03/21/2018 |
| Output | Miembros de las JAAR's capacitados en operación, mantenimiento y gestión empresarial | Modify Output | Si bien las capacitaciones han avanzado de manera satisfactoria, en algunas de ellas se va a seguir capacitando en el 2018. | 03/14/2018 | 03/21/2018 |
| Output | Miembros de las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento capacitados | Modify Output | Si bien las capacitaciones han avanzado de manera satisfactoria, en algunas de ellas se va a seguir capacitando en el 2018. | 03/19/2018 | 03/21/2018 |
| Output | Técnicos de los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) capacitados en gestión de proyectos y aspectos técnicos de APS | Modify Output | El indicador de producto de DAPoS capacitados en gestión y aspectos técnicos ya ha sido cumplido. Sin embargo, con recursos de aporte local se va a seguir capacitando durante los años 2018 y 2019 para seguir fortaleciendo las unidades regionales del Organismo Ejecutor. | 03/26/2018 | 03/21/2018 |
| Outcome | Hogares cuyas aguas residuales son tratadas | Modify Outcome Indicator | El "Verify Content" me pide verificar que cada indicador de resultado e impacto incluye los medios de verificación. El medio de verificación no estaba incluido en el PMR por lo que se procede a incluir en este periodo. Se están incluyendo tal y como aparece en la matriz de resultados. | 04/02/2018 | 04/02/2018 |
