

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1079	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/06/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/17/18
<b>Last Update</b>	04/05/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Urban rearrangement program La Ceja	<b>Loan Number</b>	2908/BL-BO, 2908/BL-BO-1, 2908/BL-BO-2
<b>Executing Agency</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	<b>Sector/Subsector</b>	DU-VIV - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
<b>Team Leader</b>	CANETE ROMERO, SHIRLEY MARGARITA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	YES
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	12/07/17
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1079	47,000,000	47,000,000		0	0	47,000,000	400,000	0.85%	46,600,000
<b>Aggregated</b>	<b>47,000,000</b>	<b>47,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,000,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0.85%</b>	<b>46,600,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

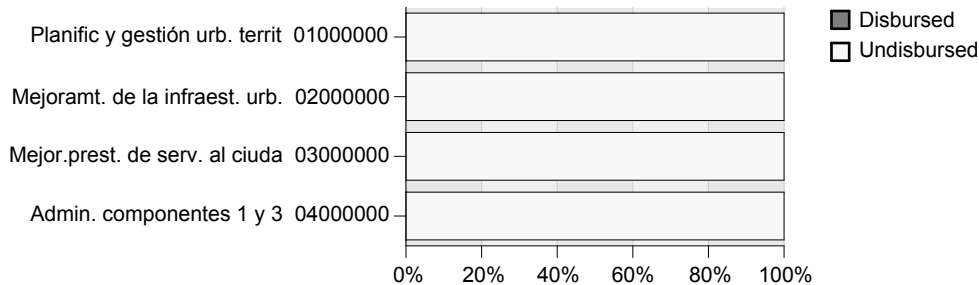

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Congestión en el área de La Ceja reducida

**Observation:** La consultoría verificará, mediante una encuesta de mercado, el crecimiento promedio interanual del valor de los inmuebles en el área central de la Ceja, frente al de las áreas de influencia de las intervenciones del Programa. De forma aclaratoria, este índice compara el crecimiento promedio del valor de los inmuebles en el área central de La Ceja disminuye, frente al crecimiento promedio del valor de los inmuebles en las áreas de intervención del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	EOP 2018
1.1	Índice de los precios de los inmuebles en La Ceja/índice de los precio de los inmuebles en la zona de intervención reducido.	Índice	100.00	2013	P	100.00	70.00
					P(a)	100.00	70.00
					A		
Details							
Means of verification: Estudio de consultoría que verificará la variación interanual del valor de los inmuebles en el área central de La Ceja, comparados con el valor de los inmuebles en las áreas circundantes a los proyectos realizados por el Programa.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Capacidad de planificación y gestión urbana mejorada

**Observation:** El sistema informático de seguimiento de los proyectos se llevará a cabo a través del Sistema de Información de Datos Espaciales de El Alto (IDEEA), el cual es parte de una iniciativa en las distintas alcaldías del país denominada GEOBOLIVIA de la Vicepresidencia de la República. MV: Informe técnico emitido por la Secretaría de Planificación del GAMEA (anteriormente Oficialía Mayor).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2018	EOP 2018
1.1	Las obras incluidas en los Programas Operativos Anuales (POAs) son gestionadas a través de un sistema informático de seguimiento de proyectos	%	0.00	2012	P		60.00	60.00
					P(a)		60.00	60.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Informe técnico emitido por la Dirección de Planificación del GAMEA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Infraestructura vial y urbana de El Alto mejorada

**Observation:** Estos indicadores han sido redefinidos con el equipo del GAMEA a fin de reflejar los cambios acordados con el Banco en la misión del 5 al 9 de mayo de 2014. Se ha tomado como línea de base a los resultados de la Consultoría realizada por la empresa Tranter: "Propuestas de Mejoramiento de la Movilidad en La Ceja y su Área de Influencia". MV: Consultoría sobre la Evolución de la Movilidad en La Ceja y Áreas de Influencia e Informes de la Secretaría de Movilidad del GAMEA.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2018	EOP 2018
2.1	Incremento del número de pasajeros de transporte público que circulan entre la panorámica norte y sur a través del denominado puente ferroviario, sin pasar por el área central de La Ceja.	pasajeros/horas pico	21,500.00	2014	P		43,000.00	43,000.00
					P(a)		43,000.00	43,000.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Informe técnico de la Oficialía Mayor de Infraestructura del GAMEA, empleando la misma metodología de la línea de base.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2018	EOP 2018
2.2	Incremento del volumen de peatones que circulan entre la panorámica norte y sur a través del denominado puente ferroviario, sin pasar por el área central de La Ceja.	peatones/horas pico	1,500.00	2014	P		3,000.00	3,000.00
					P(a)		3,000.00	3,000.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Informe técnico de la Oficialía Mayor de Infraestructura del GAMEA, empleando la misma metodología de la línea de base.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2018	EOP 2018
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.3	Reducción del número de funcionarios del GAMEA que trabajan en el área central de La Ceja y que laboran en la nueva centralidad administrativa municipal (Jatcha Uta).	personas	3,500.00	2014	P		2,000.00	2,000.00
					P(a)		2,000.00	2,000.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Informe técnico de la Oficialía Mayor de Infraestructura del GAMEA, empleando la misma metodología de la línea de base

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2018	EOP 2018
2.3	Incremento de la conectividad del denominado Anillo Azul de la ciudad de El Alto.	Km	0.00	2014	P		20.00	20.00
					P(a)		20.00	20.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** TBD

**Observations:** TBD

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Prestación de los servicios al ciudadano por parte del GAMEA mejorada

**Observation:** Se ha ajustado el resultado de este componente de acuerdo a la nueva gestión tributaria que implementará el GAMEA en vinculación con las actividades que desarrollará en El Alto el Programa de Mejora de la Gestión Municipal BO-L1063 (Componente 2: Apoyo a la Gestión Catastral). MV: Informes Técnicos emitidos por la Secretaría de Planificación del GAMEA.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2018	EOP 2018
3.1	Porcentaje de trámites de recaudación atendidos por la Dirección de Recaudación que pasan a ser atendidos en las sub alcaldías y en las centralidades seleccionadas.	%	0.00	2012	P		40.00	40.00
					P(a)		40.00	40.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Informe técnico de la Dirección de Recaudaciones del GAMEA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Apoyo a las capacidades de planificación y gestión urbana territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el órgano ejecutivo del GAMEA.	Plan	P	1	1	560,000	700,000
			P(a)		1		700,000
			A		0		0
1.2	Sistema de Información para el Seguimiento de Obras operando.	Sistema Informático	P	1	1	208,000	260,000
			P(a)		1		260,000
			A		0		0
1.3	Funcionarios capacitados en gestión de proyectos y en el uso del Sistema Informático de Seguimiento de Obras.	No de funcionarios	P	25	50	65,000	130,000
			P(a)		50		130,000
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Mejoramiento de la infraestructura urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Estudios de Preinversión para la Conexión de la Panorámica Norte-Sur de La Ceja realizado.	estudio	P		2		150,000
			P(a)		2		150,000
			A		0		0
2.2	Panorámica Norte-Sur de La Ceja conectada.	número de obras	P		2	2,000,000	11,850,000
			P(a)		2		11,850,000
			A		0		0
2.3	Estudios de Preinversión para el Tratamiento Urbanístico de la Zona del Teleférico (Línea Roja) realizado.	estudio	P		2		60,000
			P(a)		2		60,000
			A		0		0
2.4	Tratamiento Urbanístico de la Zona del Teleférico (Línea Roja) realizado.	número de obras	P	2	2	2,000,000	2,940,000
			P(a)		2		2,940,000
			A		0		0
2.5	Estudios de Preinversión para la Unidad Administrativa Municipal (Jatcha Uta) realizado.	estudio	P		2		200,000
			P(a)		2		200,000
			A		0		0
2.6	Intervenciones en el entorno a la Unidad Administrativa Municipal (Jatcha Uta) realizada.	número de obras	P	2	2	3,000,000	4,800,000
			P(a)		2		4,800,000
			A		0		0
2.7	Estudios de Preinversión para la Terminal Interdepartamental de Buses realizado.	estudio	P		2		150,000
			P(a)		2		150,000
			A		0		0
2.8	Intervenciones en el entorno de la Terminal Interdepartamental de Buses realizada.	número de obras	P		2	500,000	1,350,000
			P(a)		2		1,350,000
			A		0		0
2.9	Estudios de Preinversión para el fortalecimiento de la Conectividad vial Norte-Sur mediante la consolidación del Anillo Azul realizado.	estudio	P		2		440,000
			P(a)		2		440,000
			A		0		0
2.10	Obras para fortalecer la Conectividad vial Norte-Sur mediante la consolidación del Anillo Azul realizadas.	Número de obras	P		4	7,000,000	21,000,000
			P(a)		4		21,000,000
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la prestación de servicios al ciudadano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Sistema de gestión tributaria del GAMEA diseñado e implementado.	sistema	P		1	360,000	910,000
			P(a)		1		910,000
			A		0		0
3.2	Ventanillas de atención ciudadana operando.	ventanillas	P	2	5	300,000	980,000
			P(a)		5		980,000
			A		0		0
3.3	Capacitación a funcionarios municipales en temáticas de prestación de servicios realizada.	funcionarios capacitados	P	45	90	50,000	100,000
			P(a)		90		100,000
			A		0		0
3.4	Campañas y/o ferias de comunicación para el uso de las ventanillas de atención ciudadana y concientización tributaria diseñadas e implementadas.	campañas	P	2	5	110,000	260,000
			P(a)		5		260,000
			A		0		0

### Other Cost

	Administración, auditoria, monitoreo y evaluación	P			500,000	2,720,000
		P(a)				2,720,000
		A				0

### Total Cost

	Total Cost	P			16,653,000	49,000,000
		P(a)				49,000,000
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
