

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1067	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/19
<b>Last Update</b>	03/26/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/05/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi	<b>Loan Number</b>	2614/BL-BO, 2614/BL-BO-1, 2614/BL-BO-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	BUSCARONS CUESTA, LUIS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Debido a las importantes incumplimientos en las áreas de derechos de propiedad, licencias ambientales e interacción con una comunidad indígena vecina, se desarrolló un plan de acción correctiva por primera vez en 2016. Desde la misión de supervisión del año pasado, que mostró muy pocos avances en estas áreas identificadas, se ha realizado un esfuerzo común entre el líder del equipo, la consultora SIMBIOS y ESG que ha resuelto varios de los problemas pendientes, en particular los mas importantes. Por lo tanto, la clasificación ha sido corregida este año.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1067	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	33,040,000	94.40%	1,960,000
Aggregated	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	33,040,000	94.40%	1,960,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

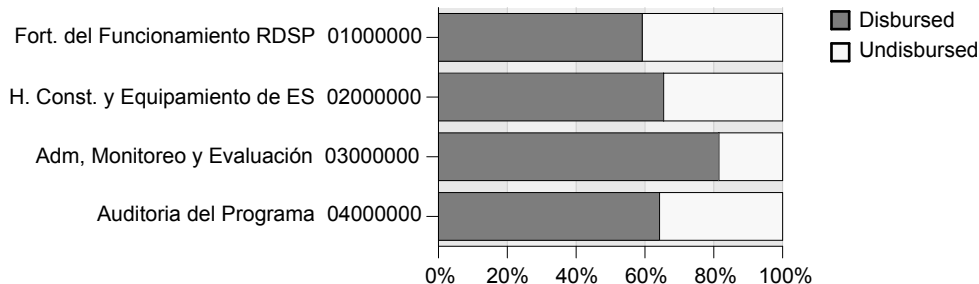

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mortalidad materno infantil en el Departamento de Potosi reducida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.1	Tasa de mortalidad infantil por 1000 NV	por 1000 NV	50.00	2003	P							30.00
					P(a)							30.00
					A				0.00		30.00	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.2	Razon de Mortalidad materna en el Departamento de Potosi	Razon	310.00	2008	P							100.00
					P(a)							100.00
					A				0.00		100.00	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Observations:** Existe discrepancias entre las cifras de fuentes nacionales (Ministerio de Salud) e internacionales (OMS/OPS) para este indicador, siendo los internacionales en el rango de 350 - 400 para Potosí. Adicionalmente, es probable que en los primeros años de ejecución, se registrarán más muertes por mejoras en el registro.(2015, esta por publicarse un estudio específico sobre mortalidad materna a partir del levantamiento de información en puestos "Centinela")

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.3	Tasa de Mortalidad neonatal	por 1000 NV	27.00	2003	P							0.00
					P(a)							11.18
					A				0.00		11.18	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.1	Cobertura de Parto Institucional	porcentaje	36.00	2010	P							55.00
					P(a)							55.00
					A				0.00	50.00	64.40	

#### Details

**Means of verification:** SNIS Departamental (Potosí)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.2	Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P							80.00
					P(a)							80.00
					A				0.00		20.10	

#### Details

**Means of verification:** Registros hospitalarios

**Observations:** El proyecto deberá establecer un sistema de monitoreo específico para este indicador.

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.3	Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P							50.00
					P(a)							50.00
					A				0.00		0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes específicos del proyecto.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.4	Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número	0.00	2011	P							200.00
					P(a)							13.00
					A				0.00		13.00	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details												
Means of verification: Informes de Servicio Departamental de Salud, al final del proyecto se puede verificar con el Estudio de Brechas												
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.5	Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Personas	50.00	2011	P							200.00
					P(a)							200.00
					A				0.00		0.00	
Details												
Means of verification: Informe específico del proyecto.												
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.6	Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Beneficiaries (#)	1,902.00	2013	P	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00		5,000.00
					P(a)	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00		5,000.00
					A		0.00	0.00	0.00		20,271.00	
Details												
Means of verification: Registro del Bono Juana Azurduy												
Observations: Se considerará al binomio Madre - Hijo que ha recibido atención al parto y atención post-parto												
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No				
	Indigenous					P						
						P(a)						5,000.00
						A					20,271.00	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio	P		3		100,000
			P(a)		3		128,305.14
			A		3	0	128,305.14
1.2	Plan de promoción de salud implementado	Plan	P		1		1,018,000
			P(a)		1	167,486	285,179.79
			A		0	70,865	118,940.79
1.3	Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas	P		30		210,000
			P(a)		30	31,956	535,612
			A		30	31,956	535,612
1.4	Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas	P		200		200,000
			P(a)	200	200	276,967	278,296.15
			A	0	0	0	77,946.15
1.5	Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema	P		1		500,000
			P(a)	1	1	1,174,903	1,499,014.77
			A	0	0	178,775	790,915.77
1.6	Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento	P		1		75,000
			P(a)		1	0	5,002.48
			A		1	0	5,002.48
1.7	Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad	P		1		450,000
			P(a)		1	0	311,867
			A		1	0	311,867
1.8	Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia	P		1		1,314,000
			P(a)		1	104,634	1,485,205.3
			A		0	38,862	1,302,946.3
1.9	Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas	P		90		280,000
			P(a)	90	90	239,060	364,711.02
			A	0	0	66,336	273,740.02
1.10	Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema	P		1		68,000
			P(a)	1	1	16,852	51,946.76
			A	0	0	0	37,494.76

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 2 Inversiones en infraestructura y equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua diseñado	Hospital	P		1		310,000
			P(a)		1		452,429.71
			A		1	0	452,429.71
2.2	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua construido	Hospital	P		1		6,730,000
			P(a)		1	7,078,109.58	12,584,451.52
			A		0	5,166,771.28	9,945,588.56
2.3	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua equipado	Hospital	P		1		2,106,000
			P(a)		1		1,224,358.27
			A		0	239,939.76	239,939.76
2.4	Hospital Ocuri construido	Hospital	P		1		4,200,000
			P(a)		1	3,783,613.61	6,725,617.16
			A		0	1,623,574.64	4,015,863.73
2.5	Hospital de Ocuri equipado	Hospital	P		1		1,180,000
			P(a)		1		516,210.22
			A		0	98,310.15	98,310.15
2.6	Hospitales de Ocuri y Llalagua operando	Hospital	P	2	2		4,220,000
			P(a)		2		4,220,000
			A		0	0	0
2.7	Centro de coordinación de urgencias construido	Centro	P		1		450,000
			P(a)		1	0	1,049,893.47
			A		1	0	1,049,893.47
2.8	Establecimientos de salud ampliados y/o remodelados	Establecimiento	P		1		2,800,000
			P(a)		7	39,245	2,732,912.87
			A		7	39,245	2,732,912.87
2.9	Establecimientos de salud construidos	Establecimiento	P		2		1,800,000
			P(a)		2	872,522.93	2,032,558.57
			A		1	771,851.85	1,737,205.87
2.10	Establecimientos de salud equipados	Establecimiento	P		8		8,549,185
			P(a)		11	427,667.64	2,106,427.52
			A		10	491,145.46	1,882,559.41

#### Component Nbr. 3 Administracion y Monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

#### Other Cost

	Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	P			740,000
		P(a)		249,951	1,446,524.01
		A		365,522	1,089,460
	Auditorías	P			200,000
		P(a)		47,000	200,000.03
		A		26,268	128,471.03

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P				995,000
		P(a)				0
		A			0	0
	Monitoreo y evaluación	P				1,100,000
		P(a)				168,336.06
		A			0	117,316.06
	Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	P				2,674,815
		P(a)			250,000	1,865,140.18
		A			207,906.54	1,755,493.06

Total Cost

	Total Cost	P				42,270,000
		P(a)			14,759,967.76	42,270,000
		A			9,417,328.68	28,828,214.09

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
						03/25/2019
	Hospital "Madre Obrera" de Llallagua construido	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
						03/13/2019
						03/13/2019
						03/13/2019
						03/13/2019
	Hospital "Madre Obrera" de Llallagua equipado	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
	Hospital Ocuri construido	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
						03/13/2019
						03/13/2019
						03/13/2019
						03/13/2019
	Hospital de Ocurí equipado	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
	Personal de los centros de primer nivel capacitado	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
	Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
	Plan de promoción de salud implementado	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
	Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/13/2019
	Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Reasignación y replanificación de los montos previstos para el producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOYCEE	03/21/2019
						03/25/2019



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity
