

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1372	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	03/28/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	03/28/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	Loan Number	3129/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DO PARANA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>The factors that guided the performance rating are linked to two identified situations that have not yet resulted in clearly identified adverse material impacts, but corrective actions are required to prevent future defaults by Bank POs.</p> <p>The first of these is that it has been found that there is a PGAS developed at the program preparation stage, but it functions only as a strategic document (milestone), as the document has operational weaknesses. In other words, the elaborated PGAS presents the guidelines, proposed activities and general control measures, but does not present methodology or executive procedures. Therefore, the absence of clear and concise procedures may lead to non-compliance with the program's environmental and social safeguards in the future.</p> <p>The second factor determining this classification is associated with the fact that it was found that the Resettlement Plans (PER) prepared in the preparation phase are good planning tools. However, it was observed that, specific</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	23,483,152.54	39.14%	36,516,847.46
Aggregated	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	23,483,152.54	39.14%	36,516,847.46

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

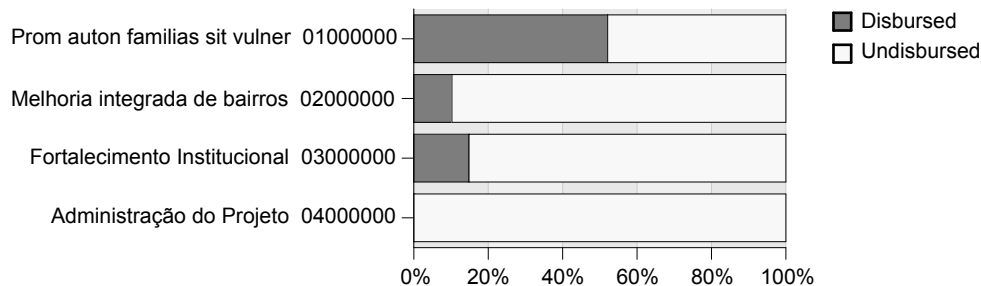

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Condição de vida das famílias mediante ações do Governo melhoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados	%	30.00	2016	P	60.00	60.00
					P(a)	40.00	40.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.2	Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria	%	53.00	2016	P	68.90	68.90
					P(a)	58.30	58.30
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%	0.00	2014	P		60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%	0.00	2014	P		60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%	0.00	2014	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	P		100.00
					P(a)	100.00	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.0	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	A		
-----	---	---	-------	------	---	--	--

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a agua potavel no domicilio	%	50.00	2014	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0.00	2014	P	90.00
					P(a)	90.00
					A	

Details

Means of verification: Testes de conhecimento

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados	Beneficiaries (#)	P	4,470	22,000	2,496,790	14,410,366
			P(a)	4,693	21,700	1,000,000	17,380,735.18
			A	4,730	15,945	125,806.45	8,095,427.8
1.2	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Municípios	P	130	130	2,762,400	8,774,200
			P(a)	130	130	3,000,000	12,123,400.99
			A	123	493	1,574,564.12	8,442,296.76
1.3	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P	53	53	2,500,000	10,781,000
			P(a)	110	53	1,500,000	7,817,321.37
			A	115	406	1,785,024.16	6,223,073.5
1.4	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Famílias	P	0	40,000	0	10,000,000
			P(a)	40,000	271,729	2,000,000	15,999,999.98
			A	39,908	191,729	2,872,077.62	12,610,002.88
1.5	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P	1,080	3,480	782,838	2,522,478
			P(a)	2,880	6,524	721,000	1,771,894.41
			A	2,524	2,524	537,334.34	537,334.34
1.6	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P	1,200	5,600	1,555,020	7,256,760
			P(a)	1,800	5,600	1,920,000	4,968,745.52
			A	2,569	3,942	2,308,081.11	2,936,554.47
1.7	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidaria)	Famílias	P	0	560	840,718	2,522,154
			P(a)	200	560	700,000	1,578,947.35
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P	159	594	6,200,000	17,940,000
			P(a)	200	594	3,780,000	22,972,296.05
			A	0	0	156,206.96	156,206.96
2.2	Lotes regularizados	Lotes	P	62	328	2,000,000	6,560,000
			P(a)	53	328	1,415,321	6,560,000
			A	0	0	0	0
2.3	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P	6	22	1,721,118	6,361,544
			P(a)	7	22	2,624,000	9,529,527.2
			A	4	5	1,515,761.52	1,860,341.49
2.4	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P	2	8	609,356	3,238,498
			P(a)	7	8	1,681,000	2,038,176.72
			A	5	5	1,277,977.06	1,290,498.7

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Investigações e estudos realizados	Estudos	P	1	7	300,000	1,620,000
			P(a)	4	7	250,000	591,432.25
			A	2	5	46,377.42	271,861.84
3.2	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P	2,460	12,300	637,665	2,113,000
			P(a)	2,500	12,300	200,000	1,623,060.46
			A	564	4,989	141,747.6	447,516.69
3.3	Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P	0	6	0	900,000
			P(a)	2	6	150,000	400,000.03
			A	0	2	0	108,258.41

Component Nbr. 4 Componente IV: Administração do Projeto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administração	P			1,000,000	4,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Contingencia	P			250,000	1,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			23,655,905	100,000,000
		P(a)			20,941,321	105,355,537.51
		A			12,340,958.36	42,979,373.84

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Famílias abordadas pelo programa ao concluir 24 meses de acompanhamento, que deram continuidade a sua própria habilitação social	Modificação no nome do indicador;	Modify Impact Indicator	Modify EOP P	KENYIC	12/10/2018
				Modify EOP P(a)	KENYIC	12/10/2018
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	KENYIC	12/10/2018
	Famílias com acesso e uso dos serviços em educação, saúde e desenvolvimento social produtivo melhorados	Linha de base atualizada.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P	KENYIC	12/10/2018
				Modify EOP P(a)	KENYIC	12/10/2018
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	KENYIC	12/10/2018
	Famílias com índice melhorado de habilitação psicossocial	Este indicador de impacto foi inativado depois de acordo com o executor.	Modify Impact	Inactivate Impact	YUKAM	12/13/2018
	Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados	Modificação no nome do indicador;	Modify Impact Indicator	Modify Indicator name	FOCHOA	12/18/2018
	Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria	Modificação no nome do indicador e meios de verificação foram incluídos.	Modify Impact Indicator	Modify Indicator name	FOCHOA	12/18/2018
				Modify Means of Verification	YUKAM	03/21/2019
Outcome	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	Linha de base atualizada conforme matriz de resultados original, pois o valor zero não havia sido incluído. Meta EOP P(a) também estava em branco e por isso foi inserido, de acordo com a meta original P.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	YUKAM	03/19/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	YUKAM	03/21/2019
	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a água potável no domicílio	Meta P(a) inserida de acordo com o planejado original P, pois por alguma razão não foi inserido e estava mostrando como erro na parte de verify contents.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	YUKAM	03/19/2019
	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	Meta P(a) inserida de acordo com o planejado original P, pois por alguma razão não foi inserido e estava mostrando como erro na parte de verify contents.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	YUKAM	03/19/2019
	Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	Linha de base atualizada conforme matriz de resultados original, pois o valor zero não havia sido incluído. Meta EOP P(a) também estava em branco e por isso foi inserido, de acordo com a meta original P.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	YUKAM	03/19/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	YUKAM	03/21/2019
	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	Linha de base atualizada conforme matriz de resultados original, pois o valor zero não havia sido incluído. Meta EOP P(a) também estava em branco e por isso foi inserido, de acordo com a meta original P.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	YUKAM	03/19/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	YUKAM	03/21/2019
	Participantes da capacitação sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	Meta P(a) inserida de acordo com o planejado original P, pois por alguma razão não foi inserido e estava mostrando como erro na parte de verify contents.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	YUKAM	03/19/2019
Output	CRAS construídos e em funcionamento	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/11/2019
						03/13/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	CRAS construídos e em funcionamento	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/20/2019
	CREAS construídos e em funcionamento	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/13/2019
	Famílias com casas novas recebidas	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/13/2019
	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019
	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/13/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/13/2019
	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/13/2019
	Investigações e estudos realizados	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/11/2019
	Lotes regularizados	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/13/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/11/2019
						03/13/2019
	Módulos do Sistema de informações Gerenciais desenhados e em funcionamento	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019
	Participantes do Programa Capacitados	Replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até	Modify	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Participantes do Programa Capacitados	dezembro de 2018.	Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019
	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Replanejamento fisico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019
				Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019
	Planos de Ação Familiar pactuados com a familia beneficiaria elaborados	Replanejamento fisico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019
				Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/13/2019
	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Replanejamento fisico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019
				Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/13/2019
	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Replanejamento fisico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	YUKAM	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	YUKAM	03/13/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
