

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1125	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/30/19
Last Update	03/26/19	Country Representative Validation Date	05/03/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	Loan Number	3104/OC-CO
Executing Agency	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deDesastres	Sector/Subsector	DU-VIV - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Team Leader	ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	A la fecha de la supervision, se identificó que a pesar de que el proyecto está empenzando existen posible futuros problemas sociales (relacion comunitarias) y ambientales (asociados a la línea de rechazo de la planta) que deberan ser prontamente manejado con la implementacion del plan de accion.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1125	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	42,985,828.45	61.41%	27,014,171.55
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	42,985,828.45	61.41%	27,014,171.55

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

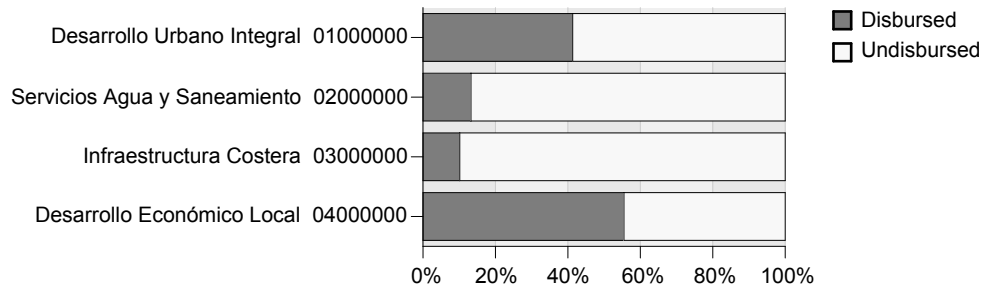

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.90	2013	P		75.00
					P(a)		75.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.60	2011	P							30.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	50.00	30.00	50.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Encuesta de calidad de vida del DANE

Observations: El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
2.1	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Millones de pesos	64.65	2013	P							93.10
					P(a)		0.00	0.00	0.00	93.10	93.10	93.10
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45.00	2013	P							57.80
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.85		59.85
					A	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

Details

Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Micro y pequeñas empresas desarrolladas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.70	2012	P							47.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	Households (#)	800.00	2013	P	1,000.00	1,500.00	2,000.00				2,500.00
					P(a)	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7.00	2013	P	7.00	10.00	11.00				12.00
					P(a)	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00	12.00	12.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
5.1	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	IDF	55.54	2012	P							59.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	59.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Urbano Integral

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P	2	6	553,000	12,600,000
			P(a)	6	6	12,070,789	12,600,000
			A	3	3	6,045,369	7,365,315
1.2	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P	1	3	16,000	200,000
			P(a)	3	3	0	0
			A	1	1	0	0
1.3	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P	0	0.9	0	6,753,000
			P(a)	0	0.9	0	6,349,172
			A	0	0	0	148,626
1.4	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P	0	1	1,036,000	2,457,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P	0	1	696,000	2,490,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P	25	25	1,663,000	6,335,000
			P(a)	25	25	17,641,016	19,810,610
			A	0	0	571,153	613,708
2.2	Redes rehabilitadas	Km	P	7	25	2,074,000	7,919,000
			P(a)	0	25	2,342,178	8,772,974
			A	0	0	1,721,479	1,721,479
2.3	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Solución de Saneamiento	P	150	350	1,774,000	3,696,000
			P(a)	0	350	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P	0	1	0	4,387,000
			P(a)	0	1	0	1,609,329
			A	0	1	0	1,609,329
2.5	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P	0	1	0	1,663,000
			P(a)	1	1	1,306,475	1,663,000
			A	0	0	1,930	69,751

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P	0	3	0	4,800,000
			P(a)	3	3	199,499	913,235
			A	3	3	259,992	913,235
3.2	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P	0.6	1.1	152,000	3,200,000
			P(a)	0	1.1	0	7,147,258
			A	0	0	0	0
3.3	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P	1	4	77,000	500,000
			P(a)	0	4	0	500,000
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
3.5	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P	1	3	71,000	200,000
			P(a)	0	3	0	200,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
4.1	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P	0	90	0	240,000
			P(a)	34	90	0	0
			A	0	56	0	0
4.2	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Micro / small / medium enterpr	P	30	95	1,215,000	4,760,000
			P(a)	27	95	2,231,393	4,760,000
			A	27	95	5,448	2,774,055

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
5.1	Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Predios	P	0	18,315	0	750,000
			P(a)	0	18,315	0	0
			A	0	0	0	0
5.2	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P	0	30	0	210,000
			P(a)	0	30	93,750	150,000
			A	0	0	0	0
5.3	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P	0	1	0	340,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A	0	1	0	0
5.4	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P	0	30	0	600,000
			P(a)	0	37	0	164,223
			A	0	37	0	164,223
5.5	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
5.6	Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P			900,000	4,500,000
		P(a)			1,059,777	3,630,787
		A			190,564	1,511,232
	Auditoria	P			100,000	500,000
		P(a)			144,809	429,412
		A			74,221	139,794

Total Cost

	Total Cost	P			10,327,000	70,000,000
		P(a)			37,089,686	70,000,000
		A			8,870,156	17,030,747

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	Replanificación de los Resultados del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	AGIRALDO	03/14/2019
	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Replanificación de los Resultados del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	AGIRALDO	03/14/2019
	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Replanificación de los Resultados del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	AGIRALDO	03/14/2019
	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	Replanificación de los Resultados del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	AGIRALDO	03/14/2019
	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Replanificación de los Resultados del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	AGIRALDO	03/14/2019
	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	Replanificación de los Resultados del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	AGIRALDO	03/14/2019
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019 03/14/2019
	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019
	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Physical P(a) value	AGIRALDO	03/26/2019
	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019
	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019 03/14/2019
	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019 03/14/2019
	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019 03/14/2019
	Redes rehabilitadas	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019
	Sistema de información para la administracion de la defensa juridica diseñado e implementado	Replanificación de los Productos del Programa de acuerdo a la dinámica de ejecución de los proyectos	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGIRALDO	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	AGIRALDO	03/26/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Stakeholder Priorities
