

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1119	Chief of Operations Validation Date	10/16/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Barrio Improvement Program, Second Individual Operation	Loan Number	2662/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	ACEVEDO ALAMEDA, PALOMA	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1119	400,000,000	400,000,000	45,000,000	0	445,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00%	0
Aggregated	400,000,000	400,000,000	45,000,000	0	445,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

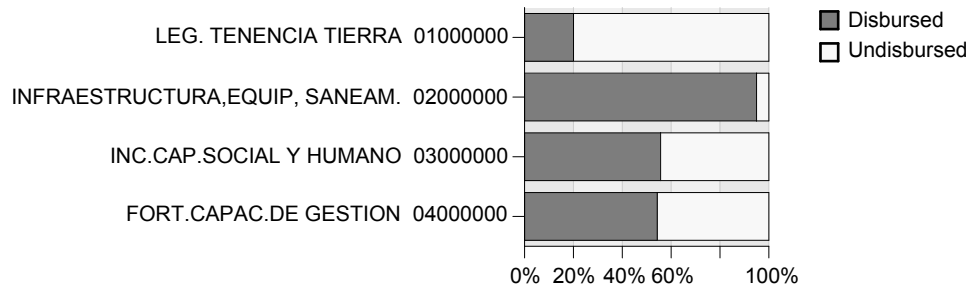

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condiciones de habitabilidad de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares del país mejorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
1.1	Porcentaje de viviendas de calidad insuficiente en las villas y asentamientos informales en los que interviene el programa.	%	0.00	2012	P			-30.00
					P(a)			-30.00
					A			

Details

Means of verification: Informe Final de la Unidad Coordinadora Nacional y en evaluación final. Fuente: Ficha Única de Proyecto y ficha post obra de cada barrio.

Observations: Esta situación de viviendas se corresponde con las categorías CALMAT IV y CALMAT V. El indicador compuesto CALMAT es utilizado por el INDEC para clasificar las viviendas existentes según su calidad constructiva. El INDEC capta la información para esta cat

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
1.2	Porcentaje de hacinamiento promedio en las villas y los asentamientos informales en los que interviene el programa.	%	0.00	2012	P			-30.00
					P(a)			-30.00
					A			

Details

Means of verification: Informe Anual y Final de la Unidad Coordinadora Nacional y en evaluación final. Fuente: Ficha Única de Proyecto y Ficha Post-Obra.

Observations: El indicador proviene del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que utiliza el INDEC: se define como condición de hacinamiento a aquellas viviendas y hogares con más de tres personas por habitación. Meta: reducción del 30%. La línea de base s

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Seguridad en la tenencia de la tierra mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Familias de los barrios que tienen títulos de propiedad	%	0.00	2012	P				30.00
					P(a)	0.00			30.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FUP y FPO.

Observations: Línea de base: % actual en los barrios, medido a la fecha de inicio de la intervención.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Cobertura en servicios básicos mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Barrios intervenidos donde funcionan satisfactoriamente al menos tres de los servicios básicos (agua, cloacas, gas y alumbrado público)	%	0.00	2012	P				100.00
					P(a)	0.00			100.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FPO.

Observations: Agua corriente 75% del tiempo, cloacas conectadas a plantas de tratamiento, gas con fluido constante, alumbrado público en el acceso principal.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2019
2.2	Barrios intervenidos donde los equipamientos comunitarios operan satisfactoriamente	%	0.00	2012	P				75.00
					P(a)	0.00			75.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FPO.

Observations: Sala SUM operando al menos 15 días al mes; recaudación propia de ingresos que cubre más del 50% de los costos de operación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Organizaciones comunitarias de base integradas a la ciudad formal

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Hogares que participan en actividades comunitarias	%	0.00	2012	P				40.00
					P(a)	0.00			40.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FUP y FPO. Línea de base: medida a la fecha de inicio de la intervención.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2019
3.2	Incremento del capital social y humano de participantes en PFCSyH y PICs	%	0.00	2012	P				40.00
					P(a)	0.00			40.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Valoración de las UE de las capacidades de los participantes en PICs y PFCSyH. Encuesta especial al iniciar y finalizar los proyectos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: Desempeño de los equipos de supervisión y gestión de las unidades ejecutoras mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2019
4.1	Desfase entre el tiempo programado vs realizado en la licitación de obras	%	34.80	2012	P				20.00
					P(a)	0.00			20.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Informe anual y final de la UCN. Línea de base: % promedio de desfase proyectos del préstamo 1842/OC-AR.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2019
4.2	Desfase entre el tiempo programado vs realizado en la ejecución de las obras	%	31.90	2012	P				20.00
					P(a)	0.00			20.00
					A	0.00	0.00		0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: Informe anual y final de la UCN. Línea de base: % promedio en la ejecución del préstamo 1842/OC-AR.			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Legalización de la tenencia de la tierra

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	Barrios con trazado urbano regularizado	barrios	P		70		1,686,000
			P(a)	0	87	24,681.95	391,601.16
			A	6	93	9,701	376,620.21
1.2	Familias de los barrios con situación legal en sus lotes.	Households (#)	P		55,059		1,241,000
			P(a)	0	84,965	0	259,962.04
			A	1,395	86,360	9,998.96	269,961

Component Nbr. 2 Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable, cloacas, gas y electricidad	Households (#)	P		55,059		86,525,000
			P(a)	0	68,299	2,011,435.26	107,504,938.92
			A	1,018	69,317	9,367,824.92	114,861,328.58
2.2	Barrios con equipamiento comunitario instalado	barrios	P		64		52,225,000
			P(a)	0	56	1,604,028.97	85,730,343.66
			A	3	59	7,470,418.17	91,596,732.86
2.3	Kilómetros de redes viales construidas o mejoradas	kilómetros	P		196		251,427,000
			P(a)	0	356	0	193,521,093
			A	7	363	6,034,712.65	199,555,805.65
2.4	Número de hogares reasentados	hogares	P		5,500		0
			P(a)		26		0
			A		26	0	0

Component Nbr. 3 Incremento de capital humano y social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
3.1	Líneas de acción de acompañamiento integral y gestión asociada desarrolladas anualmente en los proyectos por los equipos de campo (talleres, curso de capacitación, ferias)	líneas de acción	P		2,651		23,254,000
			P(a)	0	2,743	0	15,254,191.18
			A	50	2,793	463,520.38	15,717,711.56
3.2	Proyectos de iniciativa productiva comunitaria ejecutados	proyectos	P		39		3,951,000
			P(a)	0	20	0	1,010,727.28
			A	4	24	25,722.79	1,036,450.07
3.3	Proyectos de fortalecimiento de capital social y humano ejecutados	proyectos	P		40		2,040,000
			P(a)	0	26	0	900,286.82
			A	1	27	23,987.66	924,274.48

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de la capacidad de gestión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
4.1	Funcionarios de las unidades ejecutoras y/o actores sociales del programa que participan en talleres y seminarios de capacitación	participantes	P		4,000		2,000,000
			P(a)	0	4,009	0	97,908.72
			A	0	4,009	0	97,908.72
4.2	Estudios técnicos en gestión urbana producidos por la UCN y UEP	estudios	P		3		1,500,000
			P(a)	0	1	0	221,914.84
			A	0	1	0	221,914.84
4.3	Proyectos ejecutivos integrales producidos por la UEP y UEM	proyectos	P		115		7,410,000
			P(a)	0	256	0	6,427,775.43
			A	0	256	0	6,427,775.43
4.4	Sistemas de gestión en UEP mejorados	sistemas de gestión	P		25		500,000
			P(a)	0	10	0	0
			A	0	10	0	0

Component Nbr. 5 Administración, Auditoría y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración, Auditoría y Evaluación	P				11,241,000
		P(a)			0	8,368,719.79
		A			0	8,368,719.79

Total Cost

	Total Cost	P				445,000,000
		P(a)			3,640,146.18	419,689,462.84
		A			23,405,886.53	439,455,203.19

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Barrios con equipamiento comunitario instalado	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Barrios con trazado urbano regularizado	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Estudios técnicos en gestión urbana producidos por la UCN y UEP	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
						10/02/2019
	Familias de los barrios con situación legal en sus lotes.	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
						10/01/2019
	Funcionarios de las unidades ejecutoras y/o actores sociales del programa que participan en talleres y seminarios de capacitación	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Kilómetros de redes viales construidas o mejoradas	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Líneas de acción de acompañamiento integral y gestión asociada desarrolladas anualmente en los proyectos por los equipos de campo (talleres, curso de capacitación, ferias)	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Número de hogares reasentados	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Proyectos de fortalecimiento de capital social y humano ejecutados	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Proyectos de iniciativa productiva comunitaria ejecutados	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Proyectos ejecutivos integrales producidos por la UEP y UEM	Se completaron ceros en	Modify	Modify Financial	MARES	10/01/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Proyectos ejecutivos integrales producidos por la UEP y UEM	casilleros historicos	Output	Historical Actual		
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Sistemas de gestión en UEP mejorados	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019
	Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable, cloacas, gas y electricidad	Se completaron ceros en casilleros historicos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MARES	10/01/2019
				Modify Physical Historical Actual	MARES	10/01/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
