

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1079	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/23/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/04/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Urban rearrangement program La Ceja	<b>Loan Number</b>	2908/BL-BO, 2908/BL-BO-1, 2908/BL-BO-2
<b>Executing Agency</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	<b>Sector/Subsector</b>	DU-VIV - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
<b>Team Leader</b>	CANETE ROMERO, SHIRLEY MARGARITA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	YES
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	12/07/17
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	La EETC-MT avanzó con importantes medidas identificadas en los distintos planes de gestión ambiental, social y reasentamiento. Las empresas cuentan con personal ambiental y social adecuado. Ha realizado un amplio y participativo proceso de socializaciones/reuniones con diferentes actores clave institucionales e individuales.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1079	47,000,000	47,000,000		0	0	47,000,000	43,967,526.92	93.55%	3,032,473.08
<b>Aggregated</b>	<b>47,000,000</b>	<b>47,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,000,000</b>	<b>43,967,526.92</b>	<b>93.55%</b>	<b>3,032,473.08</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

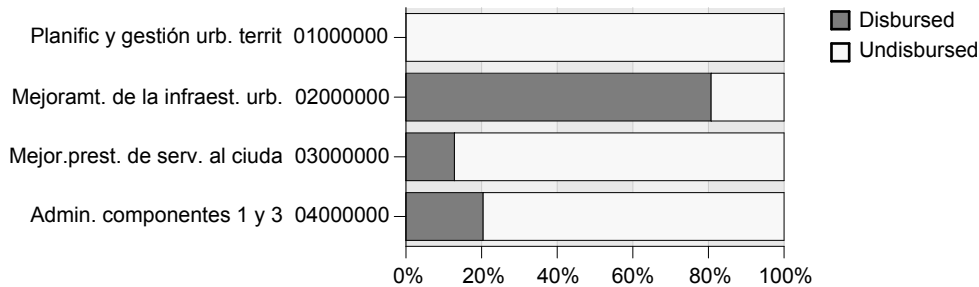

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Congestión en el área de La Ceja reducida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Participación modal de pasajeros en Línea Plateada con respecto al transporte público diferente a teleférico en la metrópoli La Paz – El Alto por día	%	0.00	2016	P				4.50	4.50
					P(a)				4.50	4.50
					A					

#### Details

**Means of verification:** Fuente de la línea de base EETC-MT: Base de datos de Informe EETC-MT a partir de encuestas a usuarios diferenciando por líneas y estudio de mercado de MT Fase II.

**Observations:** La meta final proyectada, es a un año de funcionamiento de la RIM.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Emisiones de CO2 eliminadas debido al empleo de la línea plateada como medio de transporte	Toneladas/año	0.00	2017	P				2,500.00	2,500.00
					P(a)				2,500.00	2,500.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Fuente de la línea de base EETC-MT: Informes técnicos de la EETC-MT en base a los estudios de demanda.

**Observations:** La meta se calculará siguiendo la misma metodología de la línea de base empleando la demanda real observada.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Capacidad de planificación y gestión urbana mejorada

**Observation:** El sistema informático de seguimiento de los proyectos se llevará a cabo a través del Sistema de Información de Datos Espaciales de El Alto (IDEEA), el cual es parte de una iniciativa en las distintas alcaldías del país denominada GEOBOLIVIA de la Vicepresidencia de la República. MV: Informe técnico emitido por la Secretaría de Planificación del GAMEA (anteriormente Oficialía Mayor).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	EOP 2020
0.1	Las obras incluidas en los Programas Operativos Anuales (POAs) son gestionadas a través de un sistema informático de seguimiento de proyectos	%	0.00	2012	P			60.00	60.00
					P(a)			60.00	60.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Informe técnico emitido por la Dirección de Planificación del GAMEA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Incremento del uso de sistemas de transporte urbano de calidad

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	EOP 2020
1.0	Pasajeros por día en la Línea Plateada	Número de pasajeros que usa la Línea Plateada	0.00	2016	P			53,342.00	53,342.00
					P(a)			53,342.00	53,342.00
					A				

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	EOP 2020
1.1	Tiempo de traslado en vehículo de transporte público diferente a teleférico en el trayecto entre la estación 16 de Julio y la estación Mirador	Minutos / viaje	23.30	2016	P			9.75	9.75
					P(a)			9.75	9.75
					A				

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Prestación de los servicios al ciudadano por parte del GAMEA mejorada

**Observation:** Se ha ajustado el resultado de este componente de acuerdo a la nueva gestión tributaria que implementará el GAMEA en vinculación con las actividades que desarrollará en El Alto el Programa de Mejora de la Gestión Municipal BO-L1063 (Componente 2: Apoyo a la Gestión Catastral). MV: Informes Técnicos emitidos por la Secretaría de Planificación del GAMEA.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	EOP 2020
2.1	Porcentaje de trámites de recaudación atendidos	%	0.00	2012	P		40.00		40.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.1	por la Dirección de Recaudación que pasan a ser atendidos en las sub alcaldías y en las centralidades seleccionadas.	%	0.00	2012	P(a)	40.00	40.00	40.00
					A			
Details								
Means of verification: Informe técnico de la Dirección de Recaudaciones del GAMEA								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Apoyo a las capacidades de planificación y gestión urbana territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el órgano ejecutivo del GAMEA.	Plan	P	1	1	832,576	864,968
			P(a)		1	263,492	864,968
			A	0	0	0	0
1.2	Sistema de Información para el Seguimiento de Obras operando.	Sistema Informático	P	1	1	16,935	25,032
			P(a)		1	25,032	25,032
			A	0	0	0	0
1.3	Funcionarios capacitados en gestión de proyectos y en el uso del Sistema Informático de Seguimiento de Obras.	No de funcionarios	P	25	50	200,000	200,000
			P(a)	25	50	20,000	200,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Mejoramiento de la infraestructura urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Obras civiles, incluida infraestructura de estaciones a lo largo de la Línea Plateada concluidas	unidad	P	1	1	8,988,049	22,295,000
			P(a)	1	1	9,868,362	22,295,000
			A	1	1	11,878,672	24,305,310
2.2	Sistema electromecánico y equipamiento instalado y en funcionamiento	numero de sistemas	P	1	1	4,680,000	31,834,962
			P(a)	1	1	10,110,993	31,834,962
			A	1	1	377,497	22,101,466

## Component Nbr. 3 Mejora de la prestación de servicios al ciudadano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Sistema de gestión tributaria del GAMEA diseñado e implementado.	sistema	P	1	1	310,292	735,219
			P(a)		1	50,000	735,219
			A	0	0		0
3.2	Ventanillas de atención ciudadana operando.	ventanillas	P		19	377,290	825,643
			P(a)		19	205,843	825,643
			A	0	19		203,553
3.3	Capacitación a funcionarios municipales en temáticas de prestación de servicios realizada.	funcionarios capacitados	P	45	346		0
			P(a)	80	346		0
			A	0	106		0
3.4	Campañas y/o ferias de comunicación para el uso de las ventanillas de atención ciudadana y concientización tributaria diseñadas e implementadas.	campañas	P	3	5	93,615	517,690
			P(a)	2	5	93,615	517,690
			A	0	2		112,838
3.5	Creación de una unidad de atención ciudadana en el GAMEA	Unidad constituida	P	1	1	171,448	171,448
			P(a)	1	1	80,000	171,448
			A	0	0		0

## Other Cost

	Administración, auditoria, monitoreo y evaluación (Componentes 1 y 3)	P			181,467	490,000
		P(a)			100,000	490,000
		A			0	83,308
	Administración, auditoria, monitoreo y evaluación (Componente 2)	P			80,000	80,000
		P(a)			80,000	80,000
		A			0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Supervisión	P			350,024	1,082,599
		P(a)			290,040	1,082,599
		A			0	792,559
	Fiscalización	P			815,449	815,449
		P(a)			815,449	815,449
		A			0	0
	Expropiaciones	P			324,232	531,990
		P(a)			531,990	531,990
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			17,421,377	60,470,000
		P(a)			22,534,816	60,470,000
		A			12,256,169	47,599,034

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design
