

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1039	Chief of Operations Validation Date	10/15/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Program for Human Development-Phase I	Loan Number	2242/BL-GU, 2242/BL-GU-1
Executing Agency	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	LEVY FERRE, ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	GUATEMALA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	GU-X1005
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Si bien se ha logrado avanzar en construir/finalizar una mayoría de obras menores asociadas la rehabilitación/mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en poblados rurales (instalación de aljibes, pozos, y letrinas), los retrasos para la ejecución de obras de mayor complejidad, como las PTARs en el depto. de San Marcos, continúan experimentándose. A pesar de estar en un inicio de su construcción, han surgido desacuerdos y conflictos con algunos propietarios que viven alrededor de los terrenos, quienes han denegado el acceso a través de sus propiedades; o propietarios que no están anuentes a ceder derecho de paso. Se requiere preparar un Plan de Compensación para los propietarios afectados por las servidumbres de paso y derecho de uso/acceso a los terrenos donde se están construyendo las PTAR en los municipios de San Marcos; ademas de resolver los conflictos generados con propietarios y comunidades por el derecho de paso/acceso a los terrenos para las PTARs que así lo		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1039	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	24,600,000	49.20%	25,400,000
GU-X1005	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	23,300,000	46.60%	26,700,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	47,900,000	47.90%	52,100,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

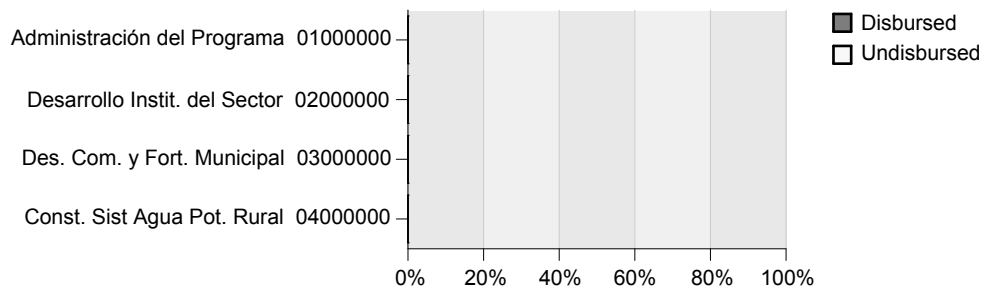

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Publica y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Rectoría sectorial fortalecida y funcionando	Entidades	2012	P					1.00				1.00
				P(a)				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				A			0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Documentos Legales del Ministerio de Salud creando la dirección de Dirección de agua potable y saneamiento, para ejercer la rectoría del sector.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.1	Entidad ejecutora de Programas sectoriales autónoma funcionando	Entidad	2012	P					1.00				1.00
				P(a)				0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				A			0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de desempeño del Programa a los 5 años de la firma del contrato del contrato de préstamo o cuando se hayan alcanzado el 75 % de avance.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala

Observation: Se espera un incremento en el número de hogares atendidos una vez se concluyan obras en el segundo semestre del año 2014

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.1	Hogares rurales con sistema de agua potable contruidos o rehabilitados	Households (#)	2012	P	200.00	4,600.00	4,600.00	4,700.00	4,160.00				18,260.00
				P(a)	200.00	2,200.00	4,066.00	1,556.00	15,128.00	4,374.00	1,726.00	0.00	7,339.00
				A	42.00	745.00	789.00	0.00	1,311.00	3,206.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Observations: En la matriz de resultado original, se habían expresado los resultados en forma de porcentaje y número de beneficiarios, por lo que se ha utilizado la ponderación de hogares en función de la tasa promedio definida por la Encuesta Nacional de Vivienda 2011

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									
	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.1	Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable construídos o rehabilitados	Households (#)	0.00	2012	P		0.00	6,000.00	15,000.00	5,000.00				26,000.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	26,000.00	814.00	982.00	15,766.00	19,970.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									
	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.2	Hogares rurales con solución de saneamiento básico construídos o rehabilitados	Households (#)	0.00	2012	P	300.00	5,800.00	5,800.00	6,000.00	5,340.00				23,240.00
					P(a)	300.00	1,840.00	4,528.00	1,464.00	20,232.00	5,964.00	3,897.00		10,588.00
					A	209.00	546.00	789.00	0.00	1,250.00	5,142.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.4	Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construídos o rehabilitados	Households (#)	0.00	2012	P	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	7,000.00				34,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	810.00	982.00	15,766.00	19,966.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									
	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									
	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.4	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2014	P									
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	810.00	982.00	15,766.00	19,966.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									
-------------------	--	----	----------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	0	0	179,556.25
			A	0	0	0	0
1.2	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	1	0	1,127,664
			A	0	0	0	1,127,664
1.3	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P		1		700,000
			P(a)	0	1	179,556	179,556
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P		335		3,400,000
			P(a)	0	46	0	9,604
			A	0	46	0	9,604
2.2	Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas	P		32		3,000,000
			P(a)	0	17	278,136.73	2,339,221.76
			A	0	17	0	886,085.03
2.3	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P		220		34,908,000
			P(a)	7	56	5,144,775.44	22,243,771.12
			A	2	51	2,067,185	17,982,153.92
2.4	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	sistemas	P		280		23,272,000
			P(a)	17	76	3,525,155.92	9,518,728.59
			A	3	62	1,127,842	7,095,220.24
2.5	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		13,272,000
			P(a)	2	8	8,725,191.75	22,699,144.49
			A	0	0	438,402	2,748,091.16
2.6	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		8,848,000
			P(a)	3	9	13,367,807.45	35,434,200.39
			A	0	0	855,582	4,359,489.85

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P		280		4,000,000
			P(a)	38	113	86,642.02	1,031,600.77
			A	7	82	38,069	975,356.55
3.2	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P		84,000		1,000,000
			P(a)	8,082	60,508	86,460.96	878,533.88
			A	1,223	53,649	37,666	822,067.72
3.3	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P		32		1,500,000
			P(a)	3	9	70,767.94	172,105.59
			A	0	0	16,037	86,139.65
3.4	Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P		320		500,000
			P(a)	30	90	70,768.25	166,233.94
			A	0	0	16,036	80,266.69

Component Nbr. 4 Administración del programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración del Programa	P				2,600,000
		P(a)			909,599.35	4,020,079.22
		A			236,258	2,711,283.49

Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			32,444,861.81	100,000,000
		A			4,833,077	38,883,422.3

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Fiduciary Dimensions
