

PMR Operational Report

Operation Number	HA-L1103	Chief of Operations Validation Date	10/21/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/10/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Port-au-Prince Water and Sanitation Project III	Loan Number	4353/GR-HA
Executing Agency	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement	Sector/Subsector	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	PEREZ MONFORTE, SERGIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HAITI
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D' HAITI		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	No works have begun for this program, tendering process has not begun, do to the current situation in Haiti works are not expected to commence until late 2020.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1103	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	1,668,643.55	2.57%	63,331,356.45
Aggregated	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	1,668,643.55	2.57%	63,331,356.45

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

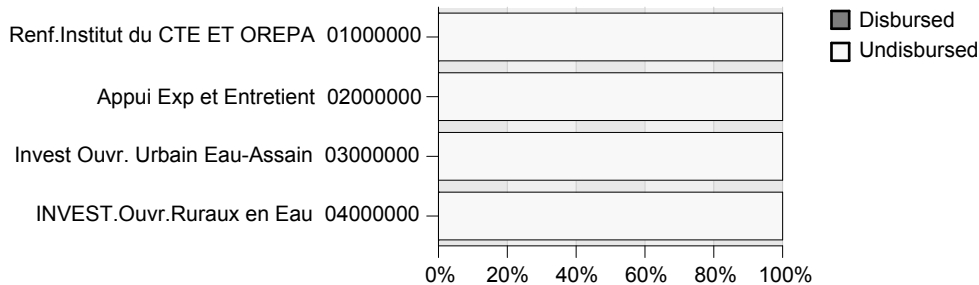

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Résultat I : La DINEPA exerce une réglementation effective au niveau de la DINEPA centrale et la déconcentration au niveau de l'OREPA-Ouest.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
0.1	Nombre de CTEs de la DINEPA qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	CTE	0.00	2016	P					0.00		
					P(a)			0.00	3.00	8.00	10.00	10.00
					A							

Details

Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
0.2	Nombre de structures de l'OREPA Ouest qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	Unité	0.00	2016	P	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		2.00
					P(a)	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		2.00
					A	0.00	1.00					0.00

Details

Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Résultat II : Le CTE-RMPP améliore sa viabilité financière

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.1	Nombre de connexions domiciliaires et commerciales actives au CTE-RMPP	Connection active	46,000.00	2016	P	46,000.00	48,250.00	54,740.00	61,640.00	68,200.00		68,200.00
					P(a)	46,000.00	48,250.00	54,740.00	61,640.00	68,200.00		68,200.00
					A	46,000.00	51,248.00					46,000.00

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/Jour	103,000.00	2016	P	103,000.00	159,000.00	169,000.00	183,000.00	183,000.00		183,000.00
					P(a)	103,000.00	159,000.00	169,000.00	183,000.00	183,000.00		183,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/Jour	103,000.00	2016	A	103,000.00	120,000.00					103,000.00
-----	--	---------	------------	------	---	------------	------------	--	--	--	--	------------

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.2	Indice de recouvrement du CTE-RMPP (% de paiement des factures)	%	54.00	2016	P	54.00	59.00	63.00	66.00	71.00	71.00
					P(a)	54.00	59.00	63.00	66.00	71.00	71.00
					A	54.00	50.80				54.00

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.3	Ratio d'exploitation du CTE-RMPP (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles)	Ratio	0.67	2016	P	0.67	0.90	1.07	1.22	1.32	1.32
					P(a)	0.67	0.90	1.07	1.22	1.32	1.32
					A	0.67	0.68				0.67

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Résultat III : L'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d'hygiène se sont améliorés dans la RMPP

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.1	Pourcentage de foyer ayant accès à un service d'eau amélioré	%	44.00	2016	P				44.00		60.00
					P(a)				44.00		60.00
					A						

Details

Means of verification: Enquêtes auprès des foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year								
2.2	Nombre de foyers ayant acces a l'eau potable a domicile	Foyer	92,000.00	2016	P	92,000.00	97,600.00	121,600.00	150,000.00	178,400.00		178,400.00
					P(a)	92,000.00	97,600.00	121,600.00	150,000.00	178,400.00		178,400.00
					A	92,000.00	92,000.00					92,000.00

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.3	Pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable via un kiosque	%	4.50	2016	P	4.50	5.00	5.50	6.00	6.00	6.00
					P(a)	4.50	5.00	5.50	6.00	6.00	6.00
					A	4.50	4.50				0.00

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.4	Nombre d'heures par jour d'alimentation des ménages à partir d'une connexion du CTE-RMPP	Heure/Jour	3.30	2016	P	4.00	6.00	9.00	12.00	12.00	12.00
					P(a)	4.00	6.00	9.00	12.00	12.00	12.00
					A	3.30	3.30				3.30

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.5	% de femmes qui travaillent dans des kiosques nouveaux ou réhabilités dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville	%	13.00	2016	P	15.00	18.00	23.00	27.00	35.00	20.00
					P(a)	15.00	18.00	23.00	27.00	35.00	20.00
					A	13.00	13.00				13.00

Details

Means of verification: Rapport du dép. Quartiers Défavorisés du CTE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.6	% de ménages qui ont des installations pour le lavage des mains, y compris du savon	%	5.00	2016	P	5.00	15.00	30.00	25.00	20.00		20.00
					P(a)	5.00	15.00	30.00	25.00	20.00		20.00
					A	5.00	5.00					5.00

Details

Means of verification: Enquêtes auprès des foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.7	% de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation	%	75.00	2016	P	75.00	75.00	90.00	85.00	85.00		85.00
					P(a)	75.00	75.00	90.00	85.00	85.00		85.00
					A	75.00	75.00					75.00

Details

Means of verification: Enquêtes auprès des foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Résultat 4 : L'accès aux services d'eau et d'assainissement et à l'hygiène dans des zones rurales de l'OREPA-Ouest

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'assainissement et de hygiène amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00			4,000.00
					P(a)	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00			4,000.00
					A	0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Enquêtes auprès des foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'eau amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	500.00	3,500.00	4,000.00			8,000.00
					P(a)	0.00	500.00	3,500.00	4,000.00			8,000.00
					A	0.00	0.00					0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Enquêtes auprès des foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Composante I : Renforcement institutionnel du CTE-RMPP et de la DINEPA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Contrats par résultats signés (APP)	Contract	P		1	100,000	9,000,000
			P(a)		1	100,000	9,000,000
			A	0	0	29,823	29,823
1.2	OREPA NORD dotée de matériel et de personnel pour acquérir l'éligibilité du projet HA-L1135	Unité	P	1	1	125,000	125,000
			P(a)	1	1	125,000	125,000
			A	0	0	70,365.24	70,365.24
1.3	Contrats de consultations d'appui à la DINEPA pour la regulation et le suivi des APP signés	Contrat	P	1	2	20,000	175,000
			P(a)	1	2	20,000	175,000
			A	0	0	0	0
1.4	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'accès à l'assainissement et l'hygiène , exécutées	Campagne	P		2	50,000	510,000
			P(a)		2	50,000	510,000
			A	0	0	0	0
1.5	OREPA Ouest dotée de bâtiment et matériel roulant	Unité	P	2	3	151,000	711,595.6
			P(a)	2	3	151,000	711,595.6
			A	0	0	4,944.07	4,944.07
1.6	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Unité	P	1	3	35,000	400,000
			P(a)	1	3	35,000	400,000
			A	0	0	0	0
1.7	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses structures dotées du matériel et de personnel	Unité	P	2	8	450,000	1,300,000
			P(a)	2	8	450,000	1,300,000
			A	2	2	247,969.22	247,969.22

Component Nbr. 2 Composante II : Appui au fonctionnement du CTE-RMPP et à l'entretien

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	Accords de subvention au CTE pour la facture de l'EdH signés	Accord	P	1	1	250,000	950,000
			P(a)	1	1	250,000	950,000
			A	1	1	478,747.86	478,747.86
2.2	Contrat d'approvisionnement en combustible signé	Contrat	P	1	1	100,000	750,000
			P(a)	1	1	100,000	750,000
			A	0	0	0	0
2.3	CTE-RMPP doté du personnel	Unité	P	1	4	100,000	400,000
			P(a)	1	4	100,000	400,000
			A	1	1	0	0
2.4	Agences du CTE-RMPP dotées de matériel et du personnel	Agences	P	1	3	65,000	250,000
			P(a)	1	3	65,000	250,000
			A	0	0	0	0
2.5	Travaux d'amélioration du service réalisés par le CTE	Unité	P	1	4	75,000	750,000
			P(a)	1	4	75,000	750,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Composante III : Investissements dans des travaux relatifs à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
3.1	Conduites structurantes et de refoulement installées	ml	P	2,000	17,000	1,320,000	12,500,000
			P(a)	2,000	17,000	1,320,000	12,500,000
			A	0	0	284,882.13	284,882.13
3.2	Réservoirs réhabilités ou construits	Réservoir	P	1	3	872,500	3,115,252.15
			P(a)	1	3	872,500	3,115,252.15
			A	0	0	53,912.89	53,912.89
3.3	Conduites de distribution installées	ml	P	0	9,500	990,000	10,100,000
			P(a)	0	9,500	990,000	10,100,000
			A	0	0	0	0
3.4	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	Unité	P		400	175,000	7,150,000
			P(a)		400	175,000	7,150,000
			A	0	0	0	0
3.5	Connexions installés au niveau des ménages	Connexion	P	500	31,500	150,000	4,020,000
			P(a)	500	31,500	150,000	4,020,000
			A	0	0	0	0
3.6	Armoires électriques et d'automatismes réhabilités	Unité	P		2		220,000
			P(a)		2		220,000
			A	0	0		0
3.7	Kiosques construits ou réhabilités	Kiosque	P		55		560,000
			P(a)		55		560,000
			A	0	0		0
3.8	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers dévavorisés de la RMPP signés	Contrat	P	2	5	150,000	1,219,600
			P(a)	2	5	150,000	1,219,600
			A	0	0	0	0
3.9	Contrat de supervision des grands travaux signé	Contrat	P	1	1	150,000	1,088,235
			P(a)	1	1	150,000	1,088,235
			A	1	1	0	0
3.10	Bâtiment du CTE de Ouanaminthe construit	Unité	P	1	1	137,500	250,000
			P(a)	1	1	137,500	250,000
			A	0	0	0	0
3.11	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEF réalisées	Unité	P	1	3	100,000	300,000
			P(a)	1	3	100,000	300,000
			A	0	0	0	0
3.12	Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle réalisée	Campagne	P		1		100,000
			P(a)		1		100,000
			A	0	0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Composante IV : Investissements dans les domaines de l'eau, assainissement et hygiène dans des zones rurales de l'OREPA OUEST

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
4.1	Outil de planification rural developé	Unité	P		1		100,000
			P(a)		1		100,000
			A		0		0
4.2	Campagnes d'assainissement et d'hygiène réalisées dans 8 Sections communales de l'OREPA Ouest réalisées	Campagne	P		8	40,000	511,765
			P(a)		8	40,000	511,765
			A		0	0	0
4.3	Réseau d'eau potable construites ou rehabilitées	Unité	P		4		350,000
			P(a)		4		350,000
			A		0		0
4.4	Points d'eau construites ou rehabilités	Unité	P	3	24	100,000	4,450,000
			P(a)	3	24	100,000	4,450,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 5 Composante V : Administration du Projet

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
5.1	Formations et échanges avec opérateurs régionaux réalisées	Unité	P	1	4	40,000	211,500.65
			P(a)	1	4	40,000	211,500.65
			A	1	1	29,294.53	29,294.53
5.2	Unité d'exécution dotée du personnel	Unité	P	1	4	464,000	1,952,051.6
			P(a)	1	4	464,000	1,952,051.6
			A	1	1	47,409.62	47,409.62
5.3	Unité d'exécution dotée du materiel	Unité	P	1	4	330,000	530,000
			P(a)	1	4	330,000	530,000
			A	1	1	9,841.52	9,841.52
5.4	Audits et supervisions réalisés	Unité	P	1	4	110,000	950,000
			P(a)	1	4	110,000	950,000
			A	0	0	0	0

Total Cost

	Total Cost	P			6,650,000	65,000,000
		P(a)			6,650,000	65,000,000
		A			1,257,190.08	1,257,190.08

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Nombre de CTEs de la DINEPA qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	Une erreur s'est glissée dans la saisie des valeurs de l'indicateur de la matrice des résultats à Convergence. L'équipe de projet s'en est rendu compte et à porter les correction nécessaires afin que convergence reflète la matrice des résultats pour le Outcome 1.1	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	FDUGAS	10/08/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
