

# PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1121	Chief of Operations Validation Date	09/30/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

Operation Name	Roads Integration Program II	Loan Number	3815/BL-HO
Executing Agency	Invest-Honduras	Sector/Subsector	TR-INT - TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY
Team Leader	SALAZAR GALEANO, ALFONSO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Falta realizar un análisis de los impactos sociales directos e indirectos a las comunidades ubicadas en el área de influencia directa e indirecta actualizando la evaluación de derecho de vía del año 2016 en toda la carretera Tegucigalpa- Danli. Se requiere completar la implementación del PR para los dos casos de reasentamientos y asegurar la regulación de la titulación de viviendas y puestos de venta. Falta elaborar del plan de manejo para la microcuenca Cuenca Rio Azul.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1121	75,000,000	75,000,000	2,250,000	0	77,250,000	75,000,000	29,291,456	39.06%	45,708,544
Aggregated	75,000,000	75,000,000	2,250,000	0	77,250,000	75,000,000	29,291,456	39.06%	45,708,544

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

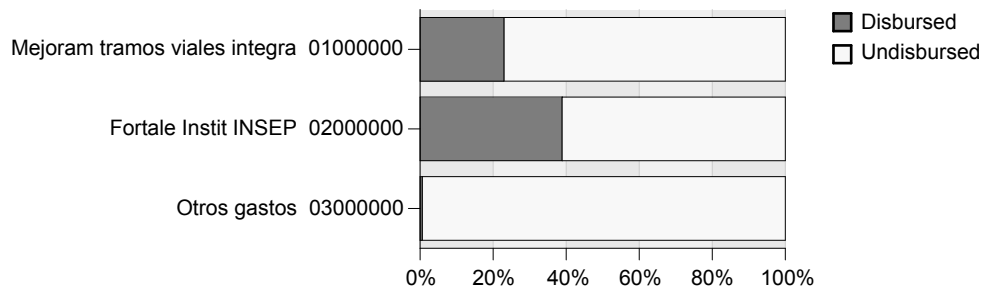

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Impacto 1: Incremento del número de vehículos de carga circulando en corredores estratégicos de integración regional

**Observation:** El número de vehículos de carga será usado como un proxy para demostrar el incremento de la actividad económica, puesto que en este tipo de vehículos se transporta bienes producidos para consumo interno y de exportación. Estará compuesto por los tipos de vehículo siguientes: C2, C3, Camión Articulado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Número de vehículos de carga circulando diariamente en los tramos intervenidos. Tramo La Barca - Pimienta	Vehículos/día	3,467.00	2016	P	4,892.00	4,892.00
					P(a)	4,892.00	4,892.00
					A		
Details							
Means of verification: Estudio de Tránsito, Highway Development and Management (HDM-4)							
Observations: Responsable: INVEST-H							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Resultado 1: Reducción de los costos generalizados del transporte

**Observation:** Por la naturaleza del programa, no se requiere evaluación intermedia.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Costo promedio de operación vehicular en los tramos de corredores de integración regional intervenidos por el programa tramo La Barca-Pimienta	US\$ / Vehículo-Km	0.48	2016	P	0.38	0.38
					P(a)	0.38	0.38
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estudio de Tránsito Evaluación Ex Post

**Observations:** Responsable: INVEST-H

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Tiempo promedio de viaje en los tramos de corredores de integración regional intervenidos por el programa	Minutos	25.00	2016	P	16.00	16.00
					P(a)	16.00	16.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Estudio de Velocidades Evaluación Ex Post

**Observations:** Responsable: INVEST-H

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Mejoramiento de tramos viales de integración

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Km de carreteras construidas o mejoradas: Tramo La Barca - Pimienta	Roads (km)	P	23	23	19,379,122	48,309,800
			P(a)	10.5	23	21,014,362.68	47,014,190
			A	0	0	10,375,531.49	24,897,183.8
1.2	km de carretera del Tramo Neteapa-Danlí (CA-6) rehabilitados por el programa	Roads (km)	P	0	4	12,485,861	26,940,200
			P(a)	0	18.02	1,190,748	27,000,000
			A	0	0	0	0
1.3	Número de capacitaciones realizadas por el Gobierno de Honduras en empleos no tradicionales a mujeres	No. de talleres de capacitació	P	0	1	50,000	250,000
			P(a)	0	5	78,680.49	250,000
			A	0	5	67,421.6	209,733.19

## Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento Institucional INSEP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Número de capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	No. de talleres de capacitació	P	1	4	180,000	330,000
			P(a)	2	4	66,000	233,497.28
			A	0	0	0	3,497.28
2.2	Unidades operativas de INSEP fortalecidas	No. de unidades acondicionadas	P	3	3	80,000	420,000
			P(a)	3	3	150,542.26	467,810.72
			A	0	0	91,405.06	296,706.56

## Other Cost

	Gerencia del Programa	P			250,000	875,000
		P(a)			0	2,128,910
		A			0	0
	Monitoreo y Evaluación	P			0	50,000
		P(a)			0	50,000
		A			0	0
	Auditoría Externa	P			21,400	75,000
		P(a)			30,740	105,592
		A			14,235.5	28,323

## Total Cost

	Total Cost	P			32,446,383	77,250,000
		P(a)			22,531,073.43	77,250,000
		A			10,548,593.65	25,435,443.83

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
