

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ME-L1176	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/10/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/04/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Comprehensive Development Project For Water and Sanitation Utilities (PRODI)	<b>Loan Number</b>	3591/OC-ME
<b>Executing Agency</b>	Comisión Nacional del Agua	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	RIQUELME, RODRIGO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	MEXICO
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1176	200,000,000	34,300,000	0	0	200,000,000	34,300,000	18,876,140.71	55.03%	15,423,859.29
Aggregated	200,000,000	34,300,000	0	0	200,000,000	34,300,000	18,876,140.71	55.03%	15,423,859.29

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

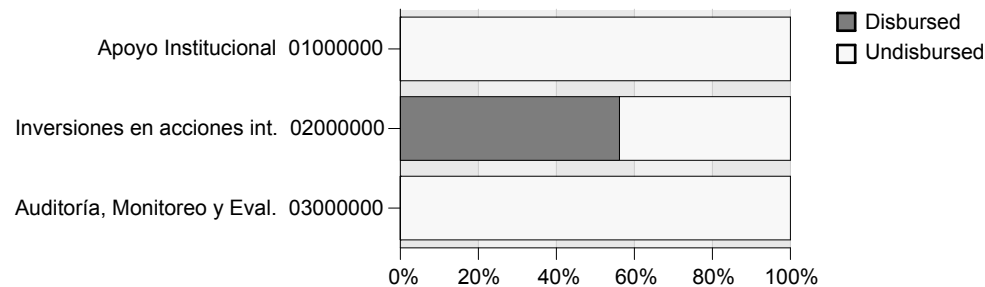

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 y 900 mil habitantes

**Observation:** Se entiende como acceso mejorado a hogares con servicio de agua las 24 horas del día.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
0.0	Proporción de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Porcentaje (%)	49.00	2014	P	52.00	55.00	55.00
					P(a)	52.00	55.00	55.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de la evaluación final. Encuesta Nacional de Hogares.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
0.1	Número de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Households (#)	4,000,000.00	2014	P			
					P(a)	4,400,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de la evaluación final. Encuesta Nacional de Hogares.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Porcentaje de agua no contabilizada en prestadores que atienden a entre 50 mil y 900 mil habitantes

**Observation:** El agua no contabilizada corresponde a la proporción del agua producida (agua extraída más agua en bloque recibida) que no es facturada

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de agua no contabilizada en prestadores que atienden a entre 50 mil y 900 mil habitantes	Porcentaje (%)	56.00	2013	P	55.00	54.00	54.00
					P(a)	55.00	54.00	54.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación final. Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Proporción de ingresos que se destina a gastos en bienes y servicios y a remuneraciones en prestadores que atienden entre 50 mil y 900 mil habitantes

**Observation:** El indicador se calculará como el cociente de la suma de los gastos en bienes y servicios y las remuneraciones entre los ingresos totales por suministro de bienes y servicios de los prestadores

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Proporción de ingresos que se destina a gastos en bienes y servicios y a remuneraciones en prestadores que atienden entre 50 mil y 900 mil habitantes	Porcentaje (%)	87.00	2013	P	82.00	75.00	75.00
					P(a)	82.00	75.00	75.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación final. Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Talleres, eventos y acciones de apoyo institucional. Incluye cursos de inducción, seminarios, elaboración de estudios y análisis que contribuyan al desarrollo integral de los OO.	Evento	P	4	15	80,000	300,000
			P(a)	20	121	500,000	4,555,280
			A	78	179	1,471,000	5,526,280

#### Component Nbr. 2 Componente II: Inversión en acciones integrales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Plan	P	0	65		2,500,000
			P(a)	0	99	0	2,212,622
			A	0	99	0	2,212,622
2.2	Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating	Acción	P	2	7	80,000	280,000
			P(a)	2	2	80,000	80,000
			A	0	0	0	0
2.3	Acciones para la mejora de la gestión comercial en todos sus procesos como padrón de usuarios, micromedición, lecturas, facturación, cobro, etc., derivadas del PAI Gestión Comercial de los PDI. Se agregan también las acciones para apoyar la sostenibilidad de la gestión del organismo operador, provenientes del PAI de sostenibilidad de los PDI.	Acción	P	5	18	486,111	1,750,000
			P(a)	60	138	15,600,000	34,955,056
			A	64	142	15,914,000	35,269,056
2.4	Acciones para la reducción de pérdidas físicas en la infraestructura hidráulica de agua potable, macromedición, sectorización, sistematización, catastro, etc. Del PAI de Pérdidas Físicas de los PDI.	Acción	P	35	110	64,261,563	201,964,912
			P(a)	60	117	8,400,000	16,229,622
			A	47	104	7,142,000	14,971,622
2.5	Acciones para reducir el gasto de energía eléctrica y la optimización de equipos electromecánicos, derivados del PAI de Energía Eléctrica de los PDI	Acción	P	60	185	39,916,840	123,076,923
			P(a)	70	98	8,000,000	11,937,514
			A	37	65	6,788,000	10,725,514
2.6	Esquemas de financiamiento diseñados	Esquema	P	0	2		500,000
			P(a)	1	1	50,000	50,000
			A	0	0	0	0

#### Other Cost

	Auditoria y monitoreo	P			80,000	400,000
		P(a)			80,000	80,000
		A			0	0

#### Total Cost

	Total Cost	P			104,904,514	330,771,835
		P(a)			32,710,000	70,100,094
		A			31,315,000	68,705,094

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
