

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1146	Chief of Operations Validation Date	10/21/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage	Loan Number	4450/OC-PN, 4451/OC-PN
Executing Agency	Instituto Nacional de Cultura, Ministerio de Ambiente	Sector/Subsector	DU-HER - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	NAVARRETE, JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PANAMA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>Todavía no se ha iniciado ninguna obra civil. Se están cumpliendo todos los requisitos socioambientales establecidos en los contratos de préstamo como condiciones previas para la licitación y/o inicio de obras.</p> <p>Las Agencias Ejecutoras se acaban de renovar después del reciente cambio de gobierno. La AE de MiAmbiente ha desinado al especialista ambiental del Programa, pero todavía no cuenta con especialista social (en proceso de contratación). La AE de Cultura está en proceso de contratación del ente gestor de sus componentes, el cual incluirá un especialista social y uno ambiental.</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1146	107,000,000	107,000,000	6,200,000	0	113,200,000	107,000,000	7,829,400	7.32%	99,170,600
Aggregated	107,000,000	107,000,000	6,200,000	0	113,200,000	107,000,000	7,829,400	7.32%	99,170,600

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

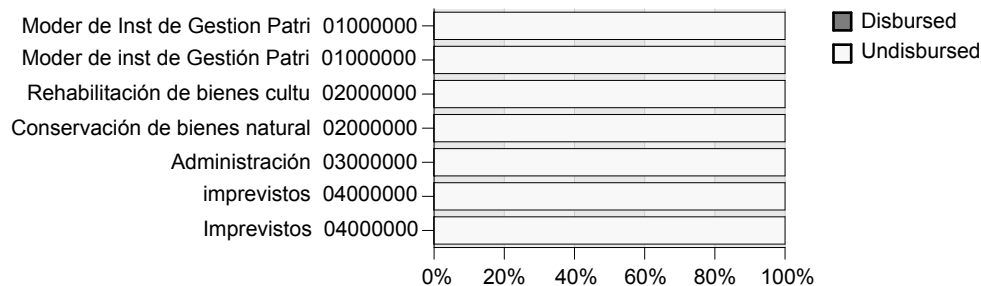

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Gestión del INAC fortalecida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.0	Ingresos propios anuales sobre el total del presupuesto anual del INAC	%	2.00	2016	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de avance del II semestre de cada año

Observations: El INAC cuenta con ingresos propios por los arrendamientos de los teatros y estacionamientos, el cobro de las entradas a los museos, matriculas de las Escuelas de Bellas Artes y Folklore entre otros.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.1	Consultas anuales al Sistema de Información Cultural de Panamá	Hitos /año	0.00	2017	P	30,000.00	30,000.00
					P(a)	30,000.00	30,000.00
					A		

Details

Means of verification: Página WEB del SICP Informes de avance del segundo semestre de cada año

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Bienes culturales rehabilitados y puestos en valor- INAC

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.0	Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital cultural	#	39,500.00	2016	P	55,000.00	55,000.00
					P(a)	55,000.00	55,000.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de los Patronatos y de Avance del Programa (semestrales)

Observations: Se refieren a los turistas nacionales e internacionales que visitan las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Visitas diarias promedio al MARTA por año	#	0.00	2017	P	120.00		120.00
					P(a)	120.00		120.00
					A			

Details

Means of verification: Informes de gestión de la Coordinación Nacional de Museos/INAC

Observations: Actualmente este promedio para el total de los Museos Públicos en el país (sin el MARTA) es de 213.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.2	Fortificaciones intervenidas por el proyecto retiradas de la de Lista de Patrimonio Mundial en peligro (LPMP) de la UNESCO.	#	2017	P	1.00		1.00
				P(a)	1.00		1.00
				A			

Details

Means of verification: Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO

Observations: Las fortificaciones intervenidas se encuentran, desde 2012, en la LPMP. La UNESCO mide estas fortificaciones como un conjunto único.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.3	Proyectos de emprendimiento vinculados a los bienes culturales que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación.	%	2017	P	30.00		30.00
				P(a)	30.00		30.00
				A			

Details

Means of verification: Informes de avance del proyecto.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Áreas Naturales Protegidas con una gestión sostenible- MiAmbiente

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
2.0	Brecha financiera en la gestión del Parque Nacional Coiba (PNC) ²	%	2016	P	40.00		40.00
				P(a)	40.00		40.00
				A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informe de gestión del SINAP y de avances del Proyecto.

Observations: Es la relación entre ingresos propios y los gastos para su gestión. Se refiere exclusivamente al PNC ya que sus ingresos representan el 86% del total de los ingresos de las 4 áreas intervenidas (\$466 mil de \$542 mil).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
2.1	Efectividad de la gestión de las AP intervenidas	#	48.00	2016	P	60.00		60.00
					P(a)	60.00		60.00
					A			

Details

Means of verification: Es la relación entre ingresos propios y los gastos para su gestión. Se refiere exclusivamente al PNC ya que sus ingresos representan el 86% del total de los ingresos de las 4 áreas intervenidas (\$466 mil de \$542 mil).

Observations: La línea de base es la media del valor de referencia de la herramienta de seguimiento obtenida para las 4 AP en el PMEMAP del SINAP. Consiste en 33 indicadores que se agrupan en cinco ámbitos de gestión.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Bienes naturales preservados y con uso sostenible - MiAmbiente

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
3.0	PNC se mantiene como Patrimonio Natural de la Humanidad (LPM) de la UNESCO	#	1.00	2017	P	1.00		1.00
					P(a)	1.00		1.00
					A			

Details

Means of verification: Informe de la UNESCO sobre Lista de Patrimonio Mundial e informes de avance del proyecto.

Observations: UNESCO hizo una serie de recomendaciones con carácter urgente para no colocarlo en la LPMP.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
3.1	Visitas promedio anuales al PNC en relación a su capacidad de carga efectiva (CCE)*	%	39.00	2017	P	67.00		67.00
					P(a)	67.00		67.00
					A			

Details

Means of verification: Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Se refiere a la ensenada de Gambute el área más visitada. En 2016 recibió un promedio anual de 41 visitas diarias frente a una CCE de 105 (39%).

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
3.2	Visitas promedios anuales al PNP/CCE	%	35.00	2016	P	60.00		60.00
					P(a)	60.00		60.00
					A			

Details

Means of verification: Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto.

Observations: Se refiere al Sendero Pavón el más utilizado, de los dos existentes. En 2016 recibió un promedio anual de 54 visitas diarias frente a una CCE de 153 (35%).

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
3.3	Visitas promedio anuales al PNVB/CCE	%	13.00	2016	P	25.00		25.00
					P(a)	25.00		25.00
					A			

Details

Means of verification: Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto.

Observations: Se refiere a la Vía Camiseta que es la más utilizada y da acceso a la cima del volcán. En 2016 recibió un promedio anual de 25 visitas diarias frente a una CCE de 139 (18%).

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
3.4	Hectáreas de áreas territoriales y marinas con una gestión mejorada en el contexto de corredores biológicos y ecosistemas naturales	#	0.00	2017	P	314.00		314.00
					P(a)	314.00		314.00
					A			

Details

Observations: PNC (254,822Ha); PNVB (35,838Ha); AP de Portobelo y San Lorenzo (22,909Ha) . La mejora de la gestión se medirá con el Resultado anterior (4.5)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
3.5	Proyectos de emprendimiento vinculados a las AP que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación	%	0.00	2017	P	30.00		30.00
					P(a)	30.00		30.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.5	Proyectos de emprendimiento vinculados a las AP que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación	%	0.00	2017	A			
Details								
Means of verification: Informes de Avance del Proyecto.								
Observations: Las actividades de emprendimiento buscan incentivar la capacidad emprendedora local mediante el fomento de proyectos de turismo en AP a través de instancias de asociatividad microempresaria turística, la capacitación continua a emprendedores y la asistencia en la formulación y la gestión de proyectos turísticos.								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
3.6	Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural	#	0.00	2017	P	150,000.00		150,000.00
					P(a)	150,000.00		150,000.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes de Avances de proyecto								
Observations: La mejor gestión del capital natural se mide anualmente con el PMEMAP. A partir del momento que el AP obtenga una nota mayor del 10% a la actual se contabilizará los visitantes anuales como beneficiarios, la meta es acumulativa para las 4 AP. En el PMR se desagregará por año.								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 : Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial INAC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado	# Plan	P	0	1	33,000	733,000
			P(a)	0	1	33,000	733,000
			A	0	0	0	0
1.2	Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada	# Talleres	P	0	50	0	400,000
			P(a)	0	50	0	400,000
			A	0	0	0	0
1.3	Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado	# Sistema	P	0	1	0	815,000
			P(a)	0	1	0	815,000
			A	0	0	0	0
1.4	Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado	# Sistema	P	0	1	50,000	250,000
			P(a)	0	1	50,000	250,000
			A	0	0	0	0
1.5	Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado	# Plan	P	0	1	42,000	210,000
			P(a)	0	1	42,000	210,000
			A	0	0	0	0
1.6	Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado	# Plan	P	0	1	54,000	366,000
			P(a)	0	1	54,000	366,000
			A	0	0	0	0
1.7	Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada	# Cursos	P	0	10	0	150,000
			P(a)	0	10	0	150,000
			A	0	0	0	0
1.8	Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas	# MIPYMES	P	0	50	0	1,000,000
			P(a)	0	50	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales INAC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Plan de gestión del Teatro Nacional implementado	# plan	P	0	1	315,000	1,018,000
			P(a)	0	1	315,000	1,018,000
			A	0	0		0
2.2	Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado	# Obras	P	0	1	2,143,415	10,717,076
			P(a)	0	1	2,143,415	10,717,076
			A	0	0		0
2.3	Plan de gestión del museo implementado	# Instrumentos	P	0	1	0	813,000
			P(a)	0	1	0	813,000
			A	0	0		0
2.4	Obras de contención en Portobelo realizadas	# Obras	P	0	1	40,000	2,000,000
			P(a)	0	1	40,000	2,000,000
			A	0	0		0
2.5	Fuerter en Portobelo restaurados y rehabilitados	# Fuerter	P	0	4	0	12,680,000
			P(a)	0	4	0	12,680,000
			A	0	0		0
2.6	Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada	# Obras	P	0	1	57,000	570,000
			P(a)	0	1	57,000	570,000
			A	0	0	0	0
2.7	Muelles construídos y/o rehabilitados	# Obras	P	0	2	0	714,286
			P(a)	0	2	0	714,286
			A	0	0	0	0
2.8	Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado	# Fuerter	P	0	1	818,980	4,094,900
			P(a)	0	1	818,980	4,094,900
			A	0	0	0	0
2.9	Plan de manejo para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborado	# Obras	P	0	1	92,000	920,000
			P(a)	0	1	92,000	920,000
			A	0	0	0	0
2.10	Fortalecimiento Institucional y Administrativo del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, implementado	# Talleres	P	0	10	0	334,000
			P(a)	0	10	0	334,000
			A	0	0	0	0
2.11	Capacitación en restauración y conservación de fuerter realizada	# Cursos	P	0	2	0	200,000
			P(a)	0	2	0	200,000
			A	0	0	0	0
2.12	Edificio de la Aduana rehabilitado	# Obras	P	0	1	95,000	950,000
			P(a)	0	1	95,000	950,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial MiAmbiente

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Planes de negocios realizados	# Planes	P	2	20	40,000	544,000
			P(a)	2	20	40,000	544,000
			A	0	0	0	0
3.2	Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada	# Talleres	P	1	15	52,000	780,000
			P(a)	1	15	52,000	780,000
			A	0	0	0	0
3.3	Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas	# MIPYMES	P	0	20	0	150,000
			P(a)	0	20	0	150,000
			A	0	0	0	0
3.4	Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada	# Talleres	P	1	10	15,000	200,000
			P(a)	1	10	15,000	200,000
			A	0	0	0	0
3.5	Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada	# Estrategia	P	0	4	0	1,200,000
			P(a)	0	4	0	1,200,000
			A	0	0	0	0
3.6	Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado	# Proyecto	P	0	1	0	1,993,400
			P(a)	0	1	0	1,993,400
			A	0	0	0	0
3.7	Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas	# Plataforma	P	0	2	0	1,132,000
			P(a)	0	2	0	1,132,000
			A	0	0	0	0
3.8	Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado	# Plan	P	0	1	70,000	700,000
			P(a)	0	1	70,000	700,000
			A	0	0	0	0
3.9	Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados	# Estudio	P	0	4	0	1,000,000
			P(a)	0	4	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
3.10	Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado	# Plan	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Conservación y Valorización de Bienes Naturales MiAMBIENTE

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
4.1	PNC rehabilitado para preservación completado	# Parques	P	0	1	0	27,500,000
			P(a)	0	1	0	27,500,000
			A	0	0	0	0
4.2	Parque Nacional Portobelo y San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado	# Parques	P	0	1	2,329,400	20,800,600
			P(a)	0	1	2,329,400	20,800,600
			A	0	0	0	0
4.3	PNVB rehabilitado para preservacion completado	# Parques	P	0	1	0	2,100,000
			P(a)	0	1	0	2,100,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración del Proyecto- INAC	P			1,140,349	7,264,738
		P(a)			1,140,349	7,264,738
		A			65,633	91,133
	Administración del Proyecto- MIAMBIENTE	P			1,276,721	8,600,000
		P(a)			1,276,721	8,600,000
		A			251,699.35	643,739.35

Total Cost

	Total Cost	P			8,663,865	113,200,000
		P(a)			8,663,865	113,200,000
		A			317,332.35	734,872.35

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Stakeholder Priorities
