

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1136	Chief of Operations Validation Date	10/15/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Montevideo Urban Sanitation Program (PSU V)	Loan Number	3805/OC-UR
Executing Agency	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	BASANI, MARCELLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Aún restan ejecutar expropiaciones para concretar el avance de la obra y además ninguna de las componentes del sistema comenzó a operar. Por lo tanto, es necesario supervisar de cerca la operación para asegurar que se cumple con las políticas de reasentamiento involuntario y de prevención de la contaminación, esto último especialmente mientras se haga la puesta en marcha del sistema.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1136	60,000,000	60,000,000	9,800,000	0	69,800,000	60,000,000	4,052,227.58	6.75%	55,947,772.42
Aggregated	60,000,000	60,000,000	9,800,000	0	69,800,000	60,000,000	4,052,227.58	6.75%	55,947,772.42

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

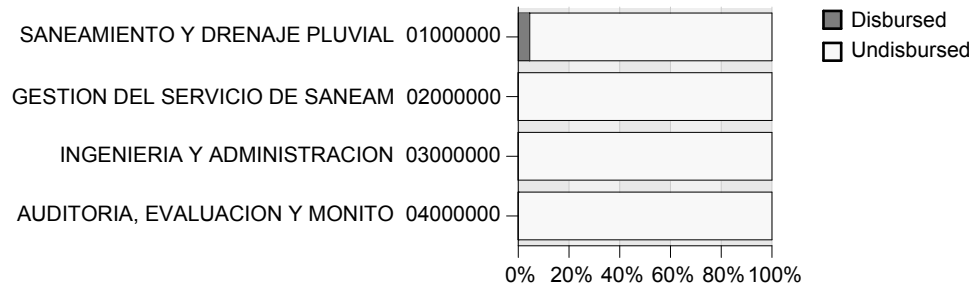

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Calidad de agua de la Bahía de Montevideo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Carga orgánica diaria vertida a la Bahía de Montevideo en tiempo seco a través del Sistema de Saneamiento.	tonDBO/ día	47.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00
					P(a)	0.00	0.00	47.00	16.00	16.00	16.00	16.00
					A	47.00	47.00	47.00				
Details												
Means of verification: Mediciones realizadas por el Laboratorio de calidad ambiental de la Intendencia de Montevideo.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

Outcome Nbr. 1: Inundaciones en días de lluvias fuertes en Barrio Manga reducidas

Observation: Se define lluvia fuerte a una precipitación de 20 milímetros en 30 minutos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Porcentaje de días al año con lluvias fuertes en que el Barrio Manga se inunda.	% de días	100.00	2016	P	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					P(a)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					A	100.00	100.00	100.00				
Details												
Means of verification: Relevamiento del barrio, por parte del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS), luego de evento con lluvias fuertes.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 2: Hogares con conexiones habilitadas a redes de saneamiento en área de proyecto Manga y Casabó incrementadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Porcentaje de hogares con conexión habilitada a redes de saneamiento en el área de proyecto Manga y Casabó.	% de Hogares	0.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	21.00	31.00	43.00	43.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	21.00	31.00	43.00	43.00
					A		0.00	0.00				
Details												
Means of verification: Datos suministrados por el Servicio de Administración de Saneamiento (SAS) en base al sistema de conexiones.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 3: Ingresos por concepto de facturación de tarifa de saneamiento incrementados en Montevideo

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Facturación por concepto de Tarifa de Saneamiento en Montevideo	Millones de pesos corrientes	1.41	2015	P	1,527.00	1,649.00	1,781.00	1,923.00	2,077.00	2,243.00	2,243.00
					P(a)	1,527.00	1,664.00	1,720.00	1,923.00	2,077.00	2,243.00	2,243.00
					A	1,534.00	1,664.00	1,720.00				
Details												
Means of verification: Datos suministrados por el SAS. Información Anual.												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Obras de saneamiento y drenaje pluvial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Número de hogares en la cuenca del Arroyo Miguelete y Cañada Chacarita con aguas residuales tratadas en el Sistema de Disposición Final Oeste.	Households (#)	P	0	93,186	4,230,000	8,040,000
			P(a)	0	93,186	0	8,040,000
			A	0	0	0	2,271,940.03
1.2	Número de hogares con servicio de saneamiento por red en el Barrio de Manga.	Households (#)	P	0	6,610	1,269,000	24,544,000
			P(a)	0	6,610	945,062.99	18,094,129.63
			A	0	0	164,045	164,045
1.3	Sistema de drenaje en el barrio Manga construido	Sistema	P	0	1	550,000	14,146,000
			P(a)	0	1	621,695.97	20,934,270
			A	0	0	0	0
1.4	Reasentamientos y expropiaciones en el barrio Manga realizadas	Familias y terrenos	P	10	19	1,000,000	2,000,000
			P(a)	19	19	2,000,000	2,000,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II. Mejora de la gestión del servicio de saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	Catastro actualizado e incorporación y gestión de usuarios especiales implementado	Programas	P	0	2	0	1,300,000
			P(a)	0	2	0	1,300,000
			A	0	0	0	0
2.2	Programa de conexiones intradomiciliarias diseñando e implementado en Manga y Casabó.	Programas	P	0	73.49	0	2,000,000
			P(a)	0	73.49	42,273.12	2,000,000
			A	0	0	42,273	42,273

Other Cost

	Ingeniería y Administración	P			543,000	5,620,000
		P(a)			2,042,500	9,474,179.4
		A			502,881.04	1,287,060.44
	Auditoría, Evaluación y Monitoreo	P			40,000	200,000
		P(a)			10,000	200,000
		A			9,528.46	9,528.46
	Sin asignación específica	P			0	7,650,000
		P(a)			0	7,650,000
		A				0
	Costos financieros	P			812,000	4,300,000
		P(a)			487,770	4,670,436.02
		A			79,706.55	717,483.53

Total Cost

	Total Cost	P			8,444,000	69,800,000
		P(a)			6,149,302.08	74,363,015.05
		A			798,434.05	4,492,330.46

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
