

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1258	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/14/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Water and Sanitation Services Development Program – Belgrano Plan	<b>Loan Number</b>	4312/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1258	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	5,013,130	2.51%	194,986,870
<b>Aggregated</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>5,013,130</b>	<b>2.51%</b>	<b>194,986,870</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

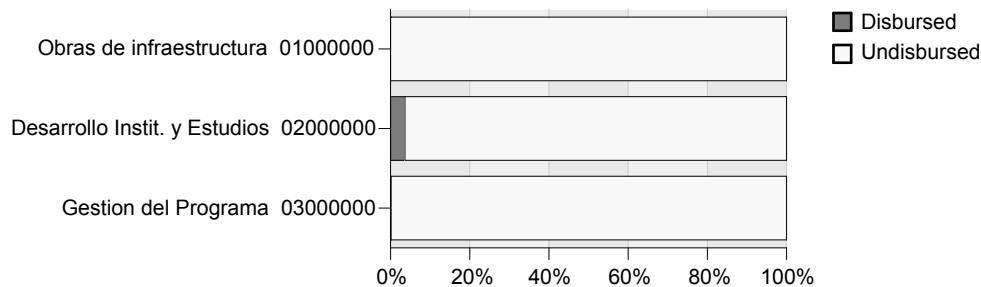

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejora de la Salud y el Bienestar de la Población

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	3,415.00	2017	P	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00		2,732.00
					P(a)	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00		2,732.00
					A	3,415.00	3,415.00					3,415.00

#### Details

**Means of verification:** Boletín integrado de vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

**Observations:** Ninguna

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Resultado 1: Cobertura del servicio de agua potable ampliada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Hogares con nuevo acceso a sistemas de agua potable por red en la región del Plan Belgrano.	Households (#)	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
				A	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

**Observations:** Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.1	Cobertura de agua potable en la región del Plan Belgrano.	%	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	92.47
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	92.47
				A	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Resultado 2: Cobertura del servicio de saneamiento ampliada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.0	Hogares con acceso a nuevas redes cloacales en la región del Plan Belgrano	Households (#)	2016	P	0.00	0.00	0.00	8,750.00	14,500.00	29,000.00	29,000.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	23,250.00	29,000.00
				A	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto;

**Observations:** se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la región del Plan Belgrano	Households (#)	100,000.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	200,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	19,000.00	219,000.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

**Observations:** Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.2	Cobertura de saneamiento en la región del Plan Belgrano.	%	46.70	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14	0.00	48.14
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14	0.00	48.14
					A	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.0	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Aguas de Formosa	%	87.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.1	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Agua Potable de Jujuy	%	92.70	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	99.80
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	99.80
					A	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.2	Cobertura de micromedición en la región del Plan Belgrano (Hogares con micromedidores de agua instalados y en funcionamiento / Total de hogares con servicio de agua potable por red)	%	41.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	0.00	41.30
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	0.00	41.30
					A	0.00	0.00	0.00				
Details												
Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Obras de infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Sistemas de Agua Potable construidos	sistema	P	0	1	0	15,000,000
			P(a)	0	1	0	15,317,490
			A	0	0	0	0
1.2	Sistemas de Saneamiento construidos	sistema	P	0	5	0	232,000,000
			P(a)	0	5	0	232,000,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo institucional y estudios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	No. de Planes	P	2	4	5,325,000	5,325,000
			P(a)	2	4	5,325,000	5,007,507
			A	2	2	2,665,014	2,665,014
2.2	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de micromedidores	P	0	25,000	0	9,675,000
			P(a)	0	25,000	0	9,675,000
			A	0	0	0	0
2.3	Macromedidores instalados instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de macromedidores	P	0	160	0	5,000,000
			P(a)	0	160	0	5,000,003
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Administración del Programa	P			300,000	1,500,000
		P(a)			300,000	1,500,000
		A			104,301	104,301
	Monitoreo, Evaluación y Auditorías	P			0	1,500,000
		P(a)			0	1,500,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			5,625,000	270,000,000
		P(a)			5,625,000	270,000,000
		A			2,769,315	2,769,315

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	El Programa sufrió reprogramaciones financieras, debido principalmente a la devaluación del peso argentino frente al dolar en el 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SOFIAG	03/18/2020
	Macromedidores instalados instalados en la región del Plan Belgrano.	Se modificó el valor financiero por pedido del ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SOFIAG	03/18/2020
	Sistemas de Agua Potable construidos	El Programa sufrió reprogramaciones financieras, debido principalmente a la devaluación del peso argentino frente al dolar en el 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SOFIAG	03/12/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity
