

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1067	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/03/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/03/20
<b>Last Update</b>	03/31/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/03/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi	<b>Loan Number</b>	2614/BL-BO, 2614/BL-BO-1, 2614/BL-BO-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	BUSCARONS CUESTA, LUIS	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Bolivia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Debido a las importantes incumplimientos en las áreas de derechos de propiedad, licencias ambientales e interacción con una comunidad indígena vecina, se desarrolló un plan de acción correctiva por primera vez en 2016. La segunda misión de supervisión del año 2019 mostró muy pocos avances en estas áreas identificadas, se ha realizado un esfuerzo común entre el líder del equipo, la consultora SIMBIOSIS y ESG que han resuelto varios de los problemas pendientes, en particular los mas importantes. Por lo tanto, la clasificación se mantiene.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1067	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	35,000,000	100.00%	0
Aggregated	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	35,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

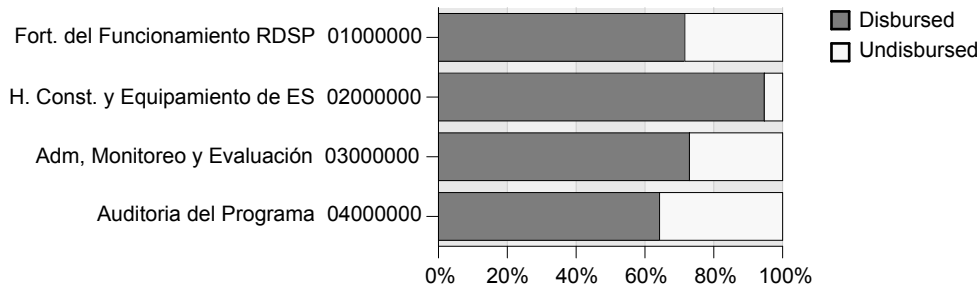

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mortalidad materno infantil en el Departamento de Potosi reducida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.1	Tasa de mortalidad infantil por 1000 NV	por 1000 NV	50.00	2003	P								30.00
					P(a)								30.00
					A				0.00		30.00		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.2	Razon de Mortalidad materna en el Departamento de Potosi	Razon	310.00	2008	P								100.00
					P(a)								100.00
					A				0.00		100.00		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Observations:** Existe discrepancias entre las cifras de fuentes nacionales (Ministerio de Salud) e internacionales (OMS/OPS) para este indicador, siendo los internacionales en el rango de 350 - 400 para Potosí. Adicionalmente, es probable que en los primeros años de ejecución, se registrarán más muertes por mejoras en el registro.(2015, esta por publicarse un estudio específico sobre mortalidad materna a partir del levantamiento de información en puestos "Centinela")

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.3	Tasa de Mortalidad neonatal	por 1000 NV	27.00	2003	P								0.00
					P(a)								11.18
					A				0.00		11.18		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.1	Cobertura de Parto Institucional	porcentaje	36.00	2010	P							55.00
					P(a)							55.00
					A			0.00	50.00	64.40		

#### Details

**Means of verification:** SNIS Departamental (Potosí)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.2	Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P							80.00
					P(a)							80.00
					A			0.00		20.10		

#### Details

**Means of verification:** Registros hospitalarios

**Observations:** El proyecto deberá establecer un sistema de monitoreo específico para este indicador.

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.3	Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P							50.00
					P(a)							50.00
					A			0.00		0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes específicos del proyecto.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.4	Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número	2011	P								200.00
				P(a)								13.00
				A				0.00		13.00		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

##### Details

**Means of verification:** Informes de Servicio Departamental de Salud, al final del proyecto se puede verificar con el Estudio de Brechas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.5	Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Personas	50.00	2011	P							200.00
					P(a)							200.00
					A			0.00		0.00		

##### Details

**Means of verification:** Informe específico del proyecto.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.6	Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Beneficiaries (#)	1,902.00	2013	P	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00		5,000.00
					P(a)	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00		5,000.00
					A		0.00	0.00	0.00		20,271.00	

##### Details

**Means of verification:** Registro del Bono Juana Azurduy

**Observations:** Se considerará al binomio Madre - Hijo que ha recibido atención al parto y atención post-parto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

	Indigenous				P							
					P(a)							5,000.00
					A					20,271.00		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio	P		3		100,000
			P(a)		3	0	128,305.14
			A		3	0	128,305.14
1.2	Plan de promoción de salud implementado	Plan	P		1		1,018,000
			P(a)	1	1	166,239	348,015.79
			A	1	1	208,443	327,383.79
1.3	Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas	P		30		210,000
			P(a)		30	0	535,612
			A		30	0	535,612
1.4	Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas	P		200		200,000
			P(a)	200	306	200,350	177,071.15
			A	272	272	88,221	166,167.15
1.5	Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema	P		1		500,000
			P(a)	1	1	708,099	1,460,697.77
			A	1	1	662,487	1,453,402.77
1.6	Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento	P		1		75,000
			P(a)		1	0	5,002.48
			A		1	0	5,002.48
1.7	Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad	P		1		450,000
			P(a)		1	0	311,867
			A		1	0	311,867
1.8	Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia	P		1		1,314,000
			P(a)	1	1	182,259	1,495,500.3
			A	1	1	188,047	1,490,993.3
1.9	Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas	P		90		280,000
			P(a)	90	90	90,971	327,508.02
			A	25	25	14,992	288,732.02
1.10	Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema	P		1		68,000
			P(a)	1	1	14,452	61,747.76
			A	1	1	0	37,494.76

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Inversiones en infraestructura y equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua diseñado	Hospital	P		1		310,000
			P(a)		1	0	452,429.71
			A		1	0	452,429.71
2.2	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua construido	Hospital	P		1		6,730,000
			P(a)	1	1	2,638,862.96	12,488,745.89
			A	1	1	2,011,167.05	11,956,755.61
2.3	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua equipado	Hospital	P		1		2,106,000
			P(a)	1	1	984,418.51	1,224,358.27
			A	1	1	902,506.05	1,142,445.81
2.4	Hospital Ocuri construido	Hospital	P		1		4,200,000
			P(a)	1	1	2,709,753.43	6,987,895.8
			A	1	1	2,002,106.28	6,017,970.01
2.5	Hospital de Ocurí equipado	Hospital	P		1		1,180,000
			P(a)	1	1	417,900.07	516,210.22
			A	1	1	417,900.07	516,210.22
2.6	Hospitales de Ocurí y Llalagua operando	Hospital	P		2		4,220,000
			P(a)	2	2	4,220,000	4,220,000
			A	0	0	26,632	26,632
2.7	Centro de coordinación de urgencias construido	Centro	P		1		450,000
			P(a)		1	0	1,049,893.47
			A		1	0	1,049,893.47
2.8	Establecimientos de salud ampliados y/o remodelados	Establecimiento	P		1		2,800,000
			P(a)		7	0	2,732,912.87
			A		7	0	2,732,912.87
2.9	Establecimientos de salud construidos	Establecimiento	P		2		1,800,000
			P(a)	1	2	295,352.7	1,942,152.62
			A	1	2	201,946.75	1,939,152.62
2.10	Establecimientos de salud equipados	Establecimiento	P		8		8,549,185
			P(a)	1	11	223,868.11	2,030,260.46
			A	1	11	147,616.49	2,030,175.9

## Component Nbr. 3 Administracion y Monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	P			740,000
		P(a)		357,064.01	1,546,357
		A		309,403	1,398,863
	Auditorías	P			200,000
		P(a)		71,529	225,000.04
		A		35,630	164,101.03

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P				995,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Monitoreo y evaluación	P				1,100,000
		P(a)			51,020	137,316.06
		A			0	117,316.06
	Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	P				2,674,815
		P(a)			109,647.12	1,865,140.18
		A			93,525.82	1,849,018.88

Total Cost

	Total Cost	P				42,270,000
		P(a)			13,441,785.91	42,270,000
		A			7,310,623.51	36,138,837.6

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Establecimientos de salud construidos	No se modifica el producto, únicamente se procede con la replanificación financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/13/2020
	Establecimientos de salud equipados	No se modifica el producto, únicamente se procede con la replanificación financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/13/2020
	Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	No se ha modificado la matriz, únicamente se ha procedido con la replanificación financiera para la gestión.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/31/2020
	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua construido	No se modifica el producto, únicamente se procede con la replanificación financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/25/2020
	Hospital Ocuri construido	No se modifica el producto, únicamente se procede con la replanificación financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/13/2020
	Personal de los centros de primer nivel capacitado	No se modifica el producto, únicamente se procede con la replanificación financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/31/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JOYCEE	03/13/2020
	Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	No se ha modificado la matriz, únicamente se ha procedido con la replanificación financiera para la gestión.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/31/2020
	Plan de promoción de salud implementado	No se ha modificado la matriz, únicamente se ha procedido con la replanificación financiera para la gestión.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/31/2020
	Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	No se ha modificado la matriz, únicamente se ha procedido con la replanificación financiera para la gestión.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/31/2020
	Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	No se ha modificado la matriz, únicamente se ha procedido con la replanificación financiera para la gestión.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/31/2020



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity
