

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | BR-L1372 | Chief of Operations Validation Date | 03/27/20 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2019 | Division Chief Validation Date | 03/29/20 |
| Last Update | 03/20/20 | Country Representative Validation Date | 03/30/20 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Operation Name | Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense | Loan Number | 3129/OC-BR |
| Executing Agency | ESTADO DO PARANA | Sector/Subsector | IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION |
| Team Leader | OCHOA, FRANCISCO JOSE | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Brazil |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | ESTADO DO PARANA | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| Impacts Category | B | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | Partially Satisfactory | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | A missão foi realizada em formato virtual e indicou que houve esforços por parte da Agência Executora (AE) em cumprir com os acordos definidos na missão passada: foram incorporados os profissionais especialista social e ambiental na equipe da UGP; da mesma forma foram realizadas algumas atividades em prol do engajamento das equipes sociais dos municípios executores. Mas não houve treinamento em saúde e segurança ocupacional das equipes das obras em execução porque o consultor ambiental só foi incorporado em 2020, e logo em seguida foram implantadas medidas de prevenção ao covid-19 que suspenderam todas as atividades a serem realizadas com as equipes municipais. Apesar dos esforços empreendidos pela AE, permanece certa dificuldade de engajamento com alguns municípios, prejudicando o devido monitoramento dos aspectos ambientais das obras e dos aspectos sociais, especialmente, relativo ao acompanhamento das famílias do reassentamento e pós reassentamento. Devido a permanência da dificuldade de monitoramento dessas atividades, mas reconhecendo-se os esforços na direção de mitigá-los, classifica-se a operação como Parcialmente Satisfatória. | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| BR-L1372 | 60,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100,000,000 | 60,000,000 | 33,558,321.58 | 55.93% | 26,441,678.42 |
| Aggregated | 60,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100,000,000 | 60,000,000 | 33,558,321.58 | 55.93% | 26,441,678.42 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

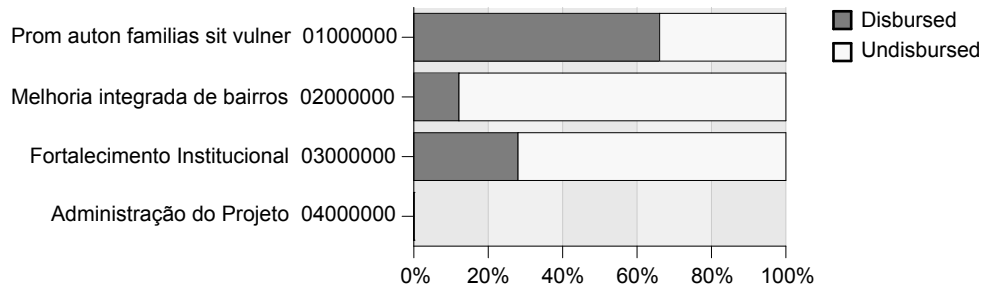

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Condição de vida das famílias mediante ações do Governo melhoradas

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|-------|----------|
| 0.0 | Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados | % | 30.00 | 2016 | P | 60.00 | 60.00 |
| | | | | | P(a) | 40.00 | 40.00 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|----------|
| 0.2 | Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria | % | 53.00 | 2016 | P | 68.90 | 68.90 |
| | | | | | P(a) | 58.30 | 58.30 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|----------|
| 0.0 | Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas | % | 0.00 | 2014 | P | | | 60.00 |
| | | | | | P(a) | 60.00 | | 60.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|----------|
| 0.1 | Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda | % | 0.00 | 2014 | P | | | 60.00 |
| | | | | | P(a) | 60.00 | | 60.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|----------|
| 0.2 | Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento | % | 0.00 | 2014 | P | | | 50.00 |
| | | | | | P(a) | 50.00 | | 50.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|--------|------|----------|
| 0.0 | Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes | % | 30.00 | 2014 | P | | | 100.00 |
| | | | | | P(a) | 100.00 | | 100.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|------|---|--|--|--|
| 0.0 | Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes | % | 30.00 | 2014 | A | | | |
|-----|---|---|-------|------|---|--|--|--|

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|--------|----------|
| 0.1 | Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a agua potavel no domicilio | % | 50.00 | 2014 | P | | 100.00 |
| | | | | | P(a) | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|-------|----------|
| 0.0 | Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento | % | 0.00 | 2014 | P | | 90.00 |
| | | | | | P(a) | 90.00 | 90.00 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Testes de conhecimento

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-------------------|------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 1.1 | Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados | Beneficiaries (#) | P | 4,470 | 22,000 | 4,416,343 | 14,410,366 |
| | | | P(a) | 4,550 | 22,000 | 5,146,405.29 | 17,380,735.19 |
| | | | A | 4,782 | 20,727 | 4,843,839.22 | 12,939,267.02 |
| 1.2 | Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios | Municípios | P | 130 | 130 | 842,400 | 8,774,200 |
| | | | P(a) | 65 | 130 | 1,500,000 | 12,123,400.99 |
| | | | A | 103 | | 1,321,608.04 | 9,763,904.8 |
| 1.3 | Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social | Transferências | P | 53 | 53 | 2,500,000 | 10,781,000 |
| | | | P(a) | 53 | 53 | 550,000 | 10,108,796.08 |
| | | | A | 116 | 406 | 1,885,722.58 | 8,108,796.08 |
| 1.4 | Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense" | Famílias | P | 0 | 40,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | | P(a) | 40,000 | 40,000 | 2,000,000 | 15,999,999.98 |
| | | | A | 27,299 | | 1,133,841.34 | 13,743,844.22 |
| 1.5 | Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS) | Capacitações | P | 820 | 3,480 | 594,377 | 2,522,478 |
| | | | P(a) | 1,500 | 3,480 | 700,000 | 1,421,466.6 |
| | | | A | 53 | 2,577 | 9,131.26 | 546,465.6 |
| 1.6 | Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB) | Projetos | P | 700 | 5,600 | 1,154,190 | 7,256,760 |
| | | | P(a) | 1,658 | 5,600 | 1,500,000 | 4,968,745.52 |
| | | | A | 1,576 | 5,518 | 896,480.4 | 3,833,034.87 |
| 1.7 | Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidaria) | Famílias | P | 0 | 560 | 0 | 2,522,154 |
| | | | P(a) | 200 | 560 | 526,315.78 | 416,863.11 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 2.1 | Famílias com casas novas recebidas | Famílias | P | 262 | 594 | 3,100,000 | 17,940,000 |
| | | | P(a) | 394 | 594 | 18,500,000 | 14,773,406.84 |
| | | | A | 74 | 74 | 4,350,527.58 | 4,506,734.54 |
| 2.2 | Lotes regularizados | Lotes | P | 142 | 328 | 2,760,000 | 6,560,000 |
| | | | P(a) | 275 | 328 | 5,800,000 | 14,758,889.21 |
| | | | A | 0 | 0 | 1,895,329.2 | 1,895,329.2 |
| 2.3 | CRAS construídos e em funcionamento | CRAS | P | 0 | 22 | 0 | 6,361,544 |
| | | | P(a) | 7 | 22 | 3,264,450.17 | 5,465,631.55 |
| | | | A | 5 | 10 | 805,290.06 | 2,665,631.55 |
| 2.4 | CREAS construídos e em funcionamento | CREAS | P | 0 | 8 | 0 | 3,238,498 |
| | | | P(a) | 3 | 8 | 747,678.02 | 1,750,159.75 |
| | | | A | 0 | 5 | 63,205.27 | 1,353,703.97 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 3.1 | Investigações e estudos realizados | Estudos | P | 3 | 7 | 450,000 | 1,620,000 |
| | | | P(a) | 1 | 7 | 200,000 | 591,432.25 |
| | | | A | 0 | 5 | 0 | 271,861.84 |
| 3.2 | Participantes do Programa Capacitados | Participantes | P | 2,460 | 12,300 | 100,000 | 2,113,000 |
| | | | P(a) | 1,000 | 12,300 | 300,000 | 1,623,060.46 |
| | | | A | 481 | 5,470 | 16,319.01 | 463,835.7 |
| 3.3 | Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento | Sistema | P | 0 | 6 | 0 | 900,000 |
| | | | P(a) | 2 | 6 | 167,761 | 400,000.04 |
| | | | A | 1 | 3 | 57,338.5 | 165,596.91 |

Component Nbr. 4 Componente IV: Administração do Projeto

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | FINANCIAL PROGRESS |
|----|--------|-----------------|------|-------------------|--------------------|
| | | | | EOP | EOP |
| 4. | | | P | | |
| | | | P(a) | | |
| | | | A | | |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|---------------|------|--|--|---------|-----------|
| | Administração | P | | | 500,000 | 4,000,000 |
| | | P(a) | | | 0 | 0 |
| | | A | | | 0 | 0 |
| | Contingencia | P | | | 250,000 | 1,000,000 |
| | | P(a) | | | 0 | 0 |
| | | A | | | 0 | 0 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|---------------|----------------|
| | Total Cost | P | | | 16,667,310 | 100,000,000 |
| | | P(a) | | | 40,902,610.26 | 101,782,587.57 |
| | | A | | | 17,278,632.46 | 60,258,006.3 |

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|--|----------------|---|-------------|-----------------------|
| Output | CRAS construídos e em funcionamento | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | CREAS construídos e em funcionamento | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | Famílias com casas novas recebidas | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária) | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense" | Solicitação de ajuste ao indicador feito à SPD, pois o indicador não deveria ser cumulativo. Esta é uma meta anual que se repete a cada ano. Ou seja, um único grupo de famílias que recebe uma transferência de renda a cada ano. | Modify Output | Modify Output EOP to Not-Autocalculated | JUANZE | 02/21/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) | JUANZE | 02/21/2020 |
| | Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS) | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/20/2020 |
| | Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiária elaborados | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB) | Atualização do realizado e replanejamento físico e financeiro de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2019. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |
| | Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social | Solicitação de ajuste ao indicador feito à SPD, pois o indicador não deveria ser cumulativo. Os mesmos municípios recebem todos os anos recursos de financiamento para ações de assistência social. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | YUKAM | 03/13/2020 |

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
| |
