

PMR Operational Report

Operation Number	CO-G1002	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/06/20
Last Update	03/21/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Adaptation to Climate Impacts in Water Regulation and Supply for the Area of Chi	Loan Number	GRT/CX-14525-CO
Executing Agency	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Sector/Subsector	PA-ADA - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-CLIMATE CHANGE ADAPTATION POLICY
Team Leader	NAVIA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	Colombia
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	
Borrower			


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-G1002	4,215,750	4,215,750	11,409,000	0	15,624,750	4,215,750	3,810,696.42	90.39%	405,053.58
Aggregated	4,215,750	4,215,750	11,409,000	0	15,624,750	4,215,750	3,810,696.42	90.39%	405,053.58

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

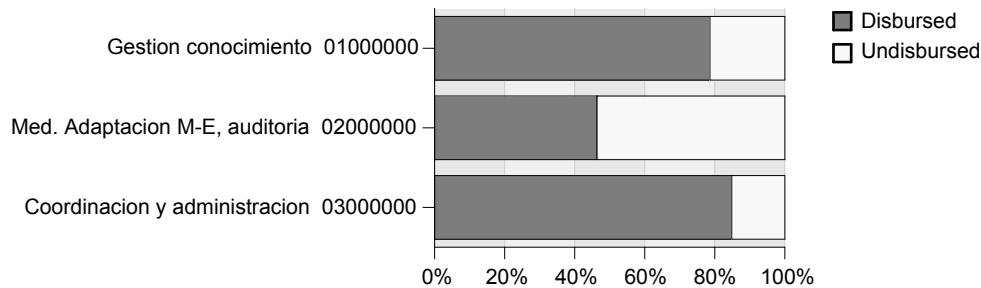

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Planes de uso del suelo y de gestión de cuencas que consideren vulnerabilidad al cambio climático

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
0.0	Planes (ordenamiento, cuenca) que incorporen evaluaciones de vulnerabilidad al cc	Und	0.00	2015	P			2.00	2.00	2.00		6.00
					P(a)			2.00	3.00	3.00	4.00	16.00
					A			2.00	2.00	8.00		12.00
Details												
Means of verification: Reporte validado por Ministerio												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 1: Adopción Medidas de adaptación al cambio climático

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.0	Familias que incorporan medidas de adaptación en sus procesos productivos	Und.	0.00	2015	P		20.00	120.00	120.00	100.00		360.00
					P(a)		20.00	120.00	180.00	180.00	17.00	381.00
					A		0.00	0.00	0.00	364.00		364.00
Details												
Means of verification: Reporte validado por Ministerio												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.1	Nuevas propuestas para desarrollo e implementación de medidas de adaptación	Und.	0.00	2015	P				12.00	20.00		32.00
					P(a)				16.00	16.00		32.00
					A				0.00	32.00		32.00
Details												
Means of verification: Reporte validado por Ministerio												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Transferencia de información y conocimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Funcionarios del orden nacional, regional y local capacitados en el uso de escenario de cambio climático y análisis de vulnerabilidad.	Und.	P	0	500	0	1,220,000
			P(a)	100	616	532,578	133,179
			A	100	579	35,517	72,023
1.2	Reporte de vulnerabilidad con la evaluación de la respuesta hidrológica de los ecosistemas andinos a cambio climático	Und.	P	0	1	0	932,000
			P(a)		1		896,592
			A		1		890,489
1.3	Área del corredor cubierta con mapas indicando la distribución de variables climáticas bajo escenarios de cambio climático	Km2	P	0	5,500	0	1,617,000
			P(a)	0	7,580		260,201
			A	0	7,580	4,661	259,262
1.4	Área del corredor cubierta con mapas evaluando los cambios en la respuesta hidrológica esperada de los ecosistemas andinos a cambio climático	Km2	P	0	5,500	0	787,000
			P(a)	5,000	5,526	567,189	375,203
			A	5,000	5,526	0	375,203
1.5	Propuesta de EETA (Estructura Ecología Principal) que incorpore variabilidad y cambio climático.	Und	P	0	1	0	382,000
			P(a)		1		265,242
			A		1	0	265,242
1.6	Municipios con acompañamiento técnico para incorporación consideraciones cambio climático en instrumentos de planeación del desarrollo, ordenamiento ambiental y territorial (POT, POMCA)	Und.	P		0		0
			P(a)	2	17	23,126	697,444
			A	9	13	22,502	693,744

Component Nbr. 2 Adopción de medidas de adaptación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Planes de restauración acordados con autoridades/dueños de parcelas	Und.	P	0	3	0	2,608,000
			P(a)	2	49		133,181
			A	6	49	33,189	103,857
2.2	Áreas restauradas/revegetadas con enfoque de género, en zonas de ecosistemas de alta montaña, estrategias para regulación hídrica	Ha	P	2,000	4,828	2,078,880	5,020,000
			P(a)	4,198	4,855		7,734,374
			A	264	1,433	1,551,629	5,677,191
2.3	SM&E para seguimiento de los impactos de las medidas de adaptación en el ciclo del agua	Und.	P	0	1	0	911,000
			P(a)	1	1	364,917	1,716,765
			A	1	1	231,836	1,279,920
2.4	Organizaciones municipales y comunidades productoras entrenadas en el manejo de riesgo de cambio climático y medidas de adaptación	Und.	P	0	65	0	1,726,000
			P(a)	65	65	1,348,524	994,401
			A	20	20	201,897	848,010
2.5	Perfiles de proyecto formulado con alcaldías u Organizaciones de Base Comunitaria	Und.	P		0		0
			P(a)	32	32	50,000	125,093
			A	32	32	27,776	102,869
2.6	Acuerdos firmados con familias que incorporan medidas de adaptación que incluyen prácticas de resiliencia	Und.	P		0		0
			P(a)	0	565	91,651	942,147
			A	17	565	306,576	514,937

Other Cost

Administración y coordinación	P			85,750	421,750
	P(a)			111,588	1,350,928
	A			46,842	1,287,066

Total Cost

	Total Cost	P			2,164,630	15,624,750
		P(a)			3,089,573	15,624,750
		A			2,462,425	12,369,813

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Familias que incorporan medidas de adaptación en sus procesos productivos	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JLALBA	03/10/2020
	Planes (ordenamiento, cuenca) que incorporen evaluaciones de vulnerabilidad al cc	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JLALBA	03/10/2020
Outcome indicator	Planes (ordenamiento, cuenca) que incorporen evaluaciones de vulnerabilidad al cc	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JLALBA	03/10/2020
Output	Acuerdos firmados con familias que incorporan medidas de adaptación que incluyen practicas de resiliencia	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	JLALBA	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/10/2020
	Areas restauradas/revegetadas con enfoque de género, en zonas de ecosistemas de alta montaña, estrategias para regulacion hídrica	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020. Los Socios del proyecto proveen reportar como contrapartida 42,400 Ha restauradas, pero sin soporte contable (Avance Financiero) bajo el argumento de cumplido con el aporte financiero de contrapartida.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	JLALBA	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/10/2020
				Modify Physical Historical Actual	JLALBA	03/10/2020
	Funcionarios del orden nacional, regional y local capacitados en el uso de escenario de camio climático y análisis de vulnerabilidad.	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	JLALBA	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/10/2020
	Municipios con acompañamiento técnico para incorporación consideraciones cambio climático en instrumentos de planeación del desarrollo, ordenamiento ambiental y territorial (POT, POMCA)	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial	JLALBA	03/18/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Municipios con acompañamiento técnico para incorporación consideraciones cambio climático en instrumentos de planeación del desarrollo, ordenamiento ambiental y territorial (POT, POMCA)	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Historical Actual		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/10/2020
	Organizaciones municipales y comunidades productoras entrenadas en el manejo de riesgo de cambio climático y medidas de adaptación	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	JLALBA	03/18/2020
	Planes de restauración acordados con autoridades/dueños de parcelas	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	JLALBA	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/10/2020
	Propuesta de EETA (Estructura Ecología Principal) que incorpore variabilidad y cambio climático.	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
	Reporte de vulnerabilidad con la evaluación de la respuesta hidrológica de los ecosistemas andinos a cambio climático	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	JLALBA	03/18/2020
	SM&E para seguimiento de los impactos de las medidas de adaptación en el ciclo del agua	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	JLALBA	03/18/2020
	Área del corredor cubierta con mapas evaluando los cambios en la respuesta hidrológica esperada de los ecosistemas andinos a cambio climático	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020
	Área del corredor cubierta con mapas indicando la distribución de variables climáticas bajo escenarios de cambio climático	Replanificación para cierre del proyecto y actualización de aporte de contrapartida registrado por los Socios del Proyecto (Entidades). Históricos soportado en PMR (Excel) ajustado y Estados Financieros Auditados -EFA- 2019 a presentar en abril de 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/18/2020

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Environmental and Social Factors
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Fiduciary Dimensions
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design
Stakeholder Priorities
