

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1125	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/03/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/13/20
<b>Last Update</b>	04/03/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	<b>Loan Number</b>	3104/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deDesastres	<b>Sector/Subsector</b>	DU-VIV - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
<b>Team Leader</b>	ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Colombia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	A la fecha de la supervision, se identificó que a pesar de que el proyecto está empenzando existen posible futuros problemas sociales (relacion comunitarias) y ambientales (asociados a la línea de rechazo de la planta) que deberan ser prontamente manejado con la implementacion del plan de accion.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1125	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	42,985,828.45	61.41%	27,014,171.55
<b>Aggregated</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>42,985,828.45</b>	<b>61.41%</b>	<b>27,014,171.55</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

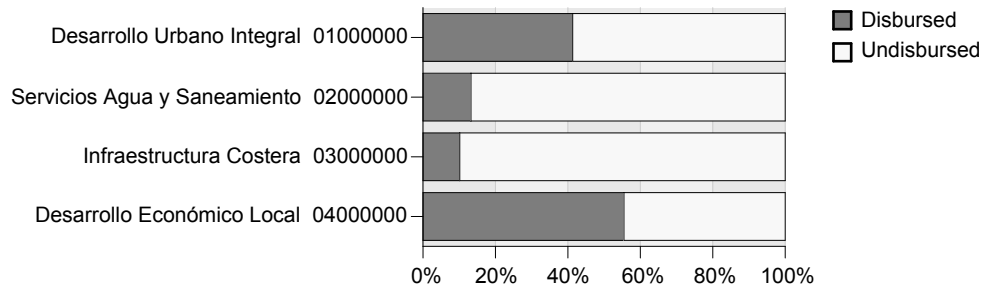

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2022
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.90	2013	P		75.00
					P(a)		75.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2022
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.60	2011	P						30.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	50.00	30.00	50.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de calidad de vida del DANE

**Observations:** El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2022
2.1	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Millones de pesos	64.65	2013	P						93.10
					P(a)	0.00	0.00	0.00	93.10	93.10	93.10
					A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2022
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45.00	2013	P						57.80
					P(a)	0.00	0.00	0.00	59.85		59.85
					A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Micro y pequeñas empresas desarrolladas

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.70	2012	P							47.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 4:** Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2022
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	Households (#)	800.00	2013	P	1,000.00	1,500.00	2,000.00			2,500.00
					P(a)	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2022
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7.00	2013	P	7.00	10.00	11.00			12.00
					P(a)	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00	12.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 5:** Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2022
5.1	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	IDF	55.54	2012	P						59.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.00	59.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Desarrollo Urbano Integral

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P		6		12,600,000
			P(a)	3	6	2,402,631	12,098,962
			A	3	6	3,101,442	10,466,757
1.2	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P		3		200,000
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	3	0	0
1.3	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P		0.9		6,753,000
			P(a)	0	0.9	0	148,626
			A	0	0	0	148,626
1.4	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P		1		2,457,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P		1		2,490,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P		25		6,335,000
			P(a)	0	25	5,845,373	5,409,759.96
			A	0	0	251,270	864,978
2.2	Redes rehabilitadas	Km	P		25		7,919,000
			P(a)	0	25	3,575,083	8,358,891.91
			A	0	0	4,002,408	5,723,887
2.3	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P		1		4,387,000
			P(a)	0	1	0	1,609,329
			A	0	1	0	1,609,329
2.4	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P		1		1,663,000
			P(a)	0	1	1,306,475	1,524,662.8
			A	0	0	32,135	101,886

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
3.1	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P		3		4,800,000
			P(a)	0	3	0	925,296
			A	0	3	12,061	925,296
3.2	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P		1.1		3,200,000
			P(a)	0	1.1	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P		4		500,000
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P		3		200,000
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
4.1	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P		90		240,000
			P(a)	0	90	0	0
			A	0	56	0	0
4.2	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Micro / small / medium enterpr	P		95		4,760,000
			P(a)	0	107	0	2,774,055
			A	12	107	0	2,774,055

## Component Nbr. 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
5.1	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P		30		210,000
			P(a)	0	30	93,750	105,512
			A	0	0	0	0
5.2	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P		1		340,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
5.3	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
5.4	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P		30		600,000
			P(a)	0	37	0	164,223
			A	0	37	0	164,223
5.5	Sistema de información para la administracion de la defensa juridica diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P				4,500,000
		P(a)			1,059,777	2,238,439
		A			243,609	1,988,439
	Auditoria	P				500,000
		P(a)			144,809	396,860
		A			112,257	252,051

Total Cost

	Total Cost	P				70,000,000
		P(a)			14,427,898	35,754,616.67
		A			7,755,182	25,019,527



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Replanificación de Metas financieras, considerando la priorización de los recursos disponibles de la operación para la culminación de los contratos en ejecución.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/19/2020
	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	Replanificación de Metas financieras, considerando la priorización de los recursos disponibles de la operación para la culminación de los contratos en ejecución.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/19/2020
	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Replanificación de Metas financieras, considerando las imitaciones de orden financiero y de capacidad institucional, para el cumplimiento del resultado inicialmente establecido en la matriz, por lo cual en conjunto con el equipo de la unidad ejecutora y el Gobierno de Colombia se ha decidido priorizar otras inversiones con los recursos disponibles del Programa	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	03/20/2020
	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Replanificación de Metas financieras, considerando las imitaciones de orden financiero y de capacidad institucional, para el cumplimiento del resultado inicialmente establecido en la matriz, por lo cual en conjunto con el equipo de la unidad ejecutora y el Gobierno de Colombia se ha decidido priorizar otras inversiones con los recursos disponibles del Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/19/2020
	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Replanificación de Metas financieras, considerando la priorización de los recursos disponibles de la operación para la culminación de los contratos en ejecución.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	03/20/2020
	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	Replanificación de Metas financieras, considerando la priorización de los recursos disponibles de la operación para la culminación de los contratos en ejecución.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/19/2020
	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Replanificación de Metas financieras, considerando la priorización de los recursos disponibles de la operación para la culminación de los contratos en ejecución.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/19/2020
	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Replanificación de Metas financieras, considerando las imitaciones de orden financiero y de capacidad institucional, para el cumplimiento del resultado inicialmente establecido en la matriz, por lo cual en conjunto con el equipo de la unidad ejecutora y el Gobierno de Colombia se ha decidido priorizar otras inversiones con los recursos disponibles del Programa	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	03/20/2020
	Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	El Programa cuenta con limitaciones de orden financiero y de capacidad institucional, para el cumplimiento del resultado inicialmente establecido en la matriz, por lo cual en conjunto con el equipo de la unidad ejecutora y el Gobierno de Colombia se ha decidido priorizar otras inversiones con los recursos disponibles del Programa, por lo cual el indicador se inactiva dada la imposibilidad de alcanzar las metas establecidas	Modify Output	Inactivate Output	AGIRALDO	03/20/2020
	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Actualización de la información historica de costos del Producto, de acuerdo con el reporte actualizado presentado por el Ejecutor	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	AGIRALDO	03/20/2020
	Redes rehabilitadas	Replanificación de Metas financieras, considerando la priorización de los recursos disponibles de la operación para la culminación de los contratos en ejecución.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/19/2020
	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	El Programa cuenta con limitaciones de orden financiero y de capacidad institucional, para el cumplimiento del resultado inicialmente establecido en la matriz, por lo cual en conjunto con el equipo de la unidad ejecutora y el Gobierno de Colombia se ha decidido priorizar otras inversiones con los recursos disponibles del Programa, por lo cual el indicador se inactiva dada la imposibilidad de alcanzar las metas establecidas	Modify Output	Inactivate Output	AGIRALDO	03/20/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity
