

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1075	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/03/20
Last Update	03/20/20	Country Representative Validation Date	04/11/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Productive Corridors Program	Loan Number	3170/OC-ES, 3170/OC-ES-1, 3170/OC-ES-2
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Sector/Subsector	PS-PYM - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	SOLIS AHUMADA, GALILEO HUMBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1075	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	22,979,647.05	57.45%	17,020,352.95
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	22,979,647.05	57.45%	17,020,352.95

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

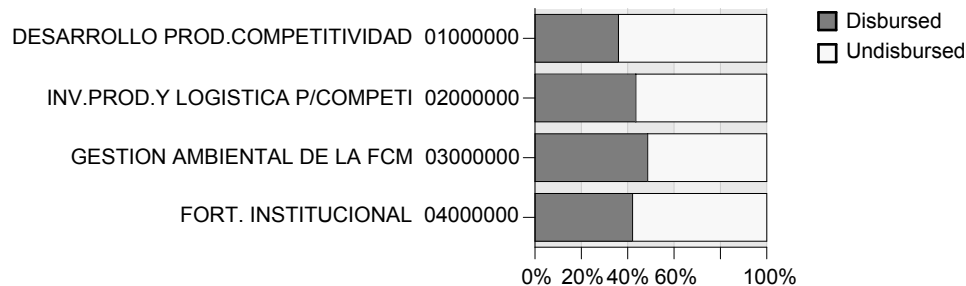

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda

Observation: Alineado con la Estrategia del Banco con El Salvador, se enfatiza el mejoramiento del crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda mediante el apoyo a la innovación y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Cambio en la recaudación impositiva por las mayores ventas e ingresos de las empresas beneficiadas que vieron aumentada su productividad.	Indice	1.00	2013	P	1.10		1.10
					P(a)	1.10		1.10
					A			

Details

Means of verification: Cuentas nacionales e Informe del Ministerio de Hacienda

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Aumento de la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) ubicadas en las áreas de intervención del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Nivel de ingresos de las empresas beneficiarias de cofinanciamientos parciales no reembolsables (o aportes no-reembolsables ANR) y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	10.00		20.00
					P(a)	10.00		20.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Nivel de empleo de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					P(a)	5.00		10.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Productividad de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					P(a)	5.00		10.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Mejora de la infraestructura productiva y logística para la competitividad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	P	0.50		0.40
					P(a)	0.50		0.40

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.1	Velocidad para los Usuarios de Automóviles	km/h	24.70	2013	P	30.00		50.00
					P(a)	30.00		50.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.2	Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2013	P	5.50		3.50
					P(a)	5.50		3.50
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.3	Velocidad para los Usuarios de Autobuses	km/h	22.70	2013	P	25.00		45.00
					P(a)	25.00		45.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P	3.00		2.15

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P(a)	3.00		2.15
					A			

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.5	Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	km/h	22.70	2013	P	25.00		45.00
					P(a)	25.00		45.00
					A			

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.6	Cantidad de productores y pescadores artesanales que utilizan nuevas infraestructuras productivas (muelles, centros de acopio, comercialización y sistemas de cadena de frío)	# productores	0.00	2013	P	200.00		400.00
					P(a)	200.00		400.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas sobre la base de los registros de CENDEPESCA.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.7	Tiempo adicional que se conservan los productos a una temperatura adecuada para evitar pérdidas.	horas	0.00	2013	P	24.00		48.00
					P(a)	24.00		48.00
					A			

Details

Means of verification: Bitácoras administrativas de uso de sistema de cadena de frío

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Mejora de la gestión ambiental de la Franja Costero Marina (FCM)

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
2.0	Percepción favorable de la gestión ambiental en la Franja Costero Marina	% de población	0.00	2013	P	50.00		66.00
					P(a)	50.00		66.00
					A			
Details								
Means of verification: Encuesta de percepción								
Observations: No existe actualmente una medida de este indicador. Como parte del proceso de consulta ambiental y social se realizará una encuesta para medir la línea de base del indicador.								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo al desarrollo productivo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
3.0	Inversión en políticas de apoyo al desarrollo productivo de las instituciones involucradas	índice	1.00	2013	P	1.10		1.20
					P(a)	1.10		1.20
					A			
Details								
Means of verification: Registros de UCP y presupuestos de las instituciones involucradas.								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYMEs

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	Micro / small / medium enterpr	P	40	100	178,265	461,200
			P(a)	55	100	397,618.86	711,792.32
			A	85	25	130,022.72	176,941.72
1.2	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	Micro / small / medium enterpr	P	400	1,100	604,898	2,250,240
			P(a)	400	1,100	1,203,911.9	2,492,439.89
			A	364	229	824,681.57	1,002,357.08
1.3	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Grupos asociativos	P	10	30	85,480	237,500
			P(a)	20	30	248,076	440,029.53
			A	37	0	101,794.46	125,794.46
1.4	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	Micro / small / medium enterpr	P	80	250	110,000	340,000
			P(a)	133	250	159,000	176,314.15
			A	151	34	82,354.15	100,754.15
1.5	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Grupos asociativos	P	8	25	54,000	150,000
			P(a)	18	25	36,000	42,658.6
			A	25	2	31,200	31,200
1.6	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Emprendedores	P	400	1,200	207,152.17	2,125,000
			P(a)	540	1,200	1,045,816	1,885,966.88
			A	603	656	784,526.04	1,351,956.88
1.7	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	0	300	0	2,250,000
			P(a)	215	300	1,392,250	2,263,786.63
			A	149	235	1,123,560.8	1,438,786.63
1.8	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	0	150	0	1,125,000
			P(a)	96	184	805,874	1,179,952
			A	130	184	713,133	881,848
1.9	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Proyectos productivos	P	80	115	1,200,000	1,737,060
			P(a)	90	10	713,976.8	224,360.3
			A	10	10	220,160.3	220,160.3
1.10	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Iniciativas productivas	P	18	42	2,172,400.35	5,224,000
			P(a)	20	51	1,595,587.05	6,062,699.7
			A	27	46	1,796,532.4	2,823,421.76

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Muelles de uso dual construidos/reconstruido	Muelles	P	0	4	17,857	4,750,000
			P(a)	0	4	0	7,100,316.4
			A	0	0	0	0
2.2	Centro de Acopio (CAS) construido	Centro de Acopio	P	0	1	0	1,200,000
			P(a)	0	1	0	624,003.5
			A	0	0	0	0
2.3	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	Km	P	0	0.6	0	1,100,000
			P(a)	0	0.6	100,651.29	567,595.23
			A	0	0.6	100,651.29	567,595.23
2.4	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Roads (km)	P	0	6.8	2,683,702	3,850,000
			P(a)	0	6.8	4,115,680.51	4,525,067.54
			A	0	0	3,099,984.5	3,099,984.5
2.5	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S (Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	Roads (km)	P	0	9.8	3,724,752	10,500,000
			P(a)	0	9.8	5,248,239.79	8,212,317.33
			A	0	0	5,138,070.73	7,613,889.14

Component Nbr. 3 Gestión Ambiental de la Franja Costero-Marítima

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Mapa de zonificación ambiental del Golfo de Fonseca desarrollado	Mapa	P	0	1	0	254,000
			P(a)	1	1	201,152.45	223,502.72
			A	1	1	201,152.45	223,502.72
3.2	Pasantías en Zonificación Ambiental y Rehabilitación de costas realizadas	Pasantías	P	0	14	0	35,000
			P(a)	0	15	0	32,702.15
			A	0	15	0	32,702.15
3.3	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas	Talleres/ eventos	P	0	5	0	13,500
			P(a)	5	5	13,500	13,500
			A	0	0	0	0
3.4	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	Estudio	P	0	1	0	80,400
			P(a)	0	1	12,047.55	120,446.58
			A	0	0	0	0
3.5	Funcionarios capacitados en Dinámica y rehabilitación de costas.	Funcionarios	P	0	25	0	14,000
			P(a)	0	25	0	15,123.55
			A	0	0	0	15,123.55
3.6	Equipo tecnológico y software especializado instalado	Equipo	P	0	1	0	103,100
			P(a)	0	1	0	94,725
			A	0	1	0	94,725

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
4.1	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Manuales	P	0	9	36,000	311,000
			P(a)	4	9	115,840.98	237,444.26
			A	3	8	101,830.97	170,548.72
4.2	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Herramientas	P	1	4	24,333	253,000
			P(a)	3	4	80,000	164,289.6
			A	1	2	23,783.93	74,733.53
4.3	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Funcionarios	P	30	70	38,666	171,000
			P(a)	10	219	47,873.11	174,552.9
			A	25	189	20,646	95,968.37
4.4	Estrategia de Gestión de Riesgos diseñada	Estrategia	P	0	1	0	15,000
			P(a)	1	1	21,000	21,000
			A	0	0	0	0
4.5	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Asociaciones	P	0	2	0	55,000
			P(a)	1	0	27,500	55,000
			A	0	0	0	0
4.6	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Laboratorio	P	0	1	0	45,000
			P(a)	0	2	107,287.48	144,133.24
			A	1	2	107,270.72	144,133.24
4.7	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Plan	P	1	4	50,000	200,000
			P(a)	1	4	165,300	253,580
			A	1	2	118,875.2	162,042.29

Other Cost

	Administración (Evaluaciones de Impacto, Auditorías, Evaluaciones del Programa y UEP)	P			257,900	1,150,000
		P(a)			613,332.82	1,940,700
		A			406,096.19	580,774.41

Total Cost

	Total Cost	P			11,445,405.52	40,000,000
		P(a)			18,467,516.59	40,000,000
		A			15,126,327.42	21,028,943.83

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/02/2020
	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S (Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/13/2020
	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/13/2020
	Centro de Acopio (CAS) construido	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/13/2020
	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/02/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/02/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/02/2020
	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/17/2020
	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Muelles de uso dual contruidos/reconstruido	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/13/2020
	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Ajustes necesarios para la corrección de valore históricos y la replanificación de actividades hacia el final de la ejecución del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/11/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation
