

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1187	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/30/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/30/20
<b>Last Update</b>	04/29/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/30/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Civic Coexistence and Neighborhood Improvement Program	<b>Loan Number</b>	4518/BL-HO, 4518/BL-HO-1, 4518/BL-HO-2, 4518/BL-HO-3
<b>Executing Agency</b>	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad	<b>Sector/Subsector</b>	IS - SOCIAL INVESTMENT
<b>Team Leader</b>	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Se han cumplido con los distintos requerimientos de salvaguardias de los componentes del Programa. Se han elaborado las evaluaciones socioambientales junto con sus planes de gestión y realizado las consultas necesarias. A pesar de cambio en la ubicación de uno de los proyectos de la muestra (ANAPO), se cumplió con las actualizaciones requeridas por el Banco. Los Organismo Ejecutores muestran una gran disposición y flexibilidad para el cumplimiento de las Políticas del Banco.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1187	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	14,500,000	24.17%	45,500,000
<b>Aggregated</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>14,500,000</b>	<b>24.17%</b>	<b>45,500,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

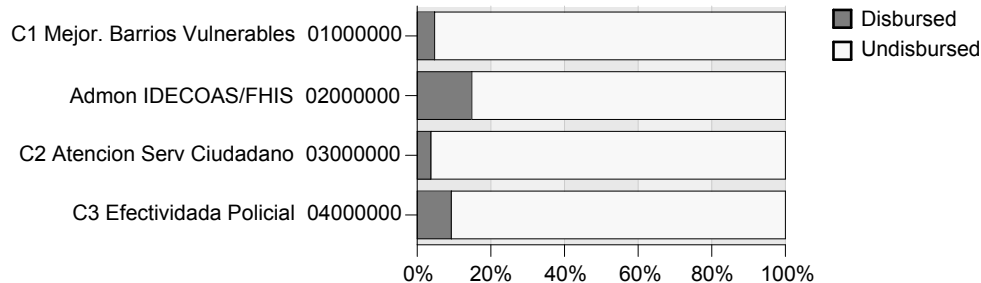

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** IMPACTO ESPERADO: la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Indicador 1. Viviendas con 3 Necesidades Básicas Insatisfechas por clasificación de pobreza (NBI) en áreas urbanas de Honduras	porcentaje	3.08	2018	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63
					A	0.00	0.00					2.63

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

**Observations:** Total de hogares urbanos en Honduras en 2016: 666.627, total de hogares con 3 o más NBI 20.525

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	59.05	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00					45.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Femicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	7.11	2015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					A	0.00	0.00					6.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

**Observations:** Tasa estimada de acuerdo a las cifras del Observatorio de muertes violentas de mujeres y femicidios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los 478 homicidios de mujeres reportados, 312 (63.3%) son catalogados como femicidios, 111 (23.2%) como homicidios y 55 (11.5%) como muertes violentas sin determinar

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía	Porcentaje	36.80	2015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

0.4	(mucha o algo)	Porcentaje	36.80	2015	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00					45.00
Details												
Means of verification: Encuesta Latinobarómetro												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Victimización personal reportada en Honduras	Porcentaje	16.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					A	0.00	0.00					15.00
Details												
Means of verification: Encuesta de Percepción y Victimización												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** RESULTADO #1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	Porcentaje	35.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00					92.00

#### Details

**Means of verification:** Informe de supervisión de obras

**Observations:** Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	Porcentaje	2.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00					92.00

#### Details

**Means of verification:** Informe de supervisión de obras

**Observations:** Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	Porcentaje	63.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00					92.00

#### Details

**Means of verification:** Informe de supervisión de obras

**Observations:** Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0.00	2017	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00					100.00

#### Details

**Means of verification:** Informe de supervisión de obras

**Observations:** En MDC existen 2.000 kilómetros de vías. El programa planea pavimentar 24 kilómetros incluyendo, gradas, rampas y calles vehiculares

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos (basura), en los barrios intervenidos.	Porcentaje	75.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	95.00	95.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	95.00	95.00
					A	0.00	0.00					95.00

#### Details

**Means of verification:** Informe de cierre de PCR.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.5	Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses	porcentaje	56.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00					45.00

#### Details

**Means of verification:** EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.6	Prevalencia de Robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores	Porcentaje	28.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00
					A	0.00	0.00					20.00

#### Details

**Means of verification:** EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.7	Prevalencia de delitos sexuales por cada 1,000 mujeres en los barrios intervenidos	Tasa	3.80	2016	P	0.00	0.00	0.00	3.40	3.00	3.00	3.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3.40	3.00	3.00	3.00
					A	0.00	0.00					3.00

#### Details

**Means of verification:** SEPOL y Observatorios

**Observations:** 14 delitos sexuales y 3.600 mujeres y niñas residentes

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** RESULTADO ESPERADO 2: Reducción de homicidios y VIF en los municipios beneficiados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Prevalencia de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	5.43	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					A	0.00	0.00					5.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Marginación urbana y Violencia

**Observations:** Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Proporción de víctimas que denuncia un delito de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	21.70	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
					A	0.00	0.00					25.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Marginación urbana y Violencia

**Observations:** Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Número de víctimas de VIF que utilizan los servicios de atención con profesionales multidisciplinarios de VIF en las áreas intervenidas de forma anual	Número	700.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
					A	0.00	0.00					850.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details												
<b>Means of verification:</b> Registros de atención en DPI bajo la estrategia MAIE												
<b>Observations:</b> Distrito Central y SPS que realizan denuncias en instalaciones DPI MAIE												
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>			No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas intervenidas	Tasa	94.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A	0.00	0.00					85.00

Details												
<b>Means of verification:</b> Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) y UTECI												
<b>Observations:</b> Distrito Central y SPS												
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>			No				

**Outcome Nbr. 3: RESULTADO ESPERADO 3:** Mejora de los niveles de efectividad policial a través del incremento de casos de homicidio con autor identificado e informe criminalístico aceptado por el Ministerio Público

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Número de graduados de la ANAPO formados en la nueva currícula por competencias	Número	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00					80.00

Details												
<b>Means of verification:</b> Informe Academia Nacional de Policía (ANAPO)												
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>			No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Casos de homicidio con autor identificado por la policía, sobre el total de homicidios investigados por la PN en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	34.00	2017	P	0.00	35.00	37.00	38.00	40.00	42.00	42.00
					P(a)	0.00	35.00	37.00	38.00	40.00	42.00	42.00
					A	0.00	0.00					42.00

Details												
<b>Means of verification:</b> Policía Nacional (Dirección de Investigación)												
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>			No				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Casos de homicidio aceptados por el MP, sobre el total de casos remitidos por la PN al MP en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	16.00	2017	P	0.00	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00	36.00
					P(a)	0.00	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00	36.00
					A	0.00	0.00					36.00
Details												
Means of verification: Informe de DPI												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1: Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados	Proyectos	P	0	9	3,020,731	14,432,999
			P(a)	0	9	3,020,731	14,432,999
			A	0	0	2,582,740	2,582,740
1.2	Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	Número de asistencias	P	1,600	9,600	482,644	3,173,001
			P(a)	1,600	9,600	482,644	3,173,001
			A	3,307	3,307	761,123	761,123
1.3	Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo	Women (#)	P	0	700	0	613,000
			P(a)	0	700	0	613,000
			A	22	22	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente #2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios	Número de Servicios	P	0	2	0	10,000
			P(a)	0	2	0	20,000
			A	0	0	0	0
2.2	Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones	P	0	6	593,693	19,128,511.23
			P(a)	0	6	593,693	14,171,442.14
			A	0	0	216,415	216,415
2.3	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones policiales	P	0	16	30,000	94,830.47
			P(a)	0	16	30,000	103,850
			A	0	0	0	0
2.4	Protocolo de actuación de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Protocolos	P	1	1	20,000	20,000
			P(a)	1	1	20,000	20,000
			A	1	1	0	0
2.5	Curso de capacitación para la implementación del protocolo de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Cursos	P	1	1	0	10,000
			P(a)	1	1	0	10,000
			A	0	0	0	0
2.6	Documento de cartera de servicios policiales elaborado	Documento	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	49,700
			A	1	1	0	0
2.7	Unidades móviles de servicios policiales, operando	Número de unidades	P	0	3	510,000	741,000
			P(a)	0	1	510,000	349,830
			A	0	0	165,980	165,980
2.8	Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos	Cursos	P	0	450	384,330	923,450
			P(a)	0	450	384,330	738,638
			A	0	0	284,700	284,700
2.9	Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos interinstitucional	Equipo	P	0	1	115,374.97	115,374.97
			P(a)	0	1	115,374.97	279,995
			A	0	0	16,645	16,645
2.10	Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales	Subnational governments (#)	P	0	30	117,500	333,500
			P(a)	0	30	117,500	412,316
			A	0	0	68,456	68,456
2.11	Estrategia de comunicación en ejecución	Estrategia	P	0	1	143,333.33	573,333.33
			P(a)	0	1	143,333.33	454,000
			A	0	0	8,700	8,700

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente #3: Efectividad policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado	Documento	P	0	1	1,100,542	4,288,548.73
			P(a)	0	1	1,100,542	1,993,873.67
			A	0	0	1,216,179.08	1,216,179.08
3.2	Academia Nacional de Policía con infraestructura física y tecnología modernas, siendo utilizada	Government agencies (#)	P	0	1	1,191,664	9,649,305.94
			P(a)	0	1	1,191,664	16,396,815.84
			A	0	0	595,285	595,285
3.3	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado	Programa	P	0	3	952,500	2,062,145.33
			P(a)	0	3	952,500	1,336,134
			A	0	0	698,479	698,479

## Other Cost

	Administracion IDECOAS/FHIS	P			161,205	1,781,000
		P(a)			161,205	1,781,000
		A			343,646	343,646
	Administracion SEDS	P			572,345	2,000,000
		P(a)			572,345	3,663,405.35
		A			417,643.98	417,643.98

## Total Cost

	Total Cost	P			9,395,862.3	60,000,000
		P(a)			9,395,862.3	60,000,000
		A			7,375,992.06	7,375,992.06

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Academia Nacional de Policía con infraestructura física y tecnología modernas, siendo utilizada	Los resultados del diseño de la firma INGENUS, implicaron ajusta el presupuesto de licitacion de obras de US\$7.0 millones a US\$12.0 millones.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos	Se redujo el presupuesto para el indicador financiero.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Documento de cartera de servicios policiales elaborado	Indicar financiero cumplido, el balance disponible se reorientó a otros productos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos interinstitucional	El indicador fisico se replanificó de 2020 al 2021, tambien se incrementó el presupuesto para el indicador financiero.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	El indicador fisico se ajusta de 3 estaciones moviles previstas a 1, se reduce el presupuesto para financiar la brecha de la construccion ANAPO.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Originalmente se previeron entregas 2 estaciones policiales anulaes en 2020, 2021 y 2022, el indicador fisico se reprograma para 6 estaciones policiales en 2022, el presupuesto se reducen en US\$5.0 millones para financiar brecha de ANAPO.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Estrategia de comunicación en ejecución	Se ajustó el indicador financiero en una reduccion de presupuesto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales	El indicador fisico se replanificó de 2020 al 2023, tambien se ajusto a la baja el indicador financiero.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado	Se ajusta el indicador financiero (baja) para cerrar brecha de ANAPO.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios	Se reprograma el indicador fisico para el 2022 y se incrementa el presupuesto para 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado	Se ajusta el indicador financiero (baja) para cerrar brecha de ANAPO.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
	Unidades móviles de servicios policiales, operando	El indicador fisico se ajustó de 3 a 1 , el presupuesto se ajusto para financiar la brecha de la ANAPO.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AMALIAGU	03/27/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AMALIAGU	03/24/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Intra/Inter Coordination
Project Design
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities
