

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1260	Chief of Operations Validation Date	10/15/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	FIRST OPERATION OF THE URBAN INTEGRATION AND SOCIAL AND EDUCATIONAL INCLUSION PROGRAM IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES	Loan Number	4303/OC-AR
Executing Agency	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	VERA BENITEZ, LUIS FELIPE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La Agencia Ejecutora tiene un equipo idóneo para la gestión ambiental y social del Programa. El relacionamiento con la comunidad es adecuado, pero debe mejorar la manera en que registran y atienden las quejas y reclamos. Los aspectos ambientales son manejados de manera apropiada, pero falta evidencia de cómo están tratando los escombros y residuos peligrosos.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1260	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	84,885,000.78	84.89%	15,114,999.22
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	84,885,000.78	84.89%	15,114,999.22

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

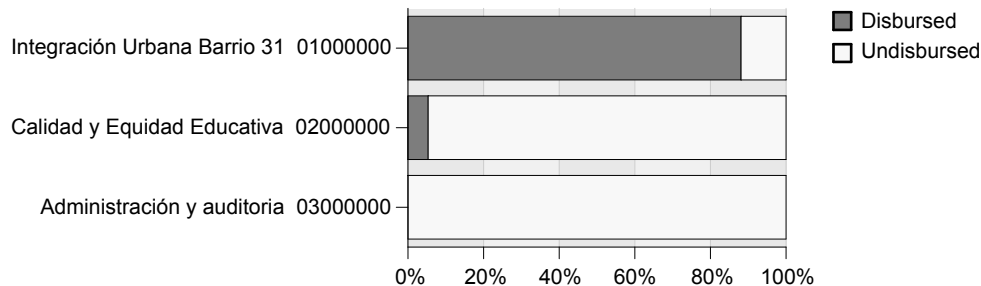

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Componente 1 Integración urbana del Barrio 31

Observation: .

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Hogares con hacinamiento crítico (más de 3 miembros por habitación exclusiva para dormir)	hogares	0.00	2018	P		
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Datos de encuesta de actividad económica en B31							
Observations: Implementado por SECISYU y Centro de Investigación de Políticas Urbanas y Vivienda (CIPUV) Universidad Torcuato di Tella							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa en la CABA

Observation: .

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Deserción escolar promedio en Secundarias estatales	%	2.50	2017	P	1.70	1.70
					P(a)	1.70	1.70
					A		

Details

Means of verification: Datos del Relevamiento Anual 2020

Observations: Implementado por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.1	Puntaje promedio en Matemática en 7° grado de Primarias estatales	puntaje promedio	480.70	2018	P	510.00	510.00
					P(a)	510.00	510.00
					A		

Details

Means of verification: Resultados de la Prueba FEPBA.

Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.2	Puntaje promedio en Prácticas del Lenguaje en 7° grado de Primarias estatales	puntaje promedio	458.40	2018	P	500.00	500.00
					P(a)	500.00	500.00
					A		

Details

Means of verification: Resultados de la Prueba FEPBA.

Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	Puntaje promedio en Lengua y Literatura en 3° año	puntaje	464.60	2018	P	500.00	500.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.3	de secundarias estatales	promedio	464.60	2018	P(a)	500.00	500.00
					A		
Details							
Means of verification: Resultados de la Prueba TESBA.							
Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.4	Puntaje promedio en Matemática en 3° año de secundaria	puntaje promedio	484.00	2018	P	510.00	510.00
					P(a)	510.00	510.00
					A		
Details							
Means of verification: Resultados de la Prueba TESBA.							
Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente 1 Integración urbana de B31. Incremento en el acceso a servicios educativos de calidad, infraestructura urbana de calidad y resiliente al cambio climático. La disminución de problemas de salud relacionados a enfermedades infectocontagiosas entre los residentes de viviendas mejoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Alumnos matriculados en la escuela de nivel inicial financiada por el programa en condiciones de operar	número de alumnos	0.00	2017	P	158.00	158.00
					P(a)	158.00	158.00
					A		

Details

Means of verification: Registros escuela inicial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Alumnos matriculados en la escuela de nivel primario financiada por el programa en condiciones de operar	número de alumnos	0.00	2017	P	185.00	185.00
					P(a)	185.00	185.00
					A		

Details

Means of verification: Registros escuela primaria

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Tiempo promedio de traslado diario a escuelas de alumnos	Numero de minutos	40.00	2017	P	20.00	20.00
					P(a)	20.00	20.00
					A		

Details

Means of verification: SECISYU. Encuesta a muestra significativa de alumnos del Polo Educativo

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Reducción en el consumo de energía	%	0.00	2017	P	28.00	28.00
					P(a)	28.00	28.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details							
Means of verification: SECISYU/ Certificado provisto por el programa Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.5	Reducción en el consumo de agua	%	0.00	2017	P	47.00	47.00
					P(a)	47.00	47.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.6	Reducción en el consumo de energía incorporada en los materiales	%	0.00	2017	P	31.00	31.00
					P(a)	31.00	31.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.7	Reducción en emisiones de CO2 durante el uso del edificio	TCO2/año	0.00	2017	P	216.00	216.00
					P(a)	216.00	216.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.8	Hogares del B31 con acceso formal a agua potable	porcentaje	0.00	2017	P	100.00	100.00
					P(a)	100.00	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.8	Hogares del B31 con acceso formal a agua potable	porcentaje	0.00	2017	A		
-----	--	------------	------	------	---	--	--

Details

Means of verification: Relevamiento SECISYU

Observations: El programa financia la construcción de un acueducto que será operado por la empresa proveedora de agua ysaneamiento (AySA) y conecta el servicio formal de agua de CABA a una red de distribución interna en el B31 que se ejecuta con fondos BIRF.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.12	Comerciantes y feriantes inscriptos al monotributo/monotributo social	%	8.33	2017	P	75.00	75.00
					P(a)	75.00	75.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta actividad económica SECISYU

Observations: Desagregar por género del comerciante. Línea de base y meta consideran todos los comercios del barrio.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa. mejora en el acceso a nuevos equipamientos tecnológicos, mobiliario y laboratorios de informática en las escuelas de la Ciudad de Buenos aires y en el acceso a nuevas plataformas digitales de aprendizaje y evaluación. Mejora en el acceso a sistemas informatizados de gestión de datos para la planificación educativa.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.1	Estudiantes que utilizan el nuevo equipamiento entregado por el Plan Sarmiento Fase II: conectividad y nuevo equipamiento/notebooks	Estudiantes	82,000.00	2019	P	168,000.00	168,000.00
					P(a)	168,000.00	168,000.00
					A		

Details

Means of verification: Reporte Plan Sarmiento

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.2	Docentes capacitados en el uso de la plataforma de aprendizaje de matemática	docentes	1,500.00	2019	P	4,000.00	4,000.00
					P(a)	4,000.00	4,000.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes anuales de la plataforma de aprendizaje.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	Alumnos de escuelas de Primaria y Secundaria que utilizan en los espacios digitales	alumnos	2019	P	24,000.00	24,000.00
				P(a)	24,000.00	24,000.00
				A		

Details

Means of verification: Informes anuales de la Dirección de Tecnologías ME.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.4	Escuelas de gestión estatal y unidades centrales del ME que operan la plataforma de gestión educativa integral	Escuelas	2019	P	800.00	800.00
				P(a)	800.00	800.00
				A		

Details

Means of verification: Informes anuales de acceso del sistema de gestión.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.5	Estudiantes que realizan las pruebas FEPBA y TESBA realizadas por estudiantes a través de la plataforma de evaluación	niños	2018	P	15,000.00	15,000.00
				P(a)	15,000.00	15,000.00
				A		

Details

Means of verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.6	Escuelas secundarias estatales en las que sus directivos y docentes reciben informes con datos de indicadores educativos a través de la Plataforma Mi Escuela	Escuela	2018	P	607.00	607.00
				P(a)	607.00	607.00
				A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.7	Estudiantes de 2° año de secundaria que realizan la evaluación de habilidades socioemocionales a través de la plataforma de evaluación	Estudiantes	0.00	2017	P	2,500.00	2,500.00
					P(a)	2,500.00	2,500.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de la anuales de la plataforma de evaluación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.8	Profesionales técnicos certificados en gestión e innovación educativa.	profesionales	0.00	2017	P	480.00	480.00
					P(a)	480.00	480.00
					A		

Details

Means of verification: Informe confirmando asistencia de profesionales y numero de certificados entregadas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Integración Urbana del Barrio 31

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Subcomponente 1.1. Polo Educativo. Nuevo edificio Ministerio de Educación de Gobierno de la CABA construido (incluye escuelas de nivel inicial, primario y un centro de terminalidad educativa)	Edificio	P	0	1	0	43,896,324
			P(a)	0	1	8,160,000	53,219,162
			A	0	1	7,284,761	52,343,923
1.2	Subcomponente 1.2. Proyecto 1 Acueducto. Nuevo acueducto construido	metro lineal	P	0	2,893	0	5,171,334
			P(a)	0	2,893	1,486,426.45	6,400,871.45
			A	0	2,893	1,486,426	6,400,871
1.3	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Espacio público por habitante en el B31	m2/hab	P	0	1.34	0	5,475,286
			P(a)	0	1.34	2,109,161	5,475,286
			A	0	1.34	1,317,689	4,365,539
1.4	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Nuevas calles arborizadas	metros lineales	P	0	3,040	4,000,000	4,000,000
			P(a)	882	3,040	2,870,000	4,000,000
			A	0	2,158	0	0
1.5	Subcomponente 1.3. Viviendas mejoradas por algún abordaje del PMV (iniciadas)	número de viviendas	P	33	1,022	10,600,000	24,600,000
			P(a)	897	1,022	13,724,991.17	24,600,000
			A	118	243	13,724,991	21,021,773
1.6	Subcomponente 1.4. Estudios de consultoría y/o de supervisión para dar soporte a la intervención realizada	número de planes y estudios	P	1	2	750,000	1,500,000
			P(a)	1	2	567,825	1,500,000
			A	1	1	567,825	752,597

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Calidad y Equidad Educativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Subcomponente 2.1. Netbooks y tablets del Plan Sarmiento Fase II entregados a estudiantes y docentes.	Netbooks y tablets	P	20,000	40,000	0	17,475,750
			P(a)	40,000	65,000	8,567,044	17,475,750
			A	36,720	36,720	8,567,044	8,567,044
2.2	Subcomponente 2.1. Escuelas equipadas con nuevo mobiliario.	Escuelas	P	0	60	941,421	2,700,000
			P(a)	0	60	677,427	2,700,000
			A		60	677,427	2,436,006
2.3	Subcomponente 2.1. Escuelas equipadas con aulas y/o espacios digitales equipados y en funcionamiento.	Escuelas	P	0	60	2,841,100	5,524,250
			P(a)	60	60	500,000	5,524,250
			A	60	60	500,000	500,000
2.4	Subcomponente 2.1. Plataforma de gestión educativa implementada en el ME.	Plataforma	P		1	0	2,844,810
			P(a)		1	0	2,844,810
			A		1	0	2,844,810
2.5	Subcomponente 2.1. Plataforma de aprendizaje de matemáticas diseñada y disponible en el sistema.	Plataforma	P	0	1	770,000	3,500,000
			P(a)	0	0	770,000	3,500,000
			A	0	0	0	0
2.6	Subcomponente 2.2. Plataformas de evaluación digital y formativa FEPSA y TESBA, y de evaluación socioemocionales diseñadas y disponibles en línea.	Plataforma	P	1	2	456,602	1,200,000
			P(a)	0	1	393,294	1,200,000
			A	0	0	73,635	264,067
2.7	Subcomponente 2.3. Cursos de capacitación diseñados e implementados.	cursos	P	2	4	300,000	600,000
			P(a)	2	4	300,000	600,000
			A	2	4	0	4,882
2.8	Subcomponente 2.3. Plan de implementación del Centro de Formación Docente en Nuevas Tecnologías finalizado.	Plan	P	1	1	400,000	500,000
			P(a)	1	1	42,030	500,000
			A	1	1	0	107,970

Other Cost

	Administración y monitoreo	P			1,240,000	4,000,000
		P(a)			2,822,338	5,000,000
		A			37,413	115,075

Total Cost

	Total Cost	P			22,299,123	122,987,754
		P(a)			42,990,536.62	134,540,129.45
		A			34,237,211	99,724,557

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Subcomponente 1.2. Proyecto 1 Acueducto. Nuevo acueducto construido	Modificación del costo total por modificacion de obra y redeterminaciones	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	09/22/2020
	Subcomponente 2.1. Netbooks y tablets del Plan Sarmiento Fase II entregados a estudiantes y docentes.	Se aumentó la menta, ver ayuda memoria taller de planificacion EZSHARE-902988266-1867	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARES	10/02/2020
	Subcomponente 2.1. Plataforma de aprendizaje de matemáticas diseñada y disponible en el sistema.	Se modificó la meta ver ayuda memoria taller de planificacion EZSHARE-902988266-1867	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SANTIAGOED	09/22/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
