

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1258	Chief of Operations Validation Date	10/15/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/08/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Services Development Program – Belgrano Plan	Loan Number	4312/OC-AR
Executing Agency	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1258	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	5,013,130	2.51%	194,986,870
Aggregated	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	5,013,130	2.51%	194,986,870

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

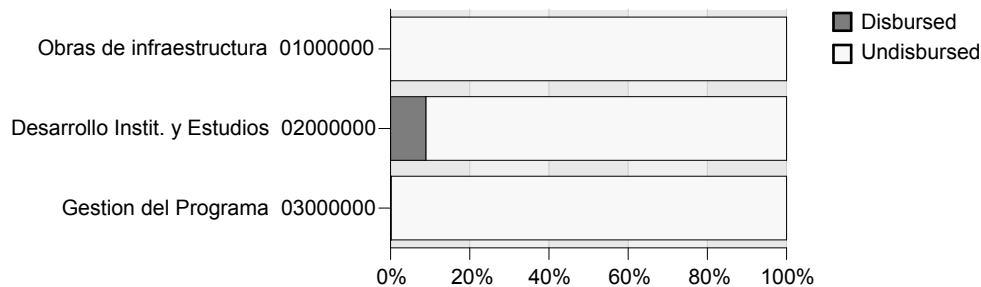

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejora de la Salud y el Bienestar de la Población

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	3,415.00	2017	P	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00		2,732.00
					P(a)	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00		2,732.00
					A	3,415.00	3,415.00					3,415.00

Details

Means of verification: Boletín integrado de vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

Observations: Ninguna

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Cobertura del servicio de agua potable ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Hogares con nuevo acceso a sistemas de agua potable por red en la región del Plan Belgrano.	# of households	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.1	Cobertura de agua potable en la región del Plan Belgrano.	%	92.40	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	92.47
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	92.47
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Resultado 2: Cobertura del servicio de saneamiento ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.0	Hogares con acceso a nuevas redes cloacales en la región del Plan Belgrano	# of households	0.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	8,750.00	14,500.00	29,000.00	29,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	23,250.00	29,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto;

Observations: se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la región del Plan Belgrano	Households (#)	100,000.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	200,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	19,000.00	219,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.2	Cobertura de saneamiento en la región del Plan Belgrano.	%	46.70	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14	0.00	48.14
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14	0.00	48.14
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.0	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Aguas de Formosa	%	87.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.1	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Agua Potable de Jujuy	%	92.70	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	99.80
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	99.80
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.2	Cobertura de micromedición en la región del Plan Belgrano (Hogares con micromedidores de agua instalados y en funcionamiento / Total de hogares con servicio de agua potable por red)	%	41.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	0.00	41.30
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	0.00	41.30
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			
Details												
Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Obras de infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Sistemas de Agua Potable construidos	sistema	P	0	1	4,103,654	15,000,000
			P(a)	0	1	0	15,317,490
			A	0	0	0	0
1.2	Sistemas de Saneamiento construidos	sistema	P	0	5	94,115,555	232,000,000
			P(a)	0	5	425,000	232,425,000
			A	0	0	118,594	118,594

Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo institucional y estudios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	No. de Planes	P	0	4		5,325,000
			P(a)	1	3	2,566,685	6,402,945.5
			A	0	1	1,264,547	3,929,561
2.2	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de micromedidores	P	12,813	25,000	5,125,000	9,675,000
			P(a)	0	25,000	0	9,675,000
			A	0	0	0	0
2.3	Macromedidores instalados instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de macromedidores	P	46	160	1,437,500	5,000,000
			P(a)	0	160	0	5,000,003
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administracion del Programa	P			300,000	1,500,000
		P(a)			300,000	1,500,000
		A			77,523	181,824
	Monitoreo, Evaluación y Auditorías	P			450,000	1,500,000
		P(a)			0	1,500,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			105,531,709	270,000,000
		P(a)			3,291,685	271,820,438.5
		A			1,460,664	4,229,979

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	De acuerdo con las reuniones mantenidas con el ejeutor se actualizan los valores de este indicador. Se adjuntan los documentos de respaldo.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	09/24/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SOFIAG	09/18/2020
				Modify Physical Historical Actual	SOFIAG	09/18/2020
	Sistemas de Saneamiento construidos	Se reduce el valor del P(a) para el 2020 por la pandemia de COVID-19	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	09/24/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
