

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1125	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/02/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	Loan Number	3104/OC-CO
Executing Agency	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deDesastres	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Team Leader	ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se avanzó con el cumplimiento deL Plan de Acción corerectivo del 2019 dentro del cronograma acordado. Se tiene una nueva ubicación para el proyecto de la toma de agua para la planta desalinizadora que debe actualizar los estudios socio ambientales y contar con la licencia de Coralina dentro de los plazos establecidos. La tormenta IOTA ha impactado en la isla y en la infraestructura del Programa por lo que se esta realizando un inventario de daños y plan de respuesta		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1125	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	42,985,828.45	61.41%	27,014,171.55
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	42,985,828.45	61.41%	27,014,171.55

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

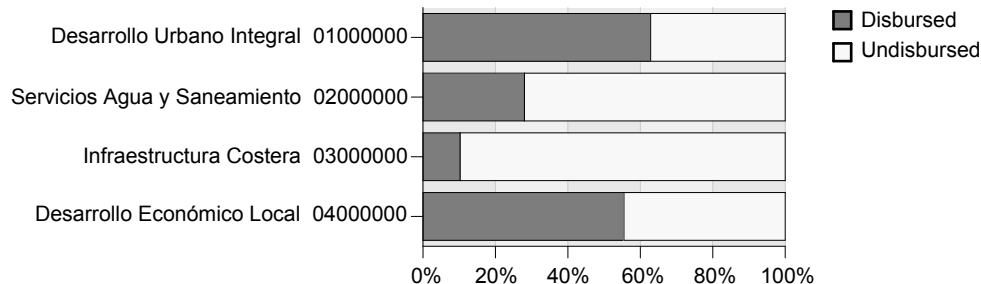

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2022
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.90	2013	P		75.00
					P(a)		75.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.60	2011	P								30.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	50.00	30.00		50.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Encuesta de calidad de vida del DANE

Observations: El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Millones de pesos	64.65	2013	P								93.10
					P(a)		0.00	0.00	0.00	93.10	93.10		93.10
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45.00	2013	P								57.80
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.85			59.85
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Micro y pequeñas empresas desarrolladas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.70	2012	P									47.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00			47.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	# of households	800.00	2013	P	1,000.00	1,500.00	2,000.00					2,500.00
					P(a)	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7.00	2013	P	7.00	10.00	11.00					12.00
					P(a)	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00	12.00		12.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
5.1	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	IDF	55.54	2012	P								59.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.00	59.00		59.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Urbano Integral

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P		6		12,600,000
			P(a)	0	9	1,432,337	17,712,220
			A	0	6	1,432,337	11,899,094
1.2	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P		3		200,000
			P(a)	0	3	0	1
			A	0	3	0	0
1.3	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P		0.9		6,753,000
			P(a)	0	0.9	0	148,626
			A	0	0	0	148,626
1.4	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P		1		2,457,000
			P(a)	0	1	0	1
			A	0	0	0	0
1.5	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P		1		2,490,000
			P(a)	0	1	0	1
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P		25		6,335,000
			P(a)	0	25	287,000	21,429,358.3
			A	0	0	287,000	1,151,978
2.2	Redes rehabilitadas	Km	P		25		7,919,000
			P(a)	25	37	1,335,080	13,066,554.62
			A	25	25	1,335,080	7,058,967
2.3	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P		1		4,387,000
			P(a)	0	1	0	1,609,329
			A	0	1	0	1,609,329
2.4	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P		1		1,663,000
			P(a)	0	1	34,306	2,497,221.71
			A	0	0	34,306	136,192

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P		3		4,800,000
			P(a)	0	3	0	925,296
			A	0	3	0	925,296
3.2	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P		1.1		3,200,000
			P(a)	0	1.1	0	3,529,411
			A	0	0	0	0
3.3	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P		4		500,000
			P(a)	0	4	0	1
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	1
			A	0	0	0	0
3.5	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P		3		200,000
			P(a)	0	3	0	1
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P		90		240,000
			P(a)	0	90	0	1
			A	0	56	0	0
4.2	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	# of MSMEs	P		95		4,760,000
			P(a)	0	107	0	2,774,055
			A	44	151	0	2,774,055

Component Nbr. 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
5.1	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P		30		210,000
			P(a)	0	30	0	154,426.37
			A	0	0	0	0
5.2	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P		1		340,000
			P(a)	0	1	0	1
			A	0	1	0	0
5.3	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	1
			A	0	0	0	0
5.4	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P		30		600,000
			P(a)	0	37	0	164,223
			A	0	37	0	164,223
5.5	Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	1
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P				4,500,000
		P(a)			250,000	5,442,302
		A			145,987	2,134,426
	Auditoria	P				500,000
		P(a)			144,809	546,967
		A			29,259	281,310

Total Cost

	Total Cost	P				70,000,000
		P(a)			3,483,532	70,000,000
		A			3,263,969	28,283,496

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	09/30/2020
	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	09/30/2020
	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	09/30/2020
	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	09/30/2020
	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	09/30/2020
	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Redes rehabilitadas	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	09/30/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	09/30/2020
	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Sistema de información para la administracion de la defensa juridica diseñado e implementado	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020
	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	El Programa tuvo una prórroga al plazo de último desembolso hasta marzo de 2022, con lo cual se replanificaron las metas físicas y financieras de los años 2021 y 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	10/01/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities
