

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1075	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/16/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/09/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Productive Corridors Program	<b>Loan Number</b>	3170/OC-ES, 3170/OC-ES-1, 3170/OC-ES-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	<b>Sector/Subsector</b>	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
<b>Team Leader</b>	SOLIS AHUMADA, GALILEO HUMBERTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	El Salvador
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1075	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	25,760,189.05	64.40%	14,239,810.95
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	25,760,189.05	64.40%	14,239,810.95

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

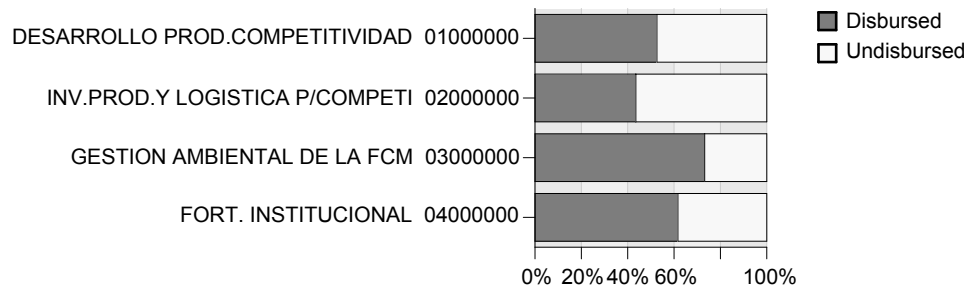

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda

**Observation:** Alineado con la Estrategia del Banco con El Salvador, se enfatiza el mejoramiento del crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda mediante el apoyo a la innovación y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Cambio en la recaudación impositiva por las mayores ventas e ingresos de las empresas beneficiadas que vieron aumentada su productividad.	Indice	1.00	2013	P	1.10		1.10
					P(a)	1.10		1.10
					A			

#### Details

**Means of verification:** Cuentas nacionales e Informe del Ministerio de Hacienda

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Aumento de la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) ubicadas en las áreas de intervención del Programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Nivel de ingresos de las empresas beneficiarias de cofinanciamientos parciales no reembolsables (o aportes no-reembolsables ANR) y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	10.00		20.00
					P(a)	10.00		20.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Registros de la UCP y encuestas a empresas

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Nivel de empleo de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					P(a)	5.00		10.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Registros de la UCP y encuestas a empresas

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Productividad de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					P(a)	5.00		10.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Registros de la UCP y encuestas a empresas

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Mejora de la infraestructura productiva y logística para la competitividad

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	P	0.50		0.40
					P(a)	0.50		0.40

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.1	Velocidad para los Usuarios de Automóviles	km/h	24.70	2013	P	30.00		50.00
					P(a)	30.00		50.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.2	Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2013	P	5.50		3.50
					P(a)	5.50		3.50
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.3	Velocidad para los Usuarios de Autobuses	km/h	22.70	2013	P	25.00		45.00
					P(a)	25.00		45.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P	3.00		2.15

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P(a)	3.00		2.15
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.5	Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	km/h	22.70	2013	P	25.00		45.00
					P(a)	25.00		45.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.6	Cantidad de productores y pescadores artesanales que utilizan nuevas infraestructuras productivas (muelles, centros de acopio, comercialización y sistemas de cadena de frío)	# productores	0.00	2013	P	200.00		400.00
					P(a)	200.00		400.00
					A			
Details								
Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas sobre la base de los registros de CENDEPESCA.								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.7	Tiempo adicional que se conservan los productos a una temperatura adecuada para evitar pérdidas.	horas	0.00	2013	P	24.00		48.00
					P(a)	24.00		48.00
					A			
Details								
Means of verification: Bitácoras administrativas de uso de sistema de cadena de frío								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Mejora de la gestión ambiental de la Franja Costero Marina (FCM)

Observation:

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
2.0	Percepción favorable de la gestión ambiental en la Franja Costero Marina	% de población	0.00	2013	P	50.00		66.00
					P(a)	50.00		66.00
					A			
Details								
Means of verification: Encuesta de percepción								
Observations: No existe actualmente una medida de este indicador. Como parte del proceso de consulta ambiental y social se realizará una encuesta para medir la línea de base del indicador.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

**Outcome Nbr. 3:** Contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo al desarrollo productivo

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
3.0	Inversión en políticas de apoyo al desarrollo productivo de las instituciones involucradas	índice	1.00	2013	P	1.10		1.20
					P(a)	1.10		1.20
					A			
Details								
Means of verification: Registros de UCP y presupuestos de las instituciones involucradas.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYMEs

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	# of enterprises	P	20	100	52,190	461,200
			P(a)	68	100	37,010.2	711,792.32
			A	93	25	27,360	204,301.72
1.2	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	# of enterprises	P	370	1,100	483,481	2,250,240
			P(a)	52	1,100	343,772.95	2,492,439.89
			A	52	229	131,102.07	1,133,459.15
1.3	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Grupos asociativos	P	0	30	29,000	237,500
			P(a)	0	30	117,977.52	440,029.53
			A	30	0	37,469.68	163,264.14
1.4	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	# of enterprises	P	80	250	80,000	340,000
			P(a)	60	250	19,260	176,314.15
			A	163	34	12,960	113,714.15
1.5	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Grupos asociativos	P	9	25	42,000	150,000
			P(a)	0	25	0	42,658.6
			A	0	2	0	31,200
1.6	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Emprendedores	P	0	1,200	51,000	2,125,000
			P(a)	99	1,200	355,676	1,885,966.88
			A	80	656	0	1,351,956.88
1.7	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	150	300	1,125,000	2,250,000
			P(a)	65	300	825,000	2,263,786.63
			A	77	312	0	1,438,786.63
1.8	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	75	150	562,500	1,125,000
			P(a)	0	184	295,044.5	1,179,952
			A	0	184	0	881,848
1.9	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Proyectos productivos	P	20	115	312,060	1,737,060
			P(a)	0	10	1,094,550	2,234,260.3
			A	0	10	3,000	223,160.3
1.10	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Iniciativas productivas	P	19	42	608,714.28	5,224,000
			P(a)	5	51	965,786.99	4,052,799.7
			A	0	46	171,766.81	2,995,188.57

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Muelles de uso dual construidos/reconstruido	Muelles	P	1	4	4,443,410	4,750,000
			P(a)	0	4	0	7,100,316.4
			A	0	0	0	0
2.2	Centro de Acopio (CAS) construido	Centro de Acopio	P	0	1	512,000	1,200,000
			P(a)	0	1	0	624,003.5
			A	0	0	0	0
2.3	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	Km	P	0	0.6	0	1,100,000
			P(a)	0	0.6	0	567,595.23
			A	0	0.6	0	567,595.23
2.4	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Km	P	6.8	6.8	1,166,298	3,850,000
			P(a)	6.8	6.8	1,425,083.04	4,525,067.54
			A	6.7	6.7	757,891.14	3,857,875.64
2.5	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S ( Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	Km	P	9.8	9.8	6,775,248	10,500,000
			P(a)	9.8	9.8	598,428.19	8,212,317.33
			A	9.8	9.8	22,918.75	7,636,807.89

## Component Nbr. 3 Gestión Ambiental de la Franja Costero-Marítima

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Mapa de zonificación ambiental del Golfo de Fonseca desarrollado	Mapa	P	0	1	0	254,000
			P(a)	0	1	0	223,502.72
			A	0	1	0	223,502.72
3.2	Pasantías en Zonificación Ambiental y Rehabilitación de costas realizadas	Pasantías	P	0	14	0	35,000
			P(a)	0	15	0	32,702.15
			A	0	15	0	32,702.15
3.3	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas	Talleres/ eventos	P	0	5	0	13,500
			P(a)	5	5	13,500	13,500
			A	2	2	1,609.87	1,609.87
3.4	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	Estudio	P	0	1	0	80,400
			P(a)	0	1	55,405.42	120,446.58
			A	0	0	0	0
3.5	Funcionarios capacitados en Dinámica y rehabilitación de costas.	Funcionarios	P	0	25	0	14,000
			P(a)	25	25	0	15,123.55
			A	0	0	0	15,123.55
3.6	Equipo tecnológico y software especializado instalado	Equipo	P	0	1	0	103,100
			P(a)	0	1	0	94,725
			A	0	1	0	94,725



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
4.1	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Manuales	P	0	9	36,000	311,000
			P(a)	1	9	0	237,444.26
			A	1	9	0	170,548.72
4.2	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Herramientas	P	0	4	9,334	253,000
			P(a)	2	4	32,800	164,289.6
			A	0	2	0	74,733.53
4.3	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Funcionarios	P	0	70	18,668	171,000
			P(a)	30	219	21,113.7	174,552.9
			A	0	189	4,313.7	100,282.07
4.4	Estrategia de Gestión de Riesgos diseñada	Estrategia	P	0	1	0	15,000
			P(a)	1	1	21,000	21,000
			A	0	0	0	0
4.5	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Asociaciones	P	0	2	0	55,000
			P(a)	0	0	0	55,000
			A	0	0	0	0
4.6	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Laboratorio	P	0	1	0	45,000
			P(a)	0	2	0	144,133.24
			A	0	2	0	144,133.24
4.7	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Plan	P	1	4	50,000	200,000
			P(a)	1	4	18,950	253,580
			A	0	2	0	162,042.29

#### Other Cost

	Administración (Evaluaciones de Impacto, Auditorías, Evaluaciones del Programa y UEP)	P			257,900	1,150,000
		P(a)			517,710.51	1,940,700
		A			191,300	772,074.41

#### Total Cost

	Total Cost	P			16,614,803.28	40,000,000
		P(a)			6,758,069.02	40,000,000
		A			1,361,692.02	22,390,635.85

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Ajuste por ciertos retrasos en la ejecución de proyectos durante los 6 primeros meses del año lo que causo una menor cantidad de pagos que los previstos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	10/06/2020
	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Ajuste por ciertos retrasos en la ejecución de proyectos durante los 6 primeros meses del año lo que causo una menor cantidad de pagos que los previstos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	10/06/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions
