

PMR Operational Report

Operation Number	HA-L1103	Chief of Operations Validation Date	11/02/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/30/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Port-au-Prince Water and Sanitation Project III	Loan Number	4353/GR-HA
Executing Agency	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	PEREZ MONFORTE, SERGIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Haiti
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D' HAITI		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	The Project Executing Unit (PEU) of the EA is completing the classification and Environmental and Social Management Plan (ESMP) for the COVID-19 projects. Consultations are planned for all category B projects. The PEU is moving forward with projects that were not in the sample. The international Environmental and Social (E&S) consultant has been hired.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1103	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	4,121,445.89	6.34%	60,878,554.11
Aggregated	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	4,121,445.89	6.34%	60,878,554.11

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

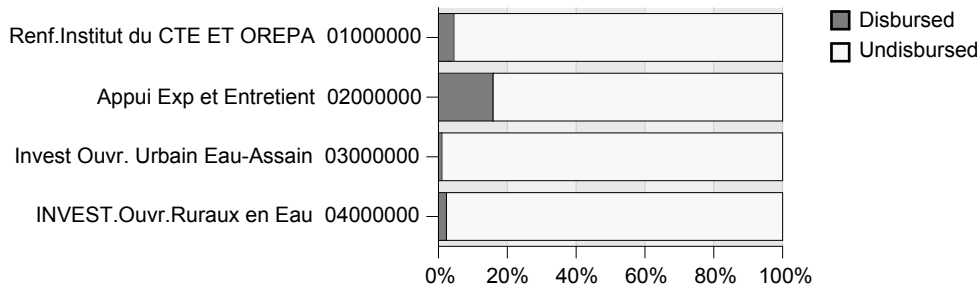

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Résultat I : La DINEPA exerce une réglementation effective au niveau de la DINEPA centrale et la déconcentration au niveau de l'OREPA-Ouest.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
0.1	Nombre de CTEs de la DINEPA qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	CTE	0.00	2016	P				0.00		
					P(a)		0.00	3.00	8.00	10.00	10.00
					A		0.00	0.00			

Details

Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
0.2	Nombre de structures de l'OREPA Ouest qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	Unité	0.00	2016	P	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					P(a)	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					A	0.00	1.00	1.00			0.00

Details

Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Résultat II : Le CTE-RMPP améliore sa viabilité financière

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.1	Nombre de connexions domiciliaires et commerciales actives au CTE-RMPP	Connection active	46,000.00	2016	P	46,000.00	48,250.00	54,740.00	61,640.00	68,200.00	68,200.00
					P(a)	46,000.00	48,250.00	49,500.00	57,000.00	68,200.00	68,200.00
					A	46,000.00	48,000.00	50,117.00			46,000.00

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/Jour	103,000.00	2016	P	103,000.00	159,000.00	169,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00
					P(a)	103,000.00	159,000.00	150,000.00	160,000.00	183,000.00	183,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/Jour	103,000.00	2016	A	103,000.00	130,000.00	137,256.00				103,000.00
-----	--	---------	------------	------	---	------------	------------	------------	--	--	--	------------

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.2	Indice de recouvrement du CTE-RMPP (% de paiement des factures)	%	54.00	2016	P	54.00	59.00	63.00	66.00	71.00	71.00
					P(a)	54.00	59.00	55.00	63.00	71.00	71.00
					A	54.00	51.00	25.10			54.00

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.3	Ratio d'exploitation du CTE-RMPP (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles)	Ratio	0.67	2016	P	0.67	0.90	1.07	1.22	1.32	1.32
					P(a)	0.67	0.90	0.70	1.22	1.32	1.32
					A	0.67	0.80	0.67			0.67

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Résultat III : L'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d'hygiène se sont améliorés dans la RMPP

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.1	Pourcentage de foyer ayant accès à un service d'eau amélioré	%	44.00	2016	P				44.00		60.00
					P(a)				44.00		60.00
					A						

Details

Means of verification: Enquêtes auprès des foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year								
2.2	Nombre de foyers ayant acces a l'eau potable a domicile	Foyer	92,000.00	2016	P	92,000.00	97,600.00	121,600.00	150,000.00	178,400.00		178,400.00
					P(a)	92,000.00	97,600.00	100,000.00	130,000.00	178,400.00		178,400.00
					A	92,000.00	96,000.00	100,234.00				92,000.00

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.3	Pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable via un kiosque	%	4.50	2016	P	4.50	5.00	5.50	6.00	6.00	6.00
					P(a)	4.50	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00
					A	4.50	5.00	5.00			0.00

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.4	Nombre d'heures par jour d'alimentation des ménages à partir d'une connexion du CTE-RMPP	Heure/Jour	3.30	2016	P	4.00	6.00	9.00	12.00	12.00	12.00
					P(a)	4.00	6.00	7.00	12.00	12.00	12.00
					A	3.30	5.00	5.00			3.30

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.5	% de femmes qui travaillent dans des kiosques nouveaux ou réhabilités dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville	%	13.00	2016	P	15.00	18.00	23.00	27.00	35.00	20.00
					P(a)	15.00	18.00	13.00	27.00	35.00	20.00
					A	13.00	14.00	18.05			13.00

Details

Means of verification: Rapport du dép. Quartiers Défavorisés du CTE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.6	% de ménages qui ont des installations pour le lavage des mains, y compris du savon	%	5.00	2016	P	5.00	15.00	30.00	25.00	20.00	20.00
					P(a)	5.00	15.00	30.00	25.00	20.00	20.00
					A	5.00	6.00	6.00			5.00

Details

Means of verification: Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.7	% de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation	%	75.00	2016	P	75.00	75.00	90.00	85.00	85.00	85.00
					P(a)	75.00	75.00	75.00	85.00	85.00	85.00
					A	75.00	75.00	75.00			75.00

Details

Means of verification: Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Résultat 4 : L'accès aux services d'eau et d'assainissement et à l'hygiène dans des zones rurales de l'OREPA-Ouest

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'assainissement et de hgiène amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00		4,000.00
					P(a)	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00		4,000.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'eau amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	500.00	3,500.00	4,000.00		8,000.00
					P(a)	0.00	500.00	3,500.00	4,000.00		8,000.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Enquêtes auprès des foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Composante I : Renforcement institutionnel du CTE-RMPP et de la DINEPA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Contats par résultats signés (APP)	Contract	P	1	1	3,275,000	9,000,000
			P(a)	0	1		5,600,000
			A	0	0		29,823
1.2	OREPA NORD dotée de matériel et de personnel pour acquérir l'éligibilité du projet HA-L1135	Unité	P		1		125,000
			P(a)	0	1	0	70,365.24
			A	1	2	313,396.8	383,762.04
1.3	Contrats de consultations d'appui à la DINEPA pour la regulation et le suivi des APP signés	Contrat	P	1	2	52,500	175,000
			P(a)	0	2		140,000
			A	0	1		0
1.4	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'accès à l'assainissement et l'hygiène , exécutées	Campagne	P	1	2	220,000	510,000
			P(a)	0	1	0	480,000
			A	0	0	0	0
1.5	OREPA Ouest dotée de bâtiment et matériel roulant	Unité	P	1	3	500,000	711,595.6
			P(a)	2	4	0	654,944.07
			A	1	2	54,774.16	59,718.23
1.6	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Unité	P	2	3	120,000	400,000
			P(a)	0	3		340,000
			A	0	0		0
1.7	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses structures dotées du matériel et de personnel	Unité	P	2	8	400,000	1,300,000
			P(a)	8	14	820,000	2,291,651.53
			A	8	10	720,216.22	968,185.44

Component Nbr. 2 Composante II : Appui au fonctionnement du CTE-RMPP et à l'entretien

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Accords de subvention au CTE pour la facture de l'EdH singés	Accord	P		1	250,000	950,000
			P(a)	0	1	300,000	950,000
			A	0	1	170,492.57	649,240.43
2.2	Contrat d'approvisionnement en combustible signé	Contrat	P		1	250,000	750,000
			P(a)	0	1	300,000	750,000
			A	0	1	414.7	31,877.23
2.3	CTE-RMPP doté du personnel	Unité	P	1	4	125,000	400,000
			P(a)	1	4	25,000	400,000
			A	0	1	0	0
2.4	Agences du CTE-RMPP dotées de matériel et du personnel	Agences	P	2	3	125,000	250,000
			P(a)		3		170,000
			A	0	0	0	0
2.5	Travaux d'amélioration du service réalisés par le CTE	Unité	P	1	4	300,000	750,000
			P(a)	1	4		750,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Composante III : Investissements dans des travaux relatifs à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Conduites structurantes et de refoulement installées	ml	P	7,000	17,000	2,085,000	12,500,000
			P(a)	0	17,000	716,904	12,500,000
			A	0	0	0	284,882.13
3.2	Réservoirs réhabilités ou construits	Réservoir	P	0	3	920,676.45	3,115,252.15
			P(a)	0	3	766,000	3,115,252.15
			A	0.5	0.5	397,313.45	724,520.55
3.3	Conduites de distribution installées	ml	P	4,500	9,500	2,040,000	10,100,000
			P(a)	0	9,500		10,100,000
			A	0	0		0
3.4	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	Unité	P	120	400	1,925,000	7,150,000
			P(a)	0	400		6,550,000
			A	0	0		0
3.5	Connexions installés au niveau des ménages	Connexion	P	10,000	31,500	1,620,000	4,020,000
			P(a)	0	31,000	0	4,020,000
			A	0	0	0	0
3.6	Armoires électriques et d'automatismes rehaibilités	Unité	P		2		220,000
			P(a)	0	2		220,000
			A	0	0		0
3.7	Kiosques construits ou réhabilités	Kiosque	P	25	55	250,000	560,000
			P(a)	0	55		500,000
			A	0	0		0
3.8	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers dévavorisés de la RMPP signés	Contrat	P	3	5	460,000	1,219,600
			P(a)	3	7	25,000	919,600
			A	3	3		19,393.76
3.9	Contrat de supervision des grands travaux signé	Contrat	P		1	438,000	1,088,235
			P(a)	3	4	50,000	1,088,235
			A	3	4	57,644.67	57,644.67
3.10	Bâtiment du CTE de Ouanaminthe construit	Unité	P		1	112,500	250,000
			P(a)	0	1	86,284	160,058.48
			A	1	1	93,294.19	142,068.67
3.11	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEF réalisées	Unité	P	2	3	200,000	300,000
			P(a)	0	2		250,000
			A	1	2		15,156.61
3.12	Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle réalisée	Campagne	P	1	1	35,000	100,000
			P(a)	0	1		100,000
			A	0	0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Composante IV : Investissements dans les domaines de l'eau, assainissement et hygiène dans des zones rurales de l'OREPA OUEST

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Outil de planification rural developé	Unité	P		1	50,000	100,000
			P(a)	0	1		80,000
			A	0	0		0
4.2	Campagnes d'assainissement et d'hygiène réalisées dans 8 Sections communales de l'OREPA Ouest réalisées	Campagne	P	4	8	235,000	511,765
			P(a)	0	8		411,765
			A	0	0	0	0
4.3	Réseau d'eau potable construites ou rehabilitées	Unité	P	2	4	120,000	350,000
			P(a)	0	4		330,000
			A	0	0		0
4.4	Points d'eau construites ou rehabilités	Unité	P	11	24	2,175,000	4,450,000
			P(a)	0	24		4,430,000
			A	0	0		0

Component Nbr. 5 Composante V : Administration du Projet

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
5.1	Formations et échanges avec opérateurs régionaux réalisées	Unité	P	1	4	75,000	211,500.65
			P(a)	0	4		211,500.65
			A	0	1	16,746	61,746
5.2	Unité d'exécution dotée du personnel	Unité	P	1	4	530,000	1,952,051.6
			P(a)	1	4	150,000	1,952,051.6
			A	1	2	294,892.82	440,121.47
5.3	Unité d'exécution dotée du materiel	Unité	P	1	4	75,000	530,000
			P(a)	0	3	25,000	455,000
			A	1	2	141,745	188,523.65
5.4	Audits et supervisions réalisés	Unité	P	1	4	280,000	950,000
			P(a)	1	4	60,000	950,000
			A	0	1	28,017.45	83,655.34

Component Nbr. 6 Composante VI : Mise en œuvre de mesures d'atténuation de la pandémie Covid 19

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
6.1	Points de lavage des mains (PLM) dans les sites critiques, construits et opérés	Nombre PLM	P		0		0
			P(a)	400	400	367,000	367,000
			A	400	400	192,061.95	192,061.95
6.2	Campagnes de divulgation concernant les mesures d'hygiène mises en œuvre	Campagnes	P		0		0
			P(a)	1	1	150,000	150,000
			A	1	1	183,516.05	183,516.05

Total Cost

Total Cost	P			19,243,676.45	65,000,000
	P(a)			3,841,188	61,457,423.72
	A			2,664,526.03	4,515,897.22

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Agences du CTE-RMPP dotées de matériel et du personnel	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Bâtiment du CTE de Ouanaminthe construit	Changement en vue d'adapter le produit à l'incertitude concernant l'estimation initiale de l'impact de la pandémie sur le produit	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Campagnes d'assainissement et d'hygiène réalisées dans 8 Sections communales de l'OREPA Ouest réalisées	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'accès à l'assainissement et l'hygiène, exécutées	Une légère révision du coût à la baisse est justifiée par le fait de prioriser des activités de lutte contre le covid 19 au détriment de certains produits	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MRODRIGUEZ	09/30/2020
	Campagnes de divulgation concernant les mesures d'hygiène mises en œuvre	Activité incluse dans le nouveau composant covid afin de surveiller la diffusion des bonnes pratiques d'hygiène pour réduire la propagation du virus	Create Output	N/A	FDUGAS	09/22/2020
	Composante VI : Mise en œuvre de mesures d'atténuation de la pandémie de grippe Covid 19	Pour prendre en compte le support apporté par le projet dans le cadre de l'urgence Covid-19. Pour suivre de manière séparée l'impact du financement accordé pour supporter les activités liées à l'urgence Covid, une nouvelle composante budgétaire a été créée. Du coup il faut que ce changement soit aussi reflété dans la matrice des résultats.	Create Component	N/A	FDUGAS	09/22/2020
	Connexions installées au niveau des ménages	Activité affectée par la pandémie, de sorte que sa planification est reportée aux cycles futurs	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MRODRIGUEZ	09/30/2020
	Contacts par résultats signés (APP)	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits	Modify Output	Modify Financial EOP P(a)	MRODRIGUEZV	10/08/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output				value - caused by a change in the Financial P(a).		
	Contrat de supervision des grands travaux signé	Changement en vue d'adapter le produit aux avancements assurés	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MERODRIGUEZ	09/30/2020
	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers dévaforisés de la RMPP signés	Changement dans progrès physique en vue d'adapter le produit aux nombres des contrats assurés. La modification financière correspond aussi à une légère révision à la baisse justifiée par le fait qu'il n'est pas possible d'engager de grandes sociétés de conseil pour la supervision mais plutôt des consultants individuels, ce qui permettra de réduire le coût de ce produit au fil du temps en faveur des autres activités.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MERODRIGUEZ	09/30/2020
	Contrats de consultations d'appui à la DINEPA pour la regulation et le suivi des APP signés	Une légère révision du coût à la baisse est justifiée par le fait de prioriser des activités de lutte contre le covid 19 au détriment de certains produits	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Kiosques construits ou réhabilités	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses esctructures dotées du materiel et de personel	Produit adapté à l'approbation du financement de la lutte contre la pandémie, avec une augmentation de ce produit pour assurer la continuité des services d'eau et soutenir la coordination des activités d'urgence. Également un accord existe pour doter a la DINEPA d'un bâtiment prope ce qui entraîne également une augmentation du coût du produit.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the	MRODRIGUEZV	10/08/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses esctructures dotées du materiel et de personel	Produit adapté à l'approbation du financement de la lutte contre la pandémie, avec une augmentation de ce produit pour assurer la continuité des services d'eau et soutenir la coordination des activités d'urgence. Également un accord existe pour doter a la DINEPA d'un bâtiment prope ce qui entraîne également une augmentation du coût du produit.	Modify Output	Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MERODRIGUEZ	09/30/2020
	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	OREPA NORD dotée de matériel et de personnel pour acquérir l'elégibilité du projet HA-L1135	Changement en vue d'adapter le produit à l'incertitude concernant l' estimation initiale de l'impact de la pandémie sur le produit	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MERODRIGUEZ	09/30/2020
	OREPA Ouest dotée de bâtiment et materiel roulant	Changement en vue d'adapter le produit à l'incertitude concernant l' estimation initiale de l'impact de la pandémie sur le produit, de sorte que la planification pour 2020 a été reportée à des périodes ultérieures. D'autre part, une unité supplémentaire dans l'avance physique par rapport à l'avance prévue P, est due au fait qu'il a été convenu d'acheter un bâtiment pour abriter les bureaux de l'OREPA Ouest puisqu'il n'a pas de propriété et dépense des ressources importantes en loyer pour un secteur qui, pour le moment, a à peine des revenus ou une subvention de l'État.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MRODRIGUEZV	10/09/2020
	Outil de planification rural developé	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Points d'eau construites ou rehabilités	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Points de lavage des mains (PLM) dans les sites critiques,	Activité incluse dans le nouveau composant covid afin de surveiller l'installation et le fonctionnement des points de lavage des mains dans les endroits sensibles (par exemple, marchés, prisons, centres médicaux,	Create Output	N/A	MRODRIGUEZV	09/22/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	construits et opérés	etc.)				
	Réseau d'eau potable construites ou réhabilitées	Ajustement du montant du produit en faveur d'autres produits destinés à la gestion de la pandémie	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
	Unité d'exécution dotée du matériel	Changements en vue d'adapter le produit à l'incertitude concernant les estimations initiales de l'impact de la pandémie sur le produit	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZ	09/30/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEP réalisées	Changement en vue d'adapter le produit à l'incertitude concernant l'estimation initiale de l'impact de la pandémie sur le produit	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MRODRIGUEZ	09/30/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
