

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1094	Chief of Operations Validation Date	10/19/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Ciudad de la Costa-west area Sanitation Project	Loan Number	3258/OC-UR, 3259/CH-UR
Executing Agency	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	BASANI, MARCELLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La gestión de riesgos ambientales y sociales presenta deficiencias y se han detectado apartamientos en reiteradas oportunidades sin que se logre una corrección de estos. La implementación del PGAS no se realiza de forma adecuada notándose especialmente en lo referido a divulgación de información y consulta, prevención de la contaminación y salud y seguridad ocupacional.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1094	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	51,700,000	68.93%	23,300,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	51,700,000	68.93%	23,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

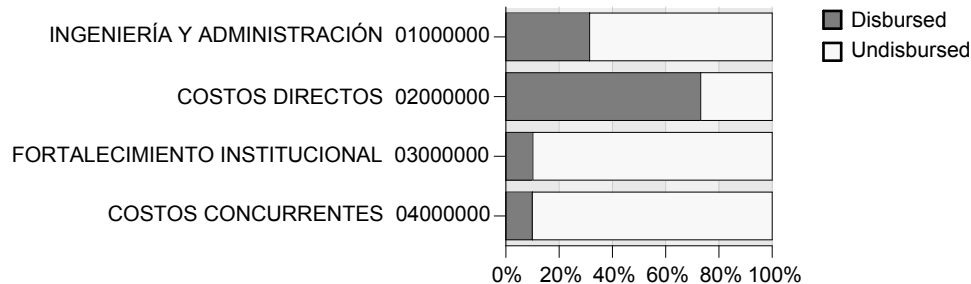

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Cobertura de saneamiento para la población de Ciudad de la Costa, zona oeste aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en la zona oeste de Ciudad de la Costa	# of households	0.00	2014	P	0.00	0.00	600.00	1,000.00	750.00	700.00	1,285.00				4,335.00
					P(a)	0.00	0.00	600.00	0.00	500.00	500.00	700.00	1,000.00	1,487.00	191.00	3,086.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	270.00				

Details

Means of verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Households (#)	0.00	2014	P	0.00	0.00	600.00	1,000.00	750.00	700.00	1,285.00				4,335.00
					P(a)	0.00	0.00	600.00	300.00	500.00	500.00	700.00	1,000.00	1,487.00	191.00	3,086.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	270.00				

Details

Means of verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Calidad y eficiencia del servicio de agua potable en Ciudad de la Costa, zona oeste y central mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Agua no contabilizada en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	l/conexion/dia	365.00	2014	P							150.00				150.00
					P(a)										150.00	150.00
					A											

Details

Means of verification: Balances de agua realizados por la Gerencia de Agua no contabilizada-OSE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	# of households	0.00	2014	P		379.00	1,904.00	2,444.00	1,523.00	450.00	300.00				7,000.00
					P(a)		379.00	2,986.00	12,872.00	2,000.00	1,721.00	2,843.00	447.00	1,085.00	937.00	15,758.00
					A		206.00	4,987.00	2,910.00	929.00	1,414.00	0.00				

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Cantidad de conexiones sustituidas según certificados de obra Responsable: gerencia de Obras-OSE

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Número de roturas de la red en la zona central y oeste de Ciudad de la Costa	numero/km/año	8.00	2014	P							0.90				0.90
					P(a)									0.90	0.90	
					A											

Details

Means of verification: Numero de arreglos de roturas registrados por la Gerencia del área metropolitana-OSE

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
-------------------	--	----	--	----------------------	--	----	--

Outcome Nbr. 2: Organismo ejecutor fortalecido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño	sistemas	0.00	2014	P							1.00				1.00
					P(a)										1.00	1.00
					A											

Details

Means of verification: Cumplimiento de los niveles de tratamiento de las aguas residuales en la Planta de Tratamiento y de disposición final en el Rio de la Plata

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
-------------------	--	----	--	----------------------	--	----	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa – zona oeste

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Estaciones de bombeo construidas	numero	P	2	7	1,480,000	7,800,000
			P(a)	2	12	587,000	7,231,000
			A	0	4	138,000	4,762,000
1.2	Interceptor costero construido	metros	P		2,165		2,000,000
			P(a)		2,264		1,150,000
			A		2,264		1,150,000
1.3	Redes de Saneamiento construidas	metros	P	7,482	97,515	4,070,000	41,500,000
			P(a)	10,292	138,671	1,757,000	37,433,000
			A	7,766	86,734	1,845,000	25,935,000
1.4	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	numero	P		0		0
			P(a)	900	7,850	700,000	3,404,000
			A	600	5,108	162,000	968,000

Component Nbr. 2 Obras de agua potable en Ciudad de la Costa-zona oeste y central

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	m	P	5,238	122,261	261,000	10,200,000
			P(a)	1,000	168,695	939,000	18,161,000
			A	0	145,095	0	13,716,000

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	personas	P		40	0	200,000
			P(a)	8	19	0	0
			A	8	19		0
3.2	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	reportes	P		0		0
			P(a)		1	68,000	135,000
			A		1	68,000	135,000

Other Cost

	Gastos de unidad ejecutora y Administrativos	P			3,500,000	13,300,000
		P(a)			435,000	2,300,000
		A			169,000	980,000
	Imprevistos	P				0
		P(a)				5,187
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			9,311,000	75,000,000
		P(a)			4,486,000	69,819,187
		A			2,382,000	47,646,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	El indicador se ha ajustado e incluye los valores de las nuevas zonas de intervencion del programa definidas en el contrato modificadorio respectivo	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	FBACHINO	10/07/2020
	Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa	El indicador se ha ajustado e incluye los valores de las nuevas zonas de intervencion del programa definidas en el contrato modificadorio respectivo	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	FBACHINO	10/07/2020
Output	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	Los ajustes reponden a la replanificación llevada a cabo por la Unidad Ejecutora	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/07/2020
	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	La Unidad Ejecutora informó que hubo un error en el reporte 2019 en cuanto a los costos ejecutados para este producto. En realidad fueron USD 67.000 en 2019 y USD 68.000 en 2020.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	10/07/2020
	Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	Los ajustes reponden a la replanificación llevada a cabo por la Unidad Ejecutora	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/07/2020
	Redes de Saneamiento construidas	Los ajustes reponden a la replanificación llevada a cabo por la Unidad Ejecutora	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/07/2020
	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	Los ajustes reponden a la replanificación llevada a cabo por la Unidad Ejecutora	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/07/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
