

PMR Public Report

Operation Number	BO-L1073	Chief of Operations Validation Date	04/19/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/19/21
Last Update	04/15/21	Country Representative Validation Date	05/13/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Comprehensive Solid Waste Management Implementation in Bolivia	Loan Number	2880/BL-BO
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SOLID WASTE
Team Leader	MECERREYES ESPINOSA, CRISTINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>Es parcialmente Satisfactorio debido a que se ha demorado considerablemente el inicio del proyecto en El Alto por la no definición del sitio por parte del GAM, que generó conflictos entre comunidades por un lado la comunidad de Bajo Milluni donde se habia definido inicialmente el emplazamiento del proyecto con la comunidad de Villa Ingenio que solicitaba el proyecto pero una parte de sus comunarios no estaban de acuerdo con el proyecto. Actualmente con el nuevo personal del GAM se está avanzando en la definición del sitio, seleccionando el lugar que inicialmente se habia definido para emplazar el proyecto que es propiedad del GAM y cuenta con el acuerdo de la comunidad de Bajo Milluni y con esto proceder a la actualización del PGAS.</p> <p>Se ha cumplido con las actividades programadas en el plan de acción para los proyectos de Riberalta y Potosí.</p> <p>Se ha realizado un adecuado cierre técnico del botadero en Riberalta eliminando potenciales impactos para la población.</p> <p>Se ha cumplido con la implementación delel PGAS y Plan de Inclusión Social (PISO) en Riberalta y en como en Potosí se esta iniciando el PISO.</p> <p>Se han cumplido los acuerdos sociales suscritos en la anterior misión de supervision.</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1073	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	13,781,177.29	68.91%	6,218,822.71
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	13,781,177.29	68.91%	6,218,822.71

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

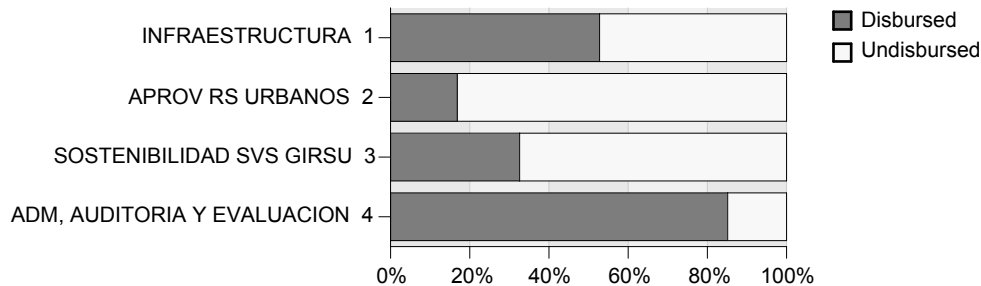

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incremento en la cobertura de acceso a disposición adecuada de RSU

Observation: Medios de verificación: Registro de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios de los proyectos

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios a nivel nacional	Ton/día	1,748.60	2010	-	P	2,464.70
						A	1,748.60

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: En el Diagnóstico Nacional de la GIRS aparece la cifra del 45% de RSU dispuestos en rellenos sanitarios; sin embargo, la disposición final de El Alto no puede calificarse como tal, por lo que la cantidad de RSU dispuestos en RS es realmente del 37% a nivel nacional

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
Objective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios a nivel nacional	%	37.00	2010	-	P	
						A	37.00

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: En el Diagnóstico Nacional de la GIRS aparece la cifra del 45% de RSU dispuestos en rellenos sanitarios; sin embargo, sin considerarse la disposición final de El Alto la cantidad de RSU dispuestos en RS es de 37% a nivel nacional

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
Objective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Cobertura del Servicio de Recolección Aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.1	Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en Riberalta	%	70.00	2012	P	84.00	84.00	86.00	88.00	90.00		90.00
					A	75.00	70.00	77.00	77.00	79.00	79.00	83.00

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.2	Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en Potosí	%	65.00	2012	P	75.00	75.00	77.00	79.00	80.00		80.00
					A	80.00	80.00	82.00	82.00	90.00	95.00	90.00

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.2	Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en El Alto	%	80.00	2012	P	85.00	89.00	90.00	90.00			
					A	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	90.00

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.3	Hogares con acceso al servicio de recolección en Riberalta	Hogares	15,303.00	2012	P	15,303.00	15,303.00	18,395.00	18,931.00	19,483.00		19,483.00
					A	15,303.00	15,303.00	16,988.00	16,988.00	17,715.00	19,744.00	19,744.00

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.4	Hogares con acceso al servicio de recolección en Potosí	Hogares	31,962.00	2012	P	23,493.00	23,493.00	26,095.00	26,361.00	26,629.00		26,629.00
					A	31,962.00	31,962.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	59,350.00	56,837.00

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.5	Hogares con acceso al servicio de recolección en El Alto	Hogares	169,768.00	2012	P	170,778.00	170,778.00	209,503.00	222,916.00	234,462.00		234,462.00
					A	171,719.00	171,719.00	182,288.00	182,288.00	182,288.00	0.00	208,329.00

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Cobertura del Servicio de barrido aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
2.1	Cobertura del servicio de barrido en Riberalta	%	41.00	2012	P	41.00	41.00	48.00	55.00	57.00		57.00
					A	41.00	41.00	48.00	41.00	41.00	63.00	70.00

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
2.2	Cobertura del servicio de barrido en Potosi	%	55.00	2012	P	61.00	61.00	65.00	70.00	75.00		75.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.2	Cobertura del servicio de barrido en Potosí	%	55.00	2012	A	61.00	55.00	65.00	55.00	55.00	62.00	50.00	
-----	---	---	-------	------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
2.2	Cobertura del servicio de barrido en El ALto	%	70.00	2012	P	70.00	70.00	73.00	76.00	80.00		80.00
				A	70.00	70.00	73.00	70.00	70.00	0.00	70.00	

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: La cobertura del subservicio de barrido se refiere a la limpieza manual o mecanizada de las vías con algún tipo de cobertura regular (asfalto, pavimento rígido, enlosado, otros)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 3: Disposición de RSU en relleno sanitario aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.1	Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitario en Riberalta	Ton/día	0.00	2012	P	0.00	0.00	46.26	46.26	47.88		47.88
				A		0.00	0.00	0.00	53.00	40.40	46.05	

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.2	Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitario en Potosí	Ton/día	0.00	2012	P	0.00	0.00	105.60	105.60	107.20		107.20
				A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.2	Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitarios en El Alto	Ton/día	2012	P	0.00	0.00	0.00	420.00	561.00			561.00
				A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.3	Hogares cuyos Residuos Sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios en Riberalta	Households (#)	2012	P	0.00	0.00	0.00	18,931.00	19,483.00			19,483.00
				A		0.00	0.00	0.00	17,715.00	19,744.00	19,744.00	

Details

Means of verification: Reportes de las EMAs

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.4	Hogares con Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios en Potosí	Households (#)	2012	P	0.00	0.00	0.00	26,361.00	26,669.00			26,669.00
				A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.5	Hogares con Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios en El Alto	Households (#)	2012	P	0.00	0.00	0.00	222,916.00	234,462.00			234,462.00
				A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Reportes EMA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 4: Aprovechamiento de Residuos Sólidos aumentada

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
4.1	Residuos Sólidos para aprovechamiento en Riberalta	Ton/día	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	3.80	4.70			4.70
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.12	

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
4.2	Residuos Sólidos para aprovechamiento en Potosí	Ton/día	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	6.00	12.30			12.30
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	1.03	

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
4.2	Residuos Sólidos para aprovechamiento en El Alto	Ton/día	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45			54.45
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 4: Inclusión/Formalización de segregadores

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
4.1	Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en Riberalta	Segregadores	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00			11.00
					A		0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	14.00	

Details

Means of verification: Informes Semestrales aprobados por la DGGIRS

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Se estima que el 60% de los segregadores capacitados continuará desempeñándose laboralmente en alguna de las alternativas de inclusión propuestas.

Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
4.2	Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en Potosí	Segregadores	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00			6.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
Details													

Means of verification: Informes Semestrales aprobados por la DGGIRS

Observations: Se estima que el 60% de los segregadores capacitados continuará desempeñándose laboralmente en alguna de las alternativas de inclusión propuestas.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
4.2	Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en El Alto	Segregadores	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00			24.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Details													

Means of verification: Informes Semestrales aprobados por la DGGIRS

Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						
-------------------	--	----	--	--	----------------------	--	----	--	--	--	--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 5: Eficiencia comercial aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
5.1	Ingresos percibidos por servicios/ Costos operativos en Riberalta	%	48.00	2012	P	48.00	48.00	48.00	49.00	50.00			50.00
					A	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	31.82	29.90	
Details													

Means of verification: Registros contables de EMAS beneficiarias

Observations: El porcentaje de incremento estimado esta en funcion únicamente a los costos operativos en los servicios prestados el año de linea base.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
5.2	Ingresos percibidos por servicios/ Costos operativos en Potosí	%	55.00	2012	P	55.00	55.00	55.00	56.00	57.00			57.00
					A	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	90.00	90.83	
Details													

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: El porcentaje de incremento estimado esta en funcion únicamente a los costos operativos en los servicios prestados el año de linea base.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
5.2	Ingresos percibidos por servicios/ Costos operativos en El Alto	%	23.67	2012	P	35.00	35.00	35.00	36.00	37.00			37.00
					A	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	0.00	10.00	

Details

Means of verification: Registros contables de EMA beneficiarias

Observations: El porcentaje de incremento estimado esta en funcion únicamente a los costos operativos en los servicios prestados el año de linea base.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Botaderos actualmente en operación cerrados	Numero de Botaderos	P		2		2,300,000
			P(a)	0	2	40,557.65	1,565,290.3
			A	0	1	1,278.06	1,526,010.71
1.2	Rellenos sanitarios construidos	Relleno sanitario	P		3		7,563,099
			P(a)	0	2	700,000	7,224,964.15
			A	0	1	970,196.91	5,984,833.29
1.3	Lote de maquinaria pesada para la operación de rellenos sanitarios adquiridos	Lote de maquinaria	P		2		2,500,000
			P(a)	0	4	80,000	1,188,708.73
			A	0	3	0	788,708.73
1.4	Lotes de vehículos para recolección y barrido adquiridos	Lote de vehículos	P		1		300,000
			P(a)	0	2	0	894,139.87
			A	0	1	0	224,139.87
1.5	Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos construidas	Estaciones	P		3		3,610,000
			P(a)	1	3	306,131.41	3,708,035.93
			A	0	1	143,732.88	781,319.06
1.6	Estudios y diseños elaborados	Estudios	P		9		404,566
			P(a)	2	9	40,000	357,066.22
			A	2	8	19,318.65	257,243.62

Component Nbr. 2 Componente II: Aprovechamiento de RSU e Inclusión y formalización de segregadores

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos equipadas	Plantas	P		3		1,130,823
			P(a)	0	3	293,654.09	3,195,822.22
			A	0	1	79,072.76	269,116.79
2.2	Segregadores capacitados	Personas	P		67		60,000
			P(a)	0	106	0	39,158.71
			A	0	0	0	25,158.71
2.3	Planes de inclusión y formalización de segregadores implementados	Planes	P		3		150,000
			P(a)	0	3	0	272,086.9
			A	0	1	0	156,792.63

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Desarrollo de Instrumentos para la sostenibilidad de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Estudios de Fortalecimiento Institucional elaborados	Estudios	P		3		110,000
			P(a)	1	9	10,000	263,224.68
			A	1	8	9,638.78	123,300.03
3.2	Sistema de Planificación, Seguimiento e Información Sectorial de Residuos Sólidos desarrollado	Sistema	P		1		110,000
			P(a)	0	1	0	38,680.93
			A	0	1	0	38,680.93
3.3	Sistema de Planificación, Gestión e Información Gerencial de Gestión Integral de Residuos Sólidos para entidades municipales desarrollado	Sistema	P		1		123,000
			P(a)	0	1	0	51,795.19
			A	0	1	0	8,795.19
3.4	Estudios de generación y caracterización de Residuos Sólidos elaborados	Estudios	P		3		130,126
			P(a)	0	3	0	133,428.24
			A	0	3	0	133,428.24
3.5	Plan de Comunicación y Concientización Ciudadana sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado	Plan	P		1		80,000
			P(a)	0	4	25,000	220,520.86
			A	1	3	0	70,520.86
3.6	Plan de operación y mantenimiento del PGIRSU Riberalta implementado	Plan	P		1		219,000
			P(a)	0	1	0	18,099.13
			A	0	1	0	18,099.13

Component Nbr. 4 Administración y Gestión del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración y Gestión	P				1,209,386
		P(a)			201,319.64	1,209,386
		A			51,537.9	1,059,604.2

Total Cost

	Total Cost	P				20,000,000
		P(a)			1,696,662.79	20,380,408.06
		A			1,274,775.94	11,465,751.99

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Project Design
Project Management Capacity
