

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1260	Chief of Operations Validation Date	04/12/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/21/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/28/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	FIRST OPERATION OF THE URBAN INTEGRATION AND SOCIAL AND EDUCATIONAL INCLUSION PROGRAM IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES	Loan Number	4303/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	VERA BENITEZ, LUIS FELIPE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La unidad ejecutora posee los profesionales clave para llevar adelante la gestión socioambiental del programa. Deben mejorar el detalle de las quejas que reportan. Las demoliciones y reasentamientos pendientes a cargo de banco Mundial podría llevar un PS por las normativas locales.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1260	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	88,085,000.78	88.09%	11,914,999.22
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	88,085,000.78	88.09%	11,914,999.22

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

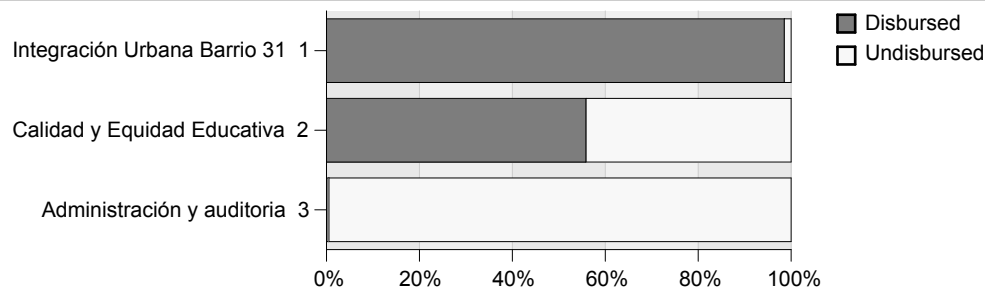

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Componente 1 Integración urbana del Barrio 31

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Hogares con hacinamiento crítico (más de 3 miembros por habitación exclusiva para dormir)	hogares	0.00	2018	2023	P	
						A	

Details

Means of verification: Datos de encuesta de actividad económica en B31

Observations: Implementado por SECISYU y Centro de Investigación de Políticas Urbanas y Vivienda (CIPUV) Universidad Torcuato di Tella

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
Objective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa en la CABA

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Deserción escolar promedio en Secundarias estatales	%	2.50	2017	2023	P	1.70
						A	

Details

Means of verification: Datos del Relevamiento Anual 2020

Observations: Implementado por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Puntaje promedio en Matemática en 7° grado de Primarias estatales	puntaje promedio	480.70	2018	2023	P	510.00
						A	

Details

Means of verification: Resultados de la Prueba FEPBA.

Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Puntaje promedio en Prácticas del Lenguaje en 7° grado de Primarias estatales	puntaje promedio	458.40	2018	2023	P	500.00
						A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Details							
Means of verification: Resultados de la Prueba FEPBA.							
Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Puntaje promedio en Lengua y Literatura en 3° año de secundarias estatales	puntaje promedio	464.60	2018	2023	P	500.00
						A	
Details							
Means of verification: Resultados de la Prueba TESBA.							
Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.4	Puntaje promedio en Matemática en 3° año de secundaria	puntaje promedio	484.00	2018	2023	P	510.00
						A	
Details							
Means of verification: Resultados de la Prueba TESBA.							
Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is		No					

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Componente 1 Integración urbana de B31. Incremento en el acceso a servicios educativos de calidad, infraestructura urbana de calidad y resiliente al cambio climático. La disminución de problemas de salud relacionados a enfermedades infectocontagiosas entre los residentes de viviendas mejoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Alumnos matriculados en la escuela de nivel inicial financiada por el programa en condiciones de operar	# of students	0.00	2017	P	158.00	158.00
					A		

Details

Means of verification: Registros escuela inicial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Alumnos matriculados en la escuela de nivel primario financiada por el programa en condiciones de operar	# of students	0.00	2017	P	185.00	185.00
					A		

Details

Means of verification: Registros escuela primaria

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Tiempo promedio de traslado diario a escuelas de alumnos	Numero de minutos	40.00	2017	P	20.00	20.00
					A		

Details

Means of verification: SECISYU. Encuesta a muestra significativa de alumnos del Polo Educativo

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Reducción en el consumo de energía	%	0.00	2017	P	28.00	28.00
					A		

Details

Means of verification: SECISYU/ Certificado provisto por el programa Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2022	EOP 2022
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year			
0.5	Reducción en el consumo de agua	%	0.00	2017	P	47.00	47.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.6	Reducción en el consumo de energía incorporada en los materiales	%	0.00	2017	P	31.00	31.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.7	Reducción en emisiones de CO2 durante el uso del edificio	TCO2/año	0.00	2017	P	216.00	216.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.8	Hogares del B31 con acceso formal a agua potable	porcentaje	0.00	2017	P	100.00	100.00
					A		
Details							
Means of verification: Relevamiento SECISYU							
Observations: El programa financia la construcción de un acueducto que será operado por la empresa proveedora de agua ysaneamiento (AySA) y conecta el servicio formal de agua de CABA a una red de distribución interna en el B31 que se ejecuta con fondos BIRF.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.12	Comerciantes y feriantes inscriptos al	%	8.33	2017	P	75.00	75.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

0.12	monotributo/monotributo social	%	8.33	2017	A		
Details							
Means of verification: Encuesta actividad económica SECISYU							
Observations: Desagregar por género del comerciante. Línea de base y meta consideran todos los comercios del barrio.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa. mejora en el acceso a nuevos equipamientos tecnológicos, mobiliario y laboratorios de informática en las escuelas de la Ciudad de Buenos aires y en el acceso a nuevas plataformas digitales de aprendizaje y evaluación. Mejora en el acceso a sistemas informatizados de gestión de datos para la planificación educativa.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.1	Estudiantes que utilizan el nuevo equipamiento entregado por el Plan Sarmiento Fase II: conectividad y nuevo equipamiento/notebooks	# of students	82,000.00	2019	P	168,000.00	168,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte Plan Sarmiento							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.2	Docentes capacitados en el uso de la plataforma de aprendizaje de matemática	docentes	1,500.00	2019	P	4,000.00	4,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes anuales de la plataforma de aprendizaje.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	Alumnos de escuelas de Primaria y Secundaria que utilizan en los espacios digitales	alumnos	9,000.00	2019	P	24,000.00	24,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes anuales de la Dirección de Tecnologías ME.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.4	Escuelas de gestión estatal y unidades centrales	Escuelas	500.00	2019	P	800.00	800.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.4	del ME que operan la plataforma de gestión educativa integral	Escuelas	500.00	2019	A		
Details							
Means of verification: Informes anuales de acceso del sistema de gestión.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.5	Estudiantes que realizan las pruebas FEPBA y TESBA realizadas por estudiantes a través de la plataforma de evaluación	niños	0.00	2018	P	15,000.00	15,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.6	Escuelas secundarias estatales en las que sus directivos y docentes reciben informes con datos de indicadores educativos a través de la Plataforma Mi Escuela	Escuela	0.00	2018	P	607.00	607.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.7	Estudiantes de 2° año de secundaria que realizan la evaluación de habilidades socioemocionales a través de la plataforma de evaluación	Estudiantes	0.00	2017	P	2,500.00	2,500.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de la anuales de la plataforma de evaluación.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.8	Profesionales técnicos certificados en gestión e innovación educativa.	profesionales	0.00	2017	P	480.00	480.00
					A		
Details							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Informe confirmando asistencia de profesionales y numero de certificados entregadas.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Integración Urbana del Barrio 31

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Subcomponente 1.1. Polo Educativo. Nuevo edificio Ministerio de Educación de Gobierno de la CABA construido (incluye escuelas de nivel inicial, primario y un centro de terminalidad educativa)	Edificio	P	0	1	0	43,896,324
			P(a)	0	1	8,160,000	53,219,162
			A	0	1	7,302,170	52,361,332
1.2	Subcomponente 1.2. Proyecto 1 Acueducto. Nuevo acueducto construido	metro lineal	P	0	2,893	0	5,171,334
			P(a)	0	2,893	1,486,426.45	6,405,223
			A	0	2,893	1,486,426	6,400,871
1.3	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Espacio público por habitante en el B31	m2/hab	P	0	1.34	0	5,475,286
			P(a)	0	1.34	2,109,161	5,459,371
			A	0	1.34	2,411,521	5,459,371
1.4	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Nuevas calles arborizadas	metros lineales	P	0	3,040	4,000,000	4,000,000
			P(a)	882	3,040	2,870,000	1,130,000
			A	471	2,629	1,130,000	1,130,000
1.5	Subcomponente 1.3. Viviendas mejoradas por algún abordaje del PMV (iniciadas)	número de viviendas	P	33	1,022	10,600,000	24,600,000
			P(a)	897	475	13,724,991.17	22,169,806
			A	135	260	14,340,398	21,637,180
1.6	Subcomponente 1.4. Estudios de consultoría y/o de supervisión para dar soporte a la intervención realizada	número de planes y estudios	P	1	2	750,000	1,500,000
			P(a)	1	8	567,825	855,206
			A	7	7	659,844	844,616

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Calidad y Equidad Educativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Subcomponente 2.1. Netbooks y tablets del Plan Sarmiento Fase II entregados a estudiantes y docentes.	Netbooks y tablets	P	20,000	40,000	0	17,475,750
			P(a)	40,000	54,000	8,567,044	12,835,405
			A	20,500	20,500	8,828,849	8,828,849
2.2	Subcomponente 2.1. Aulas equipadas con nuevo mobiliario.	Aulas	P	0	60	941,421	2,700,000
			P(a)	0	715	677,427	5,859,077
			A	122	430	836,829	2,595,408
2.3	Subcomponente 2.1. Escuelas equipadas con aulas y/o espacios digitales equipados y en funcionamiento.	Escuelas	P	0	60	2,841,100	5,524,250
			P(a)	60	60	500,000	10,164,595
			A	60	60	4,183,447	4,183,447
2.4	Subcomponente 2.1. Plataforma de gestión educativa implementada en el ME.	Plataforma	P		1	0	2,844,810
			P(a)		1	0	2,844,810
			A		1	0	2,844,810
2.5	Subcomponente 2.1. Plataforma de aprendizaje de matemáticas diseñada y disponible en el sistema.	Plataforma	P	0	1	770,000	3,500,000
			P(a)	0	0	770,000	2,730,000
			A	0	0	0	0
2.6	Subcomponente 2.2. Plataformas de evaluación digital y formativa FEPSA y TESBA, y de evaluación socioemocionales diseñadas y disponibles en línea.	Plataforma	P	1	2	456,602	1,200,000
			P(a)	0	1	393,294	1,057,064
			A	0	0	192,878	383,310
2.7	Subcomponente 2.3. Cursos de capacitación diseñados e implementados.	cursos	P	2	4	300,000	600,000
			P(a)	2	4	300,000	300,000
			A	2	4	0	4,882
2.8	Subcomponente 2.3. Plan de implementación del Centro de Formación Docente en Nuevas Tecnologías finalizado.	Plan	P	1	1	400,000	500,000
			P(a)	1	1	42,030	500,000
			A	1	1	40,824	148,794

Other Cost

	Administración y monitoreo	P			1,240,000	4,000,000
		P(a)			2,822,338	222,283
		A			44,621	122,283

Total Cost

	Total Cost	P			22,299,123	122,987,754
		P(a)			42,990,536.62	125,752,002
		A			41,457,807	106,945,153

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Subcomponente 1.2. Proyecto 1 Acueducto. Nuevo acueducto construido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Espacio público por habitante en el B31	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Nuevas calles arborizadas	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 1.3. Viviendas mejoradas por algún abordaje del PMV (iniciadas)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 1.4. Estudios de consultoría y/o de supervisión para dar soporte a la intervención realizada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARES	03/04/2021
	Subcomponente 2.1. Aulas equipadas con nuevo mobiliario.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
			Modify Output name	MARES	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARES	03/29/2021
			Modify Unit of Measure	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 2.1. Escuelas equipadas con aulas y/o espacios digitales equipados y en funcionamiento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 2.1. Escuelas equipadas con nuevo mobiliario.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 2.1. Netbooks y tablets del Plan Sarmiento Fase II entregados a estudiantes y docentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARES	03/29/2021
	Subcomponente 2.2. Plataformas de evaluación digital y formativa FEPSA y TESBA, y de evaluación socioemocionales diseñadas y disponibles en línea.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	03/29/2021
Specific Development Objective	Alumnos matriculados en la escuela de nivel inicial financiada por el programa en condiciones de operar	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	MARES	03/29/2021
	Alumnos matriculados en la escuela de nivel primario financiada por el programa en condiciones de operar	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	MARES	03/29/2021
	Estudiantes que utilizan el nuevo equipamiento entregado por el Plan Sarmiento Fase II: conectividad y nuevo equipamiento/notebooks	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	MARES	03/29/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
