

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1258	Chief of Operations Validation Date	04/13/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/15/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/28/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Services Development Program – Belgrano Plan	Loan Number	4312/OC-AR
Executing Agency	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras en ejecución no cuentan con un Programa de información y consulta acordado ni que tenga la NO del Banco. Tampoco cuentan con un Programa de similares características para la gestión de quejas y reclamos. Los recintos de residuos peligrosos de Río IV y Arroyito no cumplen con los requerimientos del PGAS y MGAS. No se han presentado las medidas de reforestación compensatoria correspondientes a las obras en ejecución.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1258	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	5,013,130	2.51%	194,986,870
Aggregated	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	5,013,130	2.51%	194,986,870

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

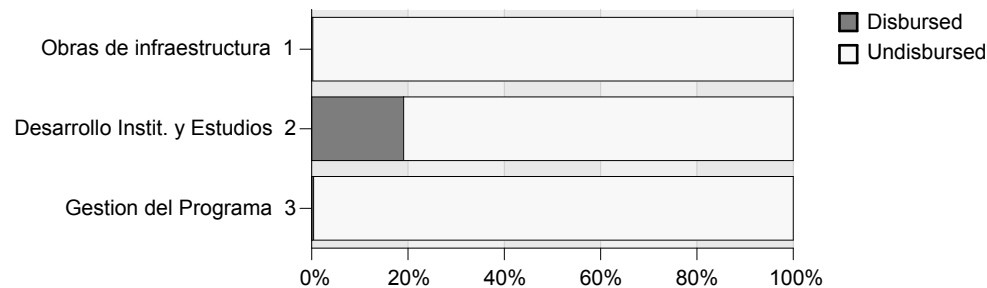

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora de la Salud y el Bienestar de la Población

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	3,415.00	2017	2023	P	2,732.00
						A	3,415.00

Details

Means of verification: Boletín integrado de vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

Observations: Ninguna

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			
	No		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 1: Cobertura del servicio de agua potable ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Hogares con nuevo acceso a sistemas de agua potable por red en la región del Plan Belgrano.	# of households	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.1	Cobertura de agua potable en la región del Plan Belgrano.	%	92.40	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	92.47
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 2: Cobertura del servicio de saneamiento ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.0	Hogares con acceso a nuevas redes cloacales en la región del Plan Belgrano	# of households	0.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	8,750.00	14,500.00	29,000.00	29,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto;

Observations: se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la región del Plan Belgrano	Households (#)	100,000.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	200,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.2	Cobertura de saneamiento en la región del Plan Belgrano.	%	46.70	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14	0.00	48.14
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.0	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Aguas de Formosa	%	87.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.1	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Agua Potable de Jujuy	%	92.70	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	99.80
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.2	Cobertura de micromedición en la región del Plan Belgrano (Hogares con micromedidores de agua instalados y en funcionamiento / Total de hogares con servicio de agua potable por red)	%	41.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	0.00	41.30
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Obras de infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Sistemas de Agua Potable construidos	sistema	P	0	1	4,103,654	15,000,000
			P(a)	0	1	0	15,317,490
			A	0	0	0	0
1.2	Sistemas de Saneamiento construidos	sistema	P	0	5	94,115,555	232,000,000
			P(a)	0	5	425,000	230,235,771.86
			A	0	0	492,367.21	492,367.21

Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo institucional y estudios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	No. de Planes	P	0	4		5,325,000
			P(a)	1	3	2,566,685	6,827,146.43
			A	1	2	2,990,885.93	5,655,899.93
2.2	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de micromedidores	P	12,813	25,000	5,125,000	9,675,000
			P(a)	0	25,000	0	9,675,000
			A	0	0	0	0
2.3	Macromedidores instalados instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de macromedidores	P	46	160	1,437,500	5,000,000
			P(a)	0	160	0	5,000,003
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración del Programa	P			300,000	1,500,000
		P(a)			300,000	1,444,588.71
		A			244,588.71	348,889.71
	Monitoreo, Evaluación y Auditorías	P			450,000	1,500,000
		P(a)			0	1,500,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			105,531,709	270,000,000
		P(a)			3,291,685	270,000,000
		A			3,727,841.85	6,497,156.85

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SOFIAG	03/25/2021
	Sistemas de Saneamiento construidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SOFIAG	03/25/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination
