

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1372	Chief of Operations Validation Date	04/05/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/06/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/06/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	Loan Number	3129/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DO PARANA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O Executor segue com dificuldades de engajamento das equipes sociais locais que implementam e acompanham as ações de reassentamento e pós reassentamento dos projetos em curso, o que representam um total de 465 famílias, especificamente as equipes dos CRAS municipais que priorizam as demandas ligadas à pandemia de covid-19 nos municípios. Da mesma forma, permanece a dificuldade de monitorar a implantação dos requisitos ambientais e sociais pelas empresas executoras, gerando o não cumprimento de medidas de boas práticas ambientais nas frentes de obras, tais como: gestão de resíduos, correção de processos erosivos e isolamento de áreas em obras. A implementação de medidas corretivas aos processos de erosões de solo que requerem novas soluções construtivas, exigem que o Executor defina e implemente um Plano de Ação bem alinhado entre equipes de obras e sociais para a conclusão a contento das obras e das etapas do reassentamento. Considerando a permanência das dificuldades já apontadas em outras missões - dificuldade de monitoramento dos aspectos ambientais e sociais, dificuldade de engajamento com as equipes municipais – e considerando-se a situação dos processos erosivos de solo em curso que ainda requerem solução, classifica-se a operação como Parcialmente Insatisfatória.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	43,351,724.54	72.25%	16,648,275.46
Aggregated	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	43,351,724.54	72.25%	16,648,275.46

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

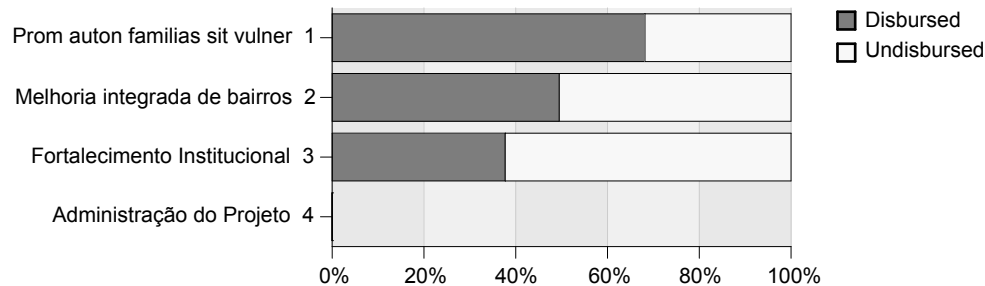

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Condição de vida das famílias mediante ações do Governo melhoradas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados	%	30.00	2016	2022	P	60.00
						A	

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria	%	53.00	2016	2022	P	68.90
						A	

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%	0.00	2014	P			60.00
					A		0.00	
Details								
Means of verification: Sistema de informação do Programa								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%	0.00	2014	P			60.00
					A		0.00	
Details								
Means of verification: Sistema de informação do Programa								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%	0.00	2014	P			50.00
					A		0.00	
Details								
Means of verification: Sistema de informação do Programa								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	P			100.00
					A		0.00	
Details								
Means of verification: Relatório semestral do Programa								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.1	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a água potável no domicílio	%	50.00	2014	P			100.00
					A		0.00	
Details								
Means of verification: Relatório semestral do Programa								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0.00	2014	P			90.00
					A		0.00	
Details								
Means of verification: Testes de conhecimento								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiária elaborados	# of beneficiaries	P		22,000		14,410,366
			P(a)	1,273	23,171	4,441,468.17	15,930,181.48
			A	1,644	22,371	1,958,720.13	14,897,987.15
1.2	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Municípios	P		130		8,774,200
			P(a)	65	130	2,359,496.19	10,787,522.97
			A	156		1,023,618.17	10,787,522.97
1.3	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P		53		10,781,000
			P(a)	53	53	1,000,000	10,644,058.29
			A	122	406	1,535,262.21	9,644,058.29
1.4	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Famílias	P		40,000		10,000,000
			P(a)	23,000	40,000	1,000,000	15,047,895.21
			A	26,645		654,050.99	14,397,895.21
1.5	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P		3,480		2,522,478
			P(a)	0	3,577	0	699,465.6
			A	0	2,577	0	546,465.6
1.6	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P		5,600		7,256,760
			P(a)	0	5,600	80,000	4,968,745.52
			A	0	5,518	335,513.12	4,168,547.99
1.7	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	Famílias	P		560		2,522,154
			P(a)	20	560	16,000	448,000
			A	0	0	0	0
1.8	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	Famílias	P		0		0
			P(a)	150,000	150,000	4,500,000	4,500,000
			A	0	0	0	0
1.9	Incentivos fundo a fundo emergencial aos municípios (por COVID-19)	Municípios	P		0		0
			P(a)	241	242	1,976,381.91	1,985,175.83
			A	242	242	1,985,175.83	1,985,175.83
1.10	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas em 243 municípios (Por COVID 19)	capacitações	P		0		0
			P(a)		3,500		630,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P		594		17,940,000
			P(a)	146	915	2,882,565.3	14,890,331.09
			A	471	545	3,738,466.3	8,245,200.84
2.2	Lotes regularizados	Lotes	P		328		6,560,000
			P(a)	120	535	4,706,180.5	15,119,321.35
			A	53	53	5,918,861.9	7,814,191.1
2.3	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P		22		6,361,544
			P(a)	3	22	326,262.37	5,181,559.98
			A	2	12	265,928.43	2,931,559.98
2.4	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P		8		3,238,498
			P(a)	1	8	184,625.21	1,908,787.58
			A	0	5	49,083.61	1,402,787.58

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Investigações e estudos realizados	Estudos	P		7		1,620,000
			P(a)	0	7	0	327,761.84
			A	0	5	0	271,861.84
3.2	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P		12,300		2,113,000
			P(a)	500	12,300	350,000	1,886,730.46
			A	598	6,068	535,164.46	999,000.16
3.3	Módulos do Sistema de informações Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P		6		900,000
			P(a)	3	6	234,403.13	418,507.7
			A	2	5	146,755.84	312,352.75

Component Nbr. 4 Componente IV: Administração do Projeto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

Administração		P				4,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
Contingencia		P				1,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

Total Cost		P				100,000,000
		P(a)			24,057,382.78	105,374,044.9
		A			18,146,600.99	78,404,607.29

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	CREAS construídos e em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/22/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	03/22/2021
	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/22/2021
	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/24/2021
	Incentivos fundo a fundo emergencial aos municípios (por COVID-19)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/22/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	03/22/2021
	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/22/2021
	Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/24/2021
	Participantes do Programa Capacitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/24/2021
	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas em 243 municípios (Por COVID 19)	Create Output	N/A	KATIAS	03/22/2021
	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiária elaborados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	03/29/2021
	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	03/22/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions
