

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1402	Chief of Operations Validation Date	04/05/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/06/21
Last Update	03/25/21	Country Representative Validation Date	04/06/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Santo Andre Sustainable Urban Mobility Program	Loan Number	3708/OC-BR
Executing Agency	SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sector/Subsector	TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Team Leader	FIGUEIREDO DE CASTRO M, ANA BEATRIZ	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1402	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000	25,000,000	8,848,299.76	35.39%	16,151,700.24
Aggregated	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000	25,000,000	8,848,299.76	35.39%	16,151,700.24

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

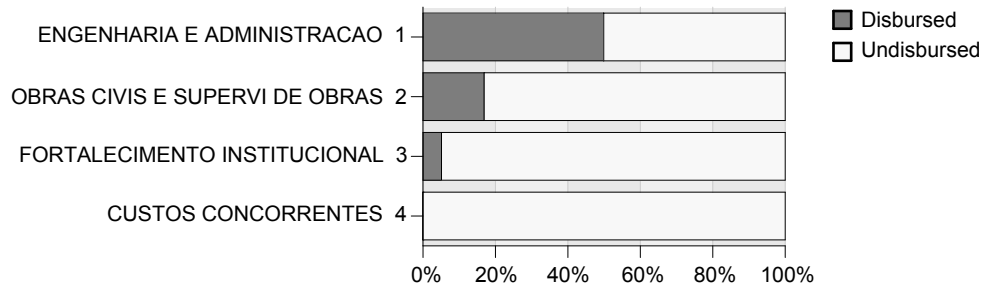

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Severidade de Acidentes de Trânsito no corredor Santos Dumont – ISA reduzida

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Índice de Severidade de Acidentes de Trânsito no corredor Santos Dumont – ISA	UPS/milhões de veículos x km x ano	288.80	2013	2023	P	181.80
						A	

Details

Means of verification: Os dados de acidentes de trânsito (número de vítimas, gravidade, localização exata, características dos acidentados, entre outros dados) são regularmente monitorados pelo DET da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos (SMUOSP) do MSA.

Observations: O índice representa o número de acidentes relacionados a sua severidade, divididos pela longitude de cada corredor e o volume de tráfego em cada um. A redução do número e da severidade dos acidentes se dará através das ações do programa, assim como ações específicas de segurança viária. A meta de 181,8 é a média do Índice de Severidade de Acidentes de trânsito para todo o município.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Velocidade Média na Avenida Prestes Maia e na Avenida dos Estados no horário de pico da manhã aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Velocidade Média dos caminhões na Avenida Prestes Maia e na Avenida dos Estados no horário de pico da manhã	km/h	22.90	2015	P		26.30
					A		

Details

Means of verification: Pesquisa de velocidade dos caminhões realizada pelo Departamento de Engenharia de Trânsito (DET).

Observations: Representa o aumento da velocidade média de caminhões no trecho que conecta a região central de São Paulo a duas importantes rodovias de conexão regional (Rodoanel e Rodovia Anchieta).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Velocidade Média de todos os veículos na interseção da Avenida Prestes Maia com a Avenida dos Estados no horário de pico da manhã	km/h	19.00	2015	P		28.00
					A		

Details

Means of verification: Contagem de veículos classificados por tipo e simulações de tráfego realizada pelo DET.

Observations: Representa o aumento da velocidade média de veículos privados, caminhões e ônibus que passam por um viaduto de conexão norte-sul do Município (intercessão da Avenida Prestes Maia com a Avenida dos Estados).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Emissão de gases tóxicos (EGT) dos ônibus no corredor Santos Dumont reduzida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Emissão de CO dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	57.95	2015	P		35.80
					A		

Details

Means of verification: Simulações realizadas ao final do programa.

Observations: A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO₂), o principal gás do efeito estufa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.1	Emissão de HC dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	13.22	2015	P		5.99
					A		
Details							
Means of verification: Simulações realizadas ao final do programa.							
Observations: A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	Emissão de NOx dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	59.35	2015	P		40.34
					A		
Details							
Means of verification: Simulações realizadas ao final do programa.							
Observations: A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	Emissão de SOx dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	3.12	2015	P		1.52
					A		
Details							
Means of verification: Simulações realizadas ao final do programa.							
Observations: A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.4	Emissão de Partículas em suspensão dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	2.64	2015	P		1.75
					A		
Details							
Means of verification: Simulações realizadas ao final do programa.							
Observations: A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
1.5	Emissão de CO2 dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	4,317.00	2015	P	2,782.00
					A	
Details						
Means of verification: Simulações realizadas ao final do programa.						
Observations: A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Satisfação do usuário do sistema de transportes públicos municipais aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Índice de satisfação do usuário do sistema de transportes públicos municipais (ISU)	%	34.00	2011	P		50.00
					A		
Details							
Means of verification: Pesquisa de Satisfação do Sistema de Transporte Coletivo (STCO) realizada pela Santo André Transportes (SA-Trans).							
Observations: Representa a parte dos usuários que avalia o serviço de transportes provido pela SA-Trans como “excelente” e “bom”.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 3: Tempo médio de viagem em transporte público no horário de pico da manhã no corredor Santos Dumont reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.0	Tempo médio de viagem em transporte público no horário de pico da manhã no corredor Santos Dumont	minutos	15.70	2015	P		9.30
					A		
Details							
Means of verification: Dados do sistema da SA-Trans de monitoramento dos ônibus por GPS.							
Observations: Representa a diminuição do tempo de viagem de usuários de transporte público nos corredores do programa.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 4: Custo médio de operação dos serviços de transporte (COT) do município de Santo André reduzido

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Custo médio de operação dos serviços de transporte (COT) do município de Santo André	US\$ milhões/ano	143.10	2015	P		139.80
					A		
Details							
Means of verification: Estudos de tráfego e planilhas de reajuste tarifário das subconcessionárias da SA-Trans.							
Observations: Representa a redução do custo relacionada a uma maior velocidade operacional e maior racionalidade da programação da oferta (redução de: mão de obra, número de veículos, combustível e manutenção).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 5: Percentual de mulheres contratadas para conduzir ônibus aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
5.0	Percentual de mulheres contratadas para conduzir ônibus	%	3.10	2015	P		6.00
					A		
Details							
Means of verification: Informação gerada pelas empresas de transporte coletivo de ônibus.							
Observations: Representa o aumento do número de mulheres contratadas para conduzir ônibus.							
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No

Specific Development Objectives Nbr. 6: Número de pessoas com acesso a Transporte Público com Baixas Emissões de Carbono (PBEC) aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
6.0	Número de pessoas com acesso a Transporte Público com Baixas Emissões de Carbono (PBEC)	Pessoas	0.00	2015	P		311,860.00
					A		
Details							
Means of verification: Relatório semestral de progresso e visitas técnicas de inspeção do BID.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 2 - Obras civis e supervisão

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Corredores construídos - Grupo I e II	Km	P		0		0
			P(a)	0	3.7	0	7,328,572.52
			A	0	0	0	0
1.2	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo I	Viaduto	P		1	3,333,555.32	4,767,429.71
			P(a)	0	1	1,200,000	3,710,157.68
			A	0	1	2,631,880.7	2,928,927.23
1.3	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo II	Viaduto	P		1	738,310.81	18,457,770.29
			P(a)	0	1	0	29,874,581.51
			A	0	0	59,349.03	59,349.03
1.4	Plano Estratégico Municipal de Segurança Viária elaborado	Plano	P		1	5,882	625,000
			P(a)	0	1	0	478,502.13
			A	0	0	0	0
1.5	Supervisão de Obras contratada	Contrato	P		1	1,108,695.65	4,250,000
			P(a)	0	1	522,295	2,488,514.84
			A	0	1	518,145.28	632,426.93

Component Nbr. 2 Componente 3 - Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Técnicos da PSA envolvidos direta e indiretamente na execução do Programa capacitados	Técnico	P		25	88,636.36	325,000
			P(a)	0	25	14,000	272,829.73
			A	0	0	2,287.22	2,287.22
2.2	Mulheres para atuação na operação no sistema de transporte capacitadas	Mulher	P		50	17,391.3	50,000
			P(a)	0	50	14,000	91,550.86
			A	0	0	0	0
2.3	Contrato de apoio às unidades operacionais assinados	Contrato	P		4	1,786,483.25	2,700,000
			P(a)	1	4	324,194	1,281,817.94
			A	1	1	77,276.55	77,276.55
2.4	Equipamentos e software de informática adquiridos	Equipamento	P	20	20	68,181.82	250,000
			P(a)	0	20	0	148,588.53
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 4 - Compensação ambiental e expropriação

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Estudos e desenhos de engenharia	P			1,012,500	1,250,000
		P(a)			875,000	728,379.79
		A			573,010.84	573,010.84
	Contrato de empresa de gestão de apoio a execução do programa	P			713,112.12	3,625,000
		P(a)			539,019.8	2,445,209.03

RESULTS MATRIX**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

	Contrato de empresa de gestão de apoio a execução do programa	A			516,275.83	1,173,481.51
	Contrato de empresa para auditorias	P			28,061	125,000
		P(a)			0	88,558.39
		A			0	0
	Compensação ambiental e expropriação	P			202,380.95	875,000
		P(a)			0	875,000.01
		A			0	0
	Fortalecimento Institucional	P			66,477.27	300,000
		P(a)			3,750	187,737.04
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			11,336,590.93	50,000,200
		P(a)			3,492,258.8	50,000,000
		A			4,378,225.45	5,446,759.31

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Contrato de apoio às unidades operacionais assinados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/24/2021
	Corredores construídos - Grupo I e II	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HAROLD OV	03/24/2021
	Equipamentos e software de informática adquiridos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/15/2021
	Mulheres para atuação na operação no sistema de transporte capacitadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/15/2021
	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo I	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/15/2021
	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo II	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/24/2021
	Plano Estratégico Municipal de Segurança Viária elaborado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/24/2021
	Supervisão de Obras contratada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/24/2021
	Técnicos da PSA envolvidos direta e indiretamente na execução do Programa capacitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HAROLD OV	03/24/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity
