

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1041	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/21
<b>Last Update</b>	04/06/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	INAPA Water and Sanitation Investment Program	<b>Loan Number</b>	2430/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	PEREZ MONFORTE, SERGIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Dominican Republic
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	DR-X1005
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1041	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	31,299,210.86	89.43%	3,700,789.14
DR-X1005	0	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	30,099,327.4	86.00%	4,900,672.6
<b>Aggregated</b>	<b>35,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>61,398,538.26</b>	<b>87.71%</b>	<b>8,601,461.74</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

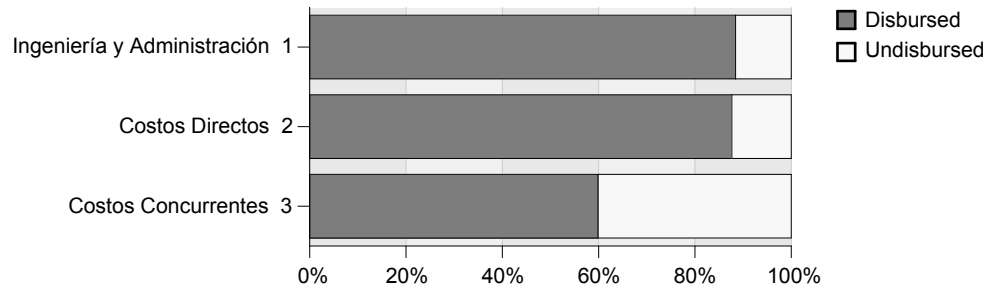

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

No information available for this section

# PMR Public Report

## RESULTS MATRIX

### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Cobertura de agua potable y saneamiento incrementada en siete provincias del país donde INAPA brinda servicio.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Cobertura de agua potable en las áreas atendidas por el INAPA.	Incremento puntos porcentuales	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.43	1.52	2.15						4.10
					A		0.00	0.00	0.15	0.03	0.47	0.44	0.00	0.00			1.09

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Cobertura de alcantarillado/saneamiento en las áreas atendidas por el INAPA, atribuible al programa.	incremento puntos porcentuales	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.22	0.80	1.61	0.00					2.63
					A			0.03	0.21	0.43	0.33	0.42	0.10	0.00			1.42

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	Hogares beneficiados con nueva o renovada conexión de agua potable en zonas rurales.	# of households	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	12,200.00						21,500.00
					A			459.00	1,129.00	1,790.00	3,228.00	4,706.00	0.00	0.00			11,312.00

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

**Observations:** En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó "viviendas", para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.4	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas rurales	# of households	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	12,600.00						23,400.00
					A			113.00	345.00	0.00	443.00	358.00	431.00	0.00			1,259.00

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

**Observations:** En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó viviendas, para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.5	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación o mejora de sistemas de agua potable en zonas urbanas	# of households	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00						28,000.00
					A			1,449.00	2,880.00	0.00	20,170.00	6,523.00	0.00	0.00			31,022.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Details																		
Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales																		
Observations: En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó viviendas, para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.																		
Pro-Gender					No					Pro-Ethnicity					No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.6	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas urbanas.	# of households	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	3,200.00							6,100.00
					A				149.00	344.00	1,706.00	862.00	1,366.00	0.00	0.00			4,427.00
Details																		
Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales																		
Observations: En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó viviendas, para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.																		
Pro-Gender					No					Pro-Ethnicity					No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.7	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2013	P													
					A				0.00	493.00	412.00	0.00	900.00	0.00	0.00			1,805.00
Details																		
Means of verification: Informes semestrales de avance. Reportes comerciales y de catastro de usuarios del INAPA. Informes empresas de supervision																		
Pro-Gender					No					Pro-Ethnicity					No			
Specific Development Objectives Nbr. 2: La gestión técnica, operativa y comercial de INAPA mejorada.																		
Observation:																		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Indices de Agua No Contabilizada en las 7 provincias beneficiarias del proyecto	%	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00							10.00
					A				0.00	0.00	3.00	3.35	3.48	3.61	0.00			3.48
Details																		
Means of verification: Informes de Consultoría para fortalecimiento institucional de INAPA, Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales.																		
Observations: El indicador aparece en la matriz de resultados como "% de reducción del índice de ANC en las áreas urbanas de las 7 provincias desconcentradas". Se parte de 0 en el año base en el sentido de que no hay mejora, la mejora se produce a partir del 2015 con u																		
Pro-Gender					No					Pro-Ethnicity					No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Calidad de agua (índice de potabilidad)	%	50.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	65.00							65.00
					A				0.00	60.69	88.40	83.20	84.27	84.04	0.00			84.27
Details																		
Means of verification: Informes Laboratorio Calidad Agua INAPA, Informes Supervisión Obras, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.																		
Pro-Gender					No					Pro-Ethnicity					No			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.3	Usuarios incluidos en el catastro de INAPA	Usuarios	329,528.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	346,500.00						363,825.00
					A				0.00	142,601.00	114,001.00	114,505.00	122,307.00	137,555.00	160,684.00		122,307.00

#### Details

**Means of verification:** Informes Dept. Comercial INAPA, Informes Supervisión Obras, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.4	Eficiencia de la cobranza en relaiuon a usuarios facturados en las siete provincias bneneficiarias	%	10.00	2011	P	0.00	0.00	10.00	20.00	35.00	60.00						60.00
					A			13.60	13.00	44.10	32.08	80.97	76.45	71.64	0.00		76.45

#### Details

**Means of verification:** Informes Dept. Comercial y Financiero INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.5	Informes financieros y estados financieros generados en sistemas informáticos que cumplen con normativa contable	Informes	0.00	2011	P		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00
					A				0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		2.00

#### Details

**Means of verification:** Estados Financieros de INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.6	Informes anuales de gestión de recursos humanos generados en sistemas informáticos	Informes	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00
					A				0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		2.00

#### Details

**Means of verification:** Estados Dept. Rec. Humanos INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.7	Manuales de Operacion y Mantenimiento de sistemas de Agua Potabye y Saneamiento	Manuales	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00
					A				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes Departamento Operaciones de INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.8	Tecnicos capacitados en Operacion y	Tecnicos	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00						40.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

2.8	Mantenimiento de agua potable y calidad de agua potable	Técnicos	0.00	2011	A					0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00
-----	---	----------	------	------	---	--	--	--	--	------	-------	------	------	------	------	------	--	-------

#### Details

**Means of verification:** Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales, Informes de Consultoría.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.8	Índices de Agua No Contabilizada (ATPR-SC) en los Municipios intervenidos	%	82.00	2019	P												
					A								81.00	84.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe del auditor externo del ATPR

**Observations:** El índice de agua no contabilizada, tal y como se reporta por la UE es el cociente del agua facturada frente a la realmente producida (estimada dentro de una consultoría del proyecto a falta de otro dato), siendo para el 1er S/2018 83.57% de agua no facturada, aplicando la línea de base de 87%, la reducción sería de 3.43%. La UE puede aplicar es índice bien a la provincia o bien a los municipios de la ATPR-SC (Haina y San Cristóbal). Para la provincia, en base a una producción teórica del 50.7 Mm3/año el agua el dato del ANF del 1er S/2018 fue 77. En la ATPR-SC existe un indicador denominado VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE AGUAS NO FACTURADAS como "VANF (x)= [ANF (x)-ANF (x-1)]/ANF (x) = [1-VaF(x)/VaP(x)]\*100, Donde: VANF(x) = Variación del índice de ANF del año (x-1) al año (x); ANF(x): Índice de agua no facturada en el año x; VaF(x): Volúmenes de agua (en m3) facturados en el año x; VaP(x): Volúmenes de agua producidos (en m3) en el año. El agua no facturada (ANF) en el año x se define como,

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.9	Calidad de agua (índice de potabilidad) de los Municipios Intervenidos	%	87.00	2019	P												
					A								87.00	91.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe anual del auditor externo del contrato ATPR

**Observations:** El índice de potabilidad, tal y como se reporta por la UE es la media de los ensayos realizados en las siete provincias del programa, siendo para el 1er S/2018 84.87, el valor de un índice puede ser 0, 100 o un valor intermedio. Para San Cristóbal ATPR-SC (Haina y San Cristóbal) el dato del 1er S/2018 el dato fue 84.89. En la ATPR-SC existe un indicador denominado INDICE DE CALIDAD DE AGUA POTABLE. (ICA) Como "cociente se refiere al % de muestras de agua cuyos análisis resultan en cumplimiento con las declaratorias de aptas para consumo humano que establece la NORDOM1 ICA= (MACN/MAT)\*100, Donde: ICA= Índice de Calidad de Agua (Expresado en %) MACN= Número de muestras de agua tomadas en el mes de análisis que cumplen con la norma Nordom 1 y MAT= Número total de muestras tomadas en la zona de trabajo en el mes de análisis según la norma Nordom1). Los resultados del año 2018 para los municipios de la ATPR-SC sería 86.11 (verificar UE).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.10	Eficiencia de la cobranza en relación a usuarios facturados en la Provincia de San Cristobal afectados por la ATPR-SC	%	43.00	2019	P												
					A								72.16	54.33			

#### Details

**Means of verification:** Informe anual del auditor externo del contrato ATPR

**Observations:** La eficiencia en la cobranza, o índice de recaudo (IR), se calcula como la media de las siete provincias de los cocientes entre los realmente recaudado y lo facturado, siendo para el 1er S/2018 59.10% y para la Provincia de San Cristóbal 53%, siendo este índice mantenido en la ATPR-SC. En la ATPR-SC este índice se combina con el índice de cobertura de la facturación (ICF) que combinados dan una mejor idea de la mejora de la gestión comercial.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

2.11	Índices de Cobertura de la Facturación (s/ATPR-SC) en la provincia de San Cristóbal afectados por la ATPR-SC	%	11.00	2019	P													
					A								12.48	18.94				

#### Details

**Means of verification:** Informe anual del auditor externo del contrato ATPR

**Observations:** El índice de cobertura de la facturación no es uno de los resultados originales, pero es relevante ya que justamente con el índice de recaudo dan una visión de la gestión comercial de la institución. se define el índice de cobertura como el cociente resultante de dividir el número de clientes en la base de datos de clientes activos y facturados sobre el número de viviendas recibiendo el servicio de agua de INAPA y/o conectado a la red de alcantarillado sanitario. ICF= (CAF/PF)\*100, donde: IC= Índice de Cobertura de Facturación. (Expresado en %), CAF= Número de Clientes Activos y Facturados al momento de la evaluación y PF= Cantidad de viviendas recibiendo el servicio de agua y/o Alcantarillado Sanitario por INAPA. NOTA: Un cliente se considera activo cuando se le ha emitido al menos una factura. Un usuario se considera facturable cuando se encuentra usufructuando servicios a partir de una red de servicios de agua o de saneamiento del INAPA

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Organizaciones comunitarias para operar y mantener los sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales fortalecidas.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Porcentaje de mujeres que integran las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales	%	0.00	2011	P	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00							30.00
					A		42.00	42.00	42.00	46.00	44.00	43.00	0.00	0.00	0.00			43.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.2	Porcentaje de sistemas rurales de Agua Potable y Saneamiento que son administrados, operados y mantenidos por las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales en el área de influencia del proyecto.	%	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	80.00							80.00
					A				0.00	15.00	33.00	33.00	0.00	0.00				33.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.3	Miembros de comunidades rurales reciben capacitación en Operación y Mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento	Miembros	0.00	2011	P	0.00	14.00	58.00	78.00	50.00	0.00							200.00
					A			0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.4	Miembros de Asociaciones Comunitarias de Agua Rural reciben capacitación en administración de Sistemas de agua y saneamiento.	Miembros	0.00	2011	P	0.00	50.00	202.00	272.00	176.00	0.00							700.00
					A			0.00	45.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163.00

#### Details

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Sistemas	P		22		12,100,000
			P(a)		7	200,000	18,627,271.41
			A	0	6	0	10,616,222.41
1.2	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas	P		100		18,700,000
			P(a)		16		13,189,995.53
			A	0	16		13,187,618.04
1.3	Sistemas de saneamiento construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas	P		100		10,628,000
			P(a)		12	43,384.95	2,898,431.82
			A	0	9	84,384	2,599,239.63
1.4	Sistemas de Saneamiento construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Sistemas	P		12		7,452,000
			P(a)		5		8,529,912.91
			A	0	5		8,489,396.38
1.5	Diseños completados para comunidades rurales a ser servidas con agua potable	Diseños	P		65		220,000
			P(a)		58		50,734.5
			A		58		50,734.5
1.6	Diseños completos para comunidades rurales a ser servidas con saneamiento	Diseños	P		60		220,000
			P(a)		53		166,000
			A		53		185,629.79
1.7	Diseños completos para proyectos de saneamiento en zonas urbanas / periurbanas	Diseños	P		23		20,000
			P(a)		25		40,489.7
			A		25		40,489.7
1.8	Diseños completos para proyectos de agua potable en zonas urbanas/periurbanas	Diseños	P		27		20,000
			P(a)		30		50,734.5
			A		30		50,734.5

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Desarrollo Comunitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Comités Gestores creados en sistemas rurales	Comités	P		40		324,000
			P(a)		27		305,543.65
			A		27		305,543.65
2.2	Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales creadas	Asociaciones	P		25		593,000
			P(a)		18		573,464.27
			A		18		573,464.27
2.3	Asociaciones Comunitarias de Agua Rural incorporadas a la Ley 132/05	Asociacions	P		25		79,000
			P(a)		13		321,543.65
			A		14		308,594.84
2.4	Campañas de sensibilizacion ambiental en escuelas	Campaña	P		4		299,999.52
			P(a)		2		88,440.8
			A		2		88,440.8
2.5	Campañas de Higiene realizadas	Campaña	P		1		176,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Campañas de gestion de riesgos en comuidades rurales	Campaña	P		1		258,000
			P(a)		1		0
			A		1		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Mejoramiento Gestión Técnica, Operativa y Comercial de INAPA y Desconcentración de los Servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Propuesta de Fortalecimiento Institucional y Reestructuración del INAPA	Propuesta	P		1		500,000
			P(a)		1		1,484,334.39
			A		1		1,435,361.62
3.2	Programa de Control de la Calidad de Agua en INAPA para mitigar Expansion Colera. Instalacion de cloradores en acueductos rurales.	Cloradores instalados	P		121		1,200,000
			P(a)		121		1,658,932.55
			A		121		1,658,932.55
3.3	Sistemas Tecnológicos del INAPA Central y Oficinas Regionales.	Propuesta	P		1		500,000
			P(a)		1		1,713,088
			A		1		1,713,088
3.4	Programa de Equipamiento Operativo sedes regionales del INAPA	Propuesta	P		1		500,000
			P(a)	1	2	20,000	2,492,797.72
			A	0.64	1.64	3,937.36	2,280,290.72
3.5	Sistemas comerciales y catastro de clientes actualizados en centros urbanos.	Sistemas	P		16		4,000,000
			P(a)		26		7,031,825.99
			A	0	26		7,031,825.99
3.6	Instalación de micromedidores en sistemas de acueductos urbanos.	Micromedidores	P		0		0
			P(a)		500		0
			A	0	0		0
3.7	Informes anuales y final de cumplimiento de metas que reflejan los resultados de la gestion operativa, administrativa y comercial del contrato ATPR-SC	infome	P		0		0
			P(a)	1	3	612,828.67	2,891,296.41
			A	1	1	662,265.85	1,347,854.16
3.8	Informes de auditoria de seguimiento del contrato ATPR-SC	Informe	P		0		0
			P(a)	1	3	39,000	238,000
			A	0	0	9,601.2	20,802.6
3.9	Estudios especificos y productos para la mejora de la gestion asociados al contrato ATPR-SC	informe	P		0		0
			P(a)	3	7	373,005.8	1,666,256.32
			A	1	4	260,260.63	787,728.83

## Component Nbr. 4 Otros costos: Administracion del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

Apoyo a la Administracion del Programa	P				3,430,720.26
	P(a)			120,000	4,085,581.97
	A			91,863.25	3,709,951.52
Auditorias y Evaluacion	P				350,000
	P(a)			25,000	348,223.28
	A			18,259	245,488.28

## Total Cost

Total Cost	P				69,700,719.78
------------	---	--	--	--	---------------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			1,433,219.42	68,452,899.37
		A			1,130,571.29	56,727,432.78

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estudios específicos y productos para la mejora de la gestión asociados al contrato ATPR-SC	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	03/31/2021
			Modify Financial Historical Actual	JENNIFFERM	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JENNIFFERM	03/26/2021
	Informes anuales y final de cumplimiento de metas que reflejan los resultados de la gestión operativa, administrativa y comercial del contrato ATPR-SC	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	03/31/2021
			Modify Financial Historical Actual	JENNIFFERM	03/26/2021
	Informes de auditoría de seguimiento del contrato ATPR-SC	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	03/26/2021
	Instalación de micromedidores en sistemas de acueductos urbanos.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JENNIFFERM	03/26/2021
	Programa de Equipamiento Operativo sedes regionales del INAPA	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	03/31/2021
			Modify Financial Historical Actual	JENNIFFERM	03/26/2021
	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	03/26/2021
	Sistemas de saneamiento construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	03/31/2021
			Modify Financial Historical Actual	JENNIFFERM	03/26/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Project Monitoring & Evaluation
