

PMR Public Report

Operation Number	DR-L1084	Chief of Operations Validation Date	04/20/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/21/21
Last Update	04/20/21	Country Representative Validation Date	04/23/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Tourism and Urban Development Program for the Colonial City of Santo Domingo	Loan Number	3879/OC-DR
Executing Agency	MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	DURAN-ORTIZ, MARIO R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Dominican Republic
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Taller de arranque. La operación aun no ha iniciado obras.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1084	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	536,412.7	0.60%	89,463,587.3
Aggregated	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	536,412.7	0.60%	89,463,587.3

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

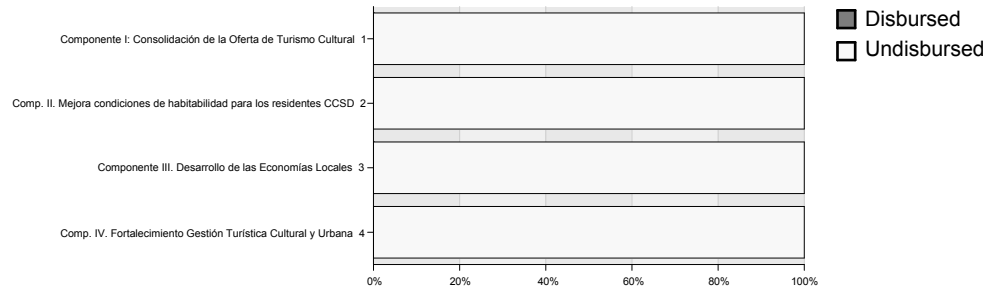

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Revitalizar la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD) en sus aspectos urbanos, económicos y de turismo cultural.

Observation: Se utiliza el término visitante turístico para no excluir el gasto de excursionistas y cruceristas. Por definición de la OMT, turista solo incluye a los visitantes que pernoctan en el destino.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Gasto diario promedio por visitante extranjero en la CCSD	US\$/Persona	84.00	2018	2026	P	89.00
						A	

Details

Means of verification: Encuesta de Demanda en Ciudad Colonial, realizada por el Observatorio Turístico.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)	No		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Recuperar los espacios públicos y monumentos históricos de la CCSD

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Promedio anual de ocupación hotelera en la CCSD	%	38.00	2020	P	38.00				76.00	76.00
					A	38.00					

Details

Means of verification: Sistema de Capacidad de Carga de Ciudad Colonial

Observations: La meta es la recuperación de la tasa promedio de ocupación hotelera. En 2018 la tasa de ocupación fue de 76%, ese es nuestro valor meta.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.1	Visitantes extranjeros a la CCSD	Visitantes	204,368.00	2020	P	204,368.00				604,418.00	604,418.00
					A	204,368.00					

Details

Means of verification: Sistema de Capacidad de Carga de Ciudad Colonial

Observations: La meta es recuperar los valores anteriores al Covid, teniendo en cuenta que la CCSD no es un destino turístico en sí mismo a nivel internacional. Es decir, la recuperación está sujeta a que RD recupere los 6.4 millones de turistas que llegaban por vía aérea y 1.1 millones por vía marítima.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Visitantes a los museos intervenidos	Visitantes	76,965.00	2020	P	76,965.00				284,218.00	284,218.00
					A	76,965.00					

Details

Means of verification: Ministerio de Cultura / Dirección general de Museos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar las condiciones de habitabilidad para los residentes de la CCSD

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Viviendas inadecuadas en los barrios de la zona norte de la CCSD / Total viviendas en la zona norte de la CCSD censadas	%	2020	P							
				A							

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Informe de Habitat

Observations: Línea base Levantamiento Hábitat para la Humanidad; Valor meta relación de línea base e Informe de Viviendas Intervenidas de la UCP.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Desarrollo de las economías locales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Número de empleados en la CCSD	Personas	2021	P							
				A							

Details

Means of verification: Censo de negocios (PIDTUCC 2021 y 2026)

Observations: LB: Empleos en CCSD = 5.537, Negocios = 1.694[9]

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.1	Personas capacitadas en oficios técnicos* a través del PIDTUCC	Personas	2020	P	0.00					800.00	800.00
				A	0.00						

Details

Means of verification: Registro de participantes

Observations: Este indicador hará seguimiento a los habitantes de CCSD que sean capacitados a través del programa. Incluye capacitaciones realizadas en el Centro Comunitario, la Fundación San Valero y Claustro de las Mercedes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Fortalecimiento de la gestión de Ciudad Colonial

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Total Turistas CCSD / Total turistas SD	%	2019	P	68.00					68.00	68.00
				A	68.00						

Details

Means of verification: Encuesta de Opinión, Actitud y Motivación a Extranjeros no residentes, realizada por el Banco Central de RD

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.3	Número de empresas certificadas con el distintivo de calidad turística	Empresas	12.00	2020	P	12.00					30.00	30.00
					A	12.00						
Details												
Means of verification: Sistema de Calidad Turística												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.4	Instituciones integradas al sistema digital de gestión de permiso	Instituciones	0.00	2020	P	0.00					3.00	3.00
					A	0.00						
Details												
Means of verification: Sistema automatizado de gestión de permisos												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Consolidación de la oferta de turismo cultural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
1.1	Espacios públicos en Calles priorizadas recuperados	Metros lineales	P	0	3,844	0	24,814,000
			P(a)	0	3,844	0	24,814,000
			A	0	0	0	0
1.2	Ruinas arqueológicas restauradas	Ruinas	P	0	1	0	9,586,000
			P(a)	0	1	0	9,586,000
			A	0	0	0	0
1.3	Ribera del Ozama recuperada	Parque Lineal	P	0	1	0	1,830,000
			P(a)	0	1	0	1,830,000
			A	0	0	0	0
1.4	Museos recuperados	Museos	P	0	4	0	6,022,000
			P(a)	0	4	0	6,022,000
			A	0	0	0	0
1.5	Plan de Movilidad Urbana implantado	Plan	P	0	1	0	2,678,000
			P(a)	0	1	0	2,678,000
			A	0	0	0	0
1.6	Sistema de Recolección de basura mejorado	Sistema	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	0	3,000,000
			A	0	0	0	0
1.7	Sistema de Vídeo vigilancia ampliado	Sistema	P	0	1	0	615,000
			P(a)	0	1	0	615,000
			A	0	0	0	0
1.8	Plan de mejoramiento de iluminación desarrollado	Plan	P	0	1	0	615,000
			P(a)	0	1	0	615,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Mejora de las condiciones de habitabilidad para los residentes de la CCSD

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
2.1	Viviendas mejoradas	Viviendas	P	0	140	0	3,188,474
			P(a)	0	140	0	3,188,474
			A	0	0	0	0
2.2	Programa de recuperación de fachadas	Fachadas	P	0	120	0	2,267,096.6
			P(a)	0	120	0	2,267,096.6
			A	0	0	0	0
2.3	Propuesta de modelo de negocio rentable con inmuebles potenciales para vivienda asequible identificados elaborada	Propuesta	P	0	1	0	70,000
			P(a)	0	1	0	70,000
			A	0	0	0	0
2.4	Espacios públicos comunitarios recuperados	Espacios públicos	P	0	6	0	6,166,429.4
			P(a)	0	6	0	6,166,429.4
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Desarrollo de las economías locales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
3.1	Mercado Modelo adecuado y en funcionamiento	Mercado	P	0	1	0	4,850,000
			P(a)	0	1	0	4,850,000
			A	0	0	0	0
3.2	Microempresas asistidas	# of enterprises	P	0	120	0	1,050,000
			P(a)	0	120	0	1,050,000
			A	0	0	0	0
3.3	Microempresas financiadas a través de un fondo concursable	Microempresas	P	0	20	0	1,370,000
			P(a)	0	20	0	1,370,000
			A	0	0	0	0
3.4	Formulación de una estrategia de desarrollo economico local en CCSD	Estrategia	P	0	1	0	760,000
			P(a)	0	1	0	760,000
			A	0	0	0	0
3.5	Escuela tecnicas con programa de capacitación laboral implementado	Esculas Técnicas	P	0	3	0	550,000
			P(a)	0	3	0	550,000
			A	0	0	0	0
3.6	Programa de oferta cultural urbana implantado	Programa	P	0	1	0	1,466,000
			P(a)	0	1	0	1,466,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de la Gestión Turística Cultural y Urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
4.1	Mecanismo de Gestión Sostenible de la CCSD implantado	Mecanismo	P	0	1	0	700,000
			P(a)	0	1	0	700,000
			A	0	0	0	0
4.2	Sistema Integrado de Gestión de Servicios de la CCSD	Sistema	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
4.3	Plan de mercadeo implementado	Plan	P	0	1	0	700,000
			P(a)	0	1	0	700,000
			A	0	0	0	0
4.4	Observatorio Turístico de la CCSD fortalecido	Observatorio	P	0	1	6,402.59	752,000
			P(a)	0	1	6,402.59	752,000
			A	0	0	6,402.59	6,402.59
4.5	Sistema Nacional de Registro, Clasificación y Calidad de Establecimientos Turísticos implantado	Sistema	P	0	1	0	766,000
			P(a)	0	1	0	766,000
			A	0	0	0	0
4.6	Plan de rutas turísticas implementado	Plan	P	0	1	0	950,000
			P(a)	0	1	0	950,000
			A	0	0	0	0
4.7	Programa de fortalecimiento institucional de MITUR implementado	Programa	P	0	1	0	900,000
			P(a)	0	1	0	900,000
			A	0	0	0	0
4.8	Programa de fortalecimiento institucional del ADN implementado	Programa	P	0	1	0	1,600,000
			P(a)	0	1	0	1,600,000
			A	0	0	0	0
4.9	Plan de Comunicación estratégica del Programa implantado	Plan	P	0	1	0	1,550,000
			P(a)	0	1	0	1,550,000
			A	0	0	0	0
4.10	Programa de fortalecimiento institucional del MINC implementado	Programa	P	0	1	0	1,700,000
			P(a)	0	1	0	1,700,000
			A	0	0	0	0
4.11	Plan acción social del programa implantado	Plan	P	0	1	5,689.24	700,000
			P(a)	0	1	5,689.24	700,000
			A	0	0	5,689.24	5,689.24

Other Cost

	Imprevistos	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Administracion del programa	P			83,955.8	8,284,000
		P(a)			83,955.8	8,284,000
		A			83,955.8	83,955.8

Total Cost

	Total Cost	P			96,047.63	90,000,000
		P(a)			96,047.63	90,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			96,047.63	96,047.63
--	------------	---	--	--	-----------	-----------

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
