

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1111	Chief of Operations Validation Date	04/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/07/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/14/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile			
Operation Name	Quito Metropolitan Urban Transport System	Loan Number	2882/OC-EC, 2882/OC-EC-2
Executing Agency	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO (EPMQ)	Sector/Subsector	TRANSPORT-PUBLIC TRANSPORT (BUS / TRAIN / CABLE). INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT
Team Leader	MOJICA, CARLOS HERNAN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	EC-L1124
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	04/25/18
Safeguard Performance Rating - Rationale	Los impactos temporales ocasionados durante la construcción a ingresos/ medios de vida, de comercios fueron plenamente identificados, como mayoritariamente pequeños y medianos. Las medidas compensatorias monetarias (5 casos) y no monetarias (65 casos) definidas desde 2017,y revalidadas en el 2018, no han sido aún ejecutdas lo que constituye un incumplimiento de la Política de Salvaguardia OP-703 del BID. No se ha concluido la ejecución del Plan de Reasentamiento por pagos pendientes por afectaciones a terrenos/ estructuras, con la revisión de las fichas valorativas y porcentual de la plusvalía, y confirmar no afectaciones, para definir si hay o no incumplimiento con la OP -710, pendientes desde 2017.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1111	350,000,000	350,000,000	240,591,194	0	490,591,194	350,000,000	349,800,000	99.94%	200,000
EC-L1124	100,000,000	100,000,000	253,000,000	0	353,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00%	0
Aggregated	450,000,000	450,000,000	493,591,194	0	843,591,194	450,000,000	449,800,000	99.96%	200,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

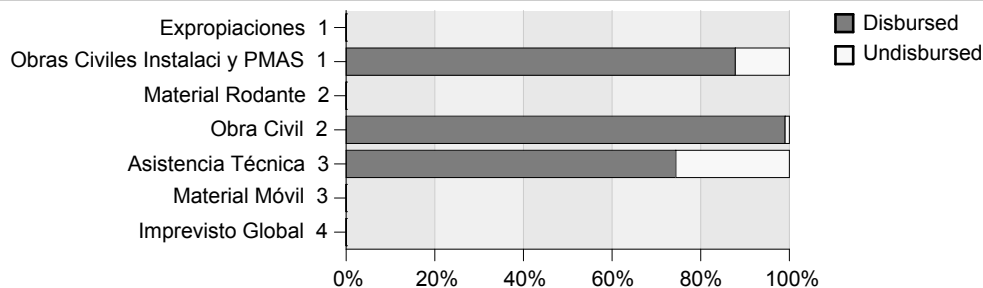

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a mantener la participación modal del transporte público en viajes motorizados.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Porcentaje de participación modal del Transporte Público en Viajes Motorizados	Porcentaje	76.00	2012	2022	P	76.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Movilidad 2018 de la Secretaría de Movilidad

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Movilidad urbana en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.1	Tiempo de viaje para usuarios del transporte público	Minutos promedio por pasajero	38.50	2012	P			23.10
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Movilidad EDM11 y Encuesta a Usuarios de Metro Quito 2018; ambos elaborados por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ)

Observations: Tiempo de viaje puerta a puerta (incluye caminata, espera y trayecto en el vehículo) de usuarios del sistema de buses que tomarán el sistema Metro. En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto este tiempo de viaje sería de 42.5 minutos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.2	Pasajeros por día en el Sistema de Metro	Pasajeros	0.00	2012	P			369,714.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Observations: Se estima que el 87% de los usuarios del metro provendrán de usuarios regulares del transporte público, 10% de autos particulares y 3% nuevos viajes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.3	Nivel de ocupación de pasajeros del Metro	Pasajeros por m2	0.00	2012	P			6.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.4	Porcentaje de usuarios satisfechos con el Metro	Porcentaje	0.00	2012	P			65.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Metro de Quito, realizada por la EPMMQ

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 2: Eficiencia operacional en el sistema integrado de transporte público del DMQ mejorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.1	Costos de operación de la flota vehicular de Quito	Millones de USD por año	999.00	2012	P			1,181.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Modelo Socio-Económico 2018 con base en los costos de insumos. Incluye encuesta de actualización de los costos de insumos. EPMMQ

Observations: En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto este costo de operación sería de US\$ 1249 millones.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje de rutas alimentadoras del Metro en funcionamiento	Porcentaje	0.00	2012	P			100.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Observations: El funcionamiento de las Rutas Alimentadoras significa que (i) los recorridos actuales de buses han sido reestructurados, (ii) El sistema de tarifas está integrado entre buses y metro, y (iii) los pasajeros tiene la facilidad física de transferirse al si

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.3	Porcentaje de la flota de Buses del DMQ bajo un sistema de recaudo unificado	Porcentaje	30.00	2012	P			90.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Observations: Significa que la tecnología del Sistema es compatible e interoperable con el sistema de recaudo del Proyecto Metro.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 3: Nivel relativo de las emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero mantenido

Observation: Se pedirá asesoramiento a un experto ambiental y este indicador será reformulado

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
3.1	Emisiones de Gases de Efecto Invernadero	Millones de toneladas por año	1,201.00	2012	P			1,407.00
					A			0.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details

Means of verification: Modelo Socio-Económico 2018; EPMMQ y registros de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Quito.

Observations: Emisiones totales de la flota de transporte público y la flota de vehículos particulares. En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto las emisiones sería de 1.472 millones de toneladas.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Obra civil, instalaciones Terminadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Estaciones en obra gris terminadas	Número de estaciones	P		15		64,480,020
			P(a)	0	15	28,542,489.88	137,438,029.22
			A	0	15	15,202,343.73	133,377,904.81
1.2	Túnel revestido terminado	Km	P		22		109,027,955
			P(a)	0	22	0	222,425,167.45
			A	0	22	0	222,425,167.45
1.3	Talleres y cochera terminados para recepción de trenes	Número de cocheras	P		1		21,492,025
			P(a)	0	1	0	16,784,931.77
			A	0	0	0	16,784,931.77
1.4	Instalaciones terminadas	Sistema	P		1		0
			P(a)	0	1	0	50,528,771.61
			A	0	0	0	50,528,771.61

Component Nbr. 2 Componente II. Material Rodante Entregado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Material Rodante Recibido	Número de trenes	P		18		0
			P(a)	0	19	0	0
			A	1	18	0	0

Component Nbr. 3 Componente III. Fiscalización, Gerencia Técnica y Supervisión Terminada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Informes Mensuales de Fiscalización	Número de informes	P		44		0
			P(a)	10	58	2,800,000	4,859,880.63
			A	12	58	2,759,880.63	4,759,880.63
3.2	Informes Trimestrales de Gerencia Técnica	Número de informes	P		14		0
			P(a)	4	14	1,274,991.16	12,608,347.74
			A	4	14	4,115,066.43	9,028,281.9
3.3	Informes de Resultados de Fiscalización Material Rodante	Número de informes	P		28		5,000,000
			P(a)	0	30	0	5,000,000
			A	1	30	0	5,000,000

Other Cost

	Expropiaciones	P				0
		P(a)			0	8,834,214.11
		A			0	8,834,214.11
	Imprevisto global	P				0
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Reajuste de precios (inflación)	P				0
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Auditorias y evaluación	P				0
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				200,000,000
		P(a)			32,617,481.04	458,479,342.53
		A			22,077,290.79	450,739,152.28

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estaciones en obra gris terminadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ASANCHEZ	03/25/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ASANCHEZ	03/26/2021
	Informes Mensuales de Fiscalización	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ASANCHEZ	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ASANCHEZ	03/25/2021
	Informes Trimestrales de Gerencia Técnica	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ASANCHEZ	03/25/2021
	Informes de Resultados de Fiscalización Material Rodante	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ASANCHEZ	03/25/2021
	Material Rodante Recibido	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ASANCHEZ	03/21/2021
	Túnel revestido terminado	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ASANCHEZ	03/25/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities
