

PMR Public Report

Operation Number	HA-L1103	Chief of Operations Validation Date	05/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	05/07/21
Last Update	05/04/21	Country Representative Validation Date	05/14/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Port-au-Prince Water and Sanitation Project III	Loan Number	4353/GR-HA
Executing Agency	DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	PEREZ MONFORTE, SERGIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Haiti
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D'HAITI		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	The Project Executing Unit (PEU) of the EA is completing the classification and Environmental and Social Management Plan (ESMP) for the COVID-19 projects. Consultations are planned for all category B projects. The PEU is moving forward with projects that were not in the sample. The international Environmental and Social (E&S) consultant continues to support the team. Improvements are being made regarding consultations and documentation. The ESMP for the completed works has been implemented adequately.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1103	0	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	8,716,344.06	13.41%	56,283,655.94
Aggregated	0	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	8,716,344.06	13.41%	56,283,655.94

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

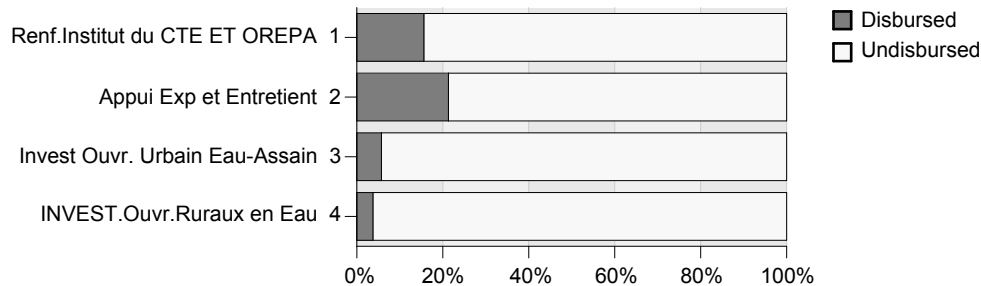

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Résultat I : La DINEPA exerce une réglementation effective au niveau de la DINEPA centrale et la déconcentration au niveau de l'OREPA-Ouest.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
0.0	Nombre de CTEs de la DINEPA qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	CTE	0.00	2016	P					0.00			
					A		0.00	9.00					10.00
Details													
Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
0.1	Nombre de structures de l'OREPA Ouest qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de regulation et de planification	Unité	0.00	2016	P	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00			2.00
					A	0.00	1.00	1.00					0.00
Details													
Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Specific Development Objectives Nbr. 1: Résultat II : Le CTE-RMPP améliore sa viabilité financière

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.1	Nombre de connexions domiciliaires et commerciales actives au CTE-RMPP	Connection active	46,000.00	2016	P	46,000.00	48,250.00	54,740.00	61,640.00	68,200.00			68,200.00
					A	46,000.00	48,000.00	50,868.00				46,000.00	
Details													
Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/Jour	103,000.00	2016	P	103,000.00	159,000.00	169,000.00	183,000.00	183,000.00			183,000.00
					A	103,000.00	130,000.00	114,660.00				103,000.00	
Details													
Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No				

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.2	Indice de recouvrement du CTE-RMPP (% de paiement des factures)	%	54.00	2016	P	54.00	59.00	63.00	66.00	71.00			71.00
					A	54.00	51.00	46.74					54.00

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.3	Ratio d'exploitation du CTE-RMPP (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles)	Ratio	0.67	2016	P	0.67	0.90	1.07	1.22	1.32			1.32
					A	0.67	0.80	0.65					0.67

Details

Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Résultat III : L'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d'hygiène se sont améliorés dans la RMPP

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.1	Pourcentage de foyer ayant accès à un service d'eau amélioré	%	44.00	2016	P					44.00			60.00
					A								60.00

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.2	Nombre de foyers ayant acces a l'eau potable a domicile	Foyer	92,000.00	2016	P	92,000.00	97,600.00	121,600.00	150,000.00	178,400.00			178,400.00
					A	92,000.00	96,000.00	83,868.00					92,000.00

Details

Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year									
2.3	Pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable via un kiosque	%	4.50	2016	P	4.50	5.00	5.50	6.00	6.00			6.00
					A	4.50	5.00	6.70					0.00
Details													
Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.4	Nombre d'heures par jour d'alimentation des ménages à partir d'une connexion du CTE-RMPP	Heure/Jour	3.30	2016	P	4.00	6.00	9.00	12.00	12.00			12.00
					A	3.30	5.00						3.30
Details													
Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.5	% de femmes qui travaillent dans des kiosques nouveaux ou réhabilités dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville	%	13.00	2016	P	15.00	18.00	23.00	27.00	35.00			20.00
					A	13.00	14.00	18.00					13.00
Details													
Means of verification: Rapport du dép. Quartiers Défavorisés du CTE													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.6	% de ménages qui ont des installations pour le lavage des mains, y compris du savon	%	5.00	2016	P	5.00	15.00	30.00	25.00	20.00			20.00
					A	5.00	6.00						5.00
Details													
Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.7	% de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation	%	75.00	2016	P	75.00	75.00	90.00	85.00	85.00			85.00
					A	75.00	75.00						75.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details													
Means of verification: Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity No									

Specific Development Objectives Nbr. 3: Résultat 4 : L'accès aux services d'eau et d'assainissement et à l'hygiène dans des zones rurales de l'OREPA-Ouest

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'assainissement et de higiene amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00				4,000.00
					A	0.00	0.00	0.00					0.00

Details													
Means of verification: Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity No									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'eau amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	500.00	3,500.00	4,000.00				8,000.00
					A	0.00	0.00	0.00					0.00

Details													
Means of verification: Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity No									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Composante I : Renforcement institutionnel du CTE-RMPP et de la DINEPA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Contats par résultats signés (APP)	Contract	P	1	1	3,275,000	9,000,000
			P(a)	0	1		2,500,000
			A	0	0	0	29,823
1.2	OREPA NORD dotée de matériel et de personnel pour acquérir l'éligibilité du projet HA-L1135	Unité	P		1		125,000
			P(a)	0	1	0	70,365.24
			A	0	1	0	70,365.24
1.3	Contrats de consultations d'appui à la DINEPA pour la regulation et le suivi des APP signés	Contrat	P	1	2	52,500	175,000
			P(a)	0	2		175,000
			A	0	1	0	0
1.4	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'accès à l'assainissement et l'hygiène , exécutées	Campagne	P	1	2	220,000	510,000
			P(a)	0	1	0	240,000
			A	0	0	0	0
1.5	OREPA Ouest dotée de bâtiment et matériel roulant	Unité	P	1	3	500,000	711,595.6
			P(a)	2	4	0	711,595.6
			A	2	3	174,774.16	179,718.23
1.6	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Unité	P	2	3	120,000	400,000
			P(a)	0	2		150,000
			A	0	0	0	0
1.7	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses structures dotées du matériel et de personnel	Unité	P	2	8	400,000	1,300,000
			P(a)	8	20	820,000	2,268,185.44
			A	8	10	720,216.22	968,185.44

Component Nbr. 2 Composante II : Appui au fonctionnement du CTE-RMPP et à l'entretien

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Accords de subvention au CTE pour la facture de l'EdH singés	Accord	P		1	250,000	950,000
			P(a)	0	2	300,000	1,100,000
			A	0	1	170,492.57	649,240.43
2.2	Contrat d'approvisionnement en combustible signé	Contrat	P		1	250,000	750,000
			P(a)	0	2	300,000	750,000
			A	0	1	0	31,462.53
2.3	CTE-RMPP doté du personnel	Unité	P	1	4	125,000	400,000
			P(a)	1	3	25,000	195,000
			A	0	1	0	0
2.4	Agences du CTE-RMPP dotées de matériel et du personnel	Agences	P	2	3	125,000	250,000
			P(a)		3		250,000
			A	0	0	0	0
2.5	Travaux d'amélioration du service réalisés par le CTE	Unité	P	1	4	300,000	750,000
			P(a)	1	3		750,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Composante III : Investissements dans des travaux relatifs à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Conduites structurantes et de refoulement installées	ml	P	7,000	17,000	2,085,000	12,500,000
			P(a)	0	9,500	716,904	19,819,128
			A	0	0	716,903.96	1,001,786.09
3.2	Réservoirs réhabilités ou construits	Réservoir	P	0	3	920,676.45	3,115,252.15
			P(a)	0	2	766,000	1,899,520.55
			A	0.5	0.5	897,313.45	1,224,520.55
3.3	Conduites de distribution installées	ml	P	4,500	9,500	2,040,000	10,100,000
			P(a)	0	7,300		16,983,827.64
			A	0	0	0	0
3.4	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	Unité	P	120	400	1,925,000	7,150,000
			P(a)	0	4		100,000
			A	0	0	0	0
3.5	Connexions installés au niveau des ménages	Connexion	P	10,000	31,500	1,620,000	4,020,000
			P(a)	0	22,000	0	4,020,000
			A	0	0	0	0
3.6	Armoires électriques et d'automatismes réhabilités	Unité	P		2		220,000
			P(a)	0	2		220,000
			A	0	0		0
3.7	Kiosques construits ou réhabilités	Kiosque	P	25	55	250,000	560,000
			P(a)	0	40		560,000
			A	0	0	0	0
3.8	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers défavorisés de la RMPP signés	Contrat	P	3	5	460,000	1,219,600
			P(a)	3	7	25,000	1,219,600
			A	3	3	0	19,393.76
3.9	Contrat de supervision des grands travaux signé	Contrat	P		1	438,000	1,088,235
			P(a)	3	6	50,000	1,088,235
			A	3	4	57,644.67	57,644.67
3.10	Bâtiment du CTE de Ouanaminthe construit	Unité	P		1	112,500	250,000
			P(a)	0	1	86,284	167,068.67
			A	1	1	93,294.19	142,068.67
3.11	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEF réalisées	Unité	P	2	3	200,000	300,000
			P(a)	0	1		90,156.61
			A	0	1	0	15,156.61
3.12	Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle réalisée	Campagne	P	1	1	35,000	100,000
			P(a)	0	1		100,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Composante IV : Investissements dans les domaines de l'eau, assainissement et hygiène dans des zones rurales de l'OREPA OUEST

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Outil de planification rural developé	Unité	P		1	50,000	100,000
			P(a)	0	1		100,000
			A	0	0	0	0
4.2	Campagnes d'assainissement et d'hygiène réalisées dans 8 Sections communales de l'OREPA Ouest réalisées	Campagne	P	4	8	235,000	511,765
			P(a)	0	8		511,765
			A	0	0	0	0
4.3	Réseau d'eau potable construites ou rehabilitées	Unité	P	2	4	120,000	350,000
			P(a)	0	4		350,000
			A	0	0	0	0
4.4	Points d'eau construites ou rehabilités	Unité	P	11	24	2,175,000	4,450,000
			P(a)	0	17		4,450,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 5 Composante V : Administration du Projet

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
5.1	Formations et échanges avec opérateurs régionaux réalisées	Unité	P	1	4	75,000	211,500.65
			P(a)	0	4		211,500.65
			A	0	1	16,746	61,746
5.2	Unité d'exécution dotée du personnel	Unité	P	1	4	530,000	1,952,051.6
			P(a)	1	4	150,000	1,952,051.6
			A	1	2	294,892.82	440,121.47
5.3	Unité d'exécution dotée du materiel	Unité	P	1	4	75,000	530,000
			P(a)	0	4	25,000	530,000
			A	1	2	141,745	188,523.65
5.4	Audits et supervisions réalisés	Unité	P	1	4	280,000	950,000
			P(a)	1	4	60,000	950,000
			A	0	1	28,017.45	83,655.34

Component Nbr. 6 Composante VI : Mise en œuvre de mesures d'atténuation de la pandémie Covid 19

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
6.1	Points de lavage des mains (PLM) dans les sites critiques, construits et opérés	Nombre PLM	P		0		0
			P(a)	400	400	367,000	367,000
			A	1,000	1,000	1,146,375	1,146,375
6.2	Campagnes de divulgation concernant les mesures d'hygiène mises en œuvre	Campagnes	P		0		0
			P(a)	1	1	150,000	150,000
			A	1	1	95,649	95,649

Total Cost

	Total Cost	P			19,243,676.45	65,000,000
		P(a)			3,841,188	65,000,000
		A			4,554,064.49	6,405,435.68

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Accords de subvention au CTE pour la facture de l'EdH singés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SPEREZ	05/03/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Agences du CTE-RMPP dotées de materiel et du personel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Bâtiment du CTE de Ouanaminthe construit	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	CTE-RMPP doté du personel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Campagnes d'assainissement et d'hygiène réalisées dans 8 Sections communales de l'OREPA Ouest réalisées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène , executées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Conduites de distribution installées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	05/03/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Conduites structurantes et de refoulement installées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	04/09/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Connexions installés au niveau des ménages	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Contats par résultats signés (APP)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Contrat d'approvisionnement en combustible signé	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Contrat de supervision des grands travaux signé	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers dévaforisés de la RMPP signés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Contrats de consultations d'appui à la DINEPA pour la regulation et le suivi des APP signés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Kiosques construits ou réhabilités	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses esctructures dotées du materiel et de personel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses esctructures dotées du materiel et de personel	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SPEREZ	05/03/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MRODRIGUEZV	05/03/2021
	OREPA Ouest dotée de bâtiment et materiel roulant	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Outil de planification rural developé	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Points d'eau construites ou rehabilités	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021
	Réseau d'eau potable construites ou rehabilités	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Réservoirs réhabilités ou construits	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MRODRIGUEZV	05/03/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MRODRIGUEZV	05/03/2021
	Unité d'exécution dotée du materiel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEP réalisées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	04/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	03/30/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Project Design
