

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1228	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/03/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/04/21
<b>Last Update</b>	04/01/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/06/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Create Integrated Health Networks	<b>Loan Number</b>	4726/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	SORIO, RITA ELIZABETH	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Las obras para este programa no han comenzado aún pero están siguiendo los procedimientos puestos en marcha en el PGAS. El organismo ejecutor ha preparado Evaluaciones Ambiental y Social (EVAP) preliminar para la non objecion del banco.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1228	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	5,269,204	4.22%	119,730,796
<b>Aggregated</b>	<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>32,825,000</b>	<b>0</b>	<b>157,825,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>5,269,204</b>	<b>4.22%</b>	<b>119,730,796</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

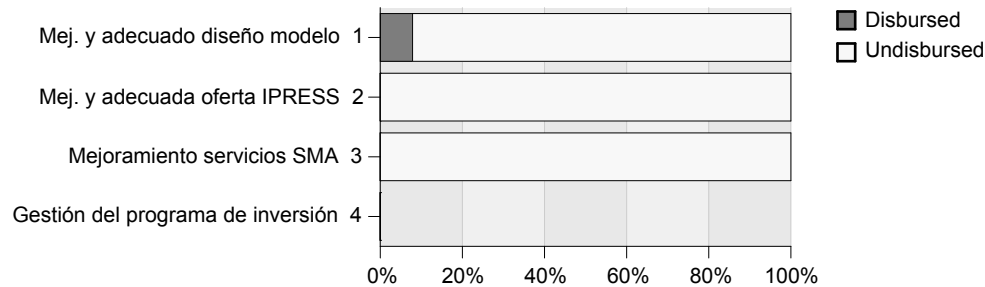

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Calidad de los servicios en el primer nivel de atención mejorada

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria–total	Porcentaje	29.00	2017	-	P	24.60
						A	

#### Details

**Means of verification:** Registros Administrativos SIS - MINSA

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– hombres (Seguimiento de género)				P	36.50
					A	
	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– mujeres (Seguimiento de género)				P	23.60
					A	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.4	Tasa de mortalidad por servicios de salud de baja calidad	Porcentaje	20.80	2017	-	P	17.50
						A	

#### Details

**Means of verification:** Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de las Enfermedades (MINSA)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Capacidades de oferta de servicios de salud mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.1	Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado	%	88.10	2017	P			92.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.2	Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un chequeo para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses	%	34.60	2017	P			38.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.3	Porcentaje de personas que han donado sangre de manera voluntaria	%	5.36	2017	P			8.00
					A			
Details								
Means of verification: PRONAHEBAS (MINSA)								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.4	Porcentaje de despachos de ambulancia requeridos y no atendidos	%	46.00	2017	P			41.00
					A			
Details								
Means of verification: Registros Administrativos - SAMU (MINSA)								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

1.5	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	71.54	2017	P			74.50
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	62.30	2017	P			70.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Beneficiarios que reciben servicios de salud	# of beneficiaries	2,850,000.00	2017	P			3,049,000.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES E INEI								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.7	Porcentaje de usuarios de consulta externa que se sintieron "satisfechos" o "muy satisfechos" con la atención recibida	%	78.80	2016	P			84.00
					A			
Details								
Means of verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.8	Porcentaje de usuarios de consulta externa que calificaron el tiempo de espera para la atención en el establecimiento de salud con una evaluación de 6 o más (en escala de 1 a 10)	%	77.20	2016	P			83.50
					A			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Details			
<b>Means of verification:</b> Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en las Redes Integradas de Salud (RIS)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad rediseñado	Modelo	P		1		339,595
			P(a)		1		339,595
			A	0	0	0	0
1.2	Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales, hipertensión	Protocolos	P	5	17	195,671	545,013
			P(a)	0	17	30,000	545,013
			A	0	0	10,447.76	10,447.76
1.3	Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías clínicas y protocolos	Profesionales	P		1,600		461,045
			P(a)		1,600		461,045
			A	0	0	0	0
1.4	Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud elaborados	Modelo	P		1	508,834	7,033,701
			P(a)		1	0	7,033,701
			A	0	0	0	0
1.5	Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos para actuación en red, elaborado y validado por el MINSA	Plan	P		1	21,962	834,692
			P(a)		1	0	834,692
			A	0	0	0	0
1.6	Guía de atención y manejo de casos de violencia en mujeres con enfoque de género revisado y fortalecido	Guía	P		1		50,598
			P(a)		1		50,598
			A	0	0	0	0
1.7	Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema, aprobada	Estrategia	P		1	345,446	624,934
			P(a)		1	0	624,934
			A	0	0	0	0
1.8	Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) centralizados	Taller	P		25		453,937
			P(a)		25		453,937
			A	0	0	0	0
1.9	Estudios técnicos de redes elaborados	Informe	P		7		1,308,055
			P(a)		7		1,308,055
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS en el Primero Nivel de Atención de Lima Metropolitana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Establecimientos de salud 24 horas diseñados	Establecimiento de salud	P		5		4,689,612
			P(a)		5		4,689,612
			A	0	0	3,582.09	3,582.09
2.2	Establecimientos de salud 24 horas remodelados	Establecimiento de salud	P		5		39,494,271
			P(a)		5		39,494,271
			A	0	0	0	0
2.3	Establecimientos de salud 24 horas equipados	Establecimiento de salud	P		5		17,167,019
			P(a)		5		17,167,019
			A	0	0	0	0
2.4	Establecimientos de salud 24 horas operando	Establecimiento de salud	P		5		150,000
			P(a)		5		150,000
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1 Central de SMA, diseñada	Central	P		1	383,707	1,287,981
		P(a)		1	0	1,287,981
		A	0	0	0	0
3.2 Central de SMA, construida	Central	P		1		23,040,751
		P(a)		1		23,040,751
		A	0	0	0	0
3.3 Manual operativo con reglas de funcionamiento de la central de SMA elaborado	Manual operativo	P		2		420,002
		P(a)		2		420,002
		A	0	0	0	0
3.4 Central de SMA, equipamiento de laboratorio instalado	Equipamiento	P		1		9,098,132
		P(a)		1		9,098,132
		A	0	0	0	0
3.5 Central de SMA, equipamiento de lectura de imágenes instalado	Equipamiento	P		1		2,274,533
		P(a)		1		2,274,533
		A	0	0	0	0
3.6 Central de SMA, equipamiento de banco de sangre instalado	Equipamiento	P		1		6,823,599
		P(a)		1		6,823,599
		A	0	0	0	0
3.7 Central de SMA, equipamiento de atención prehospitalaria instalado	Equipamiento	P		1		1,137,267
		P(a)		1		1,137,267
		A	0	0	0	0
3.8 Central de SMA, equipamiento complementario instalado (cadena de frío, gases, etc.)	Equipamiento	P		1		3,411,800
		P(a)		1		3,411,800
		A	0	0	0	0
3.9 Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de coordinación con la red completados	Protocolo	P		1		394,998
		P(a)		1		394,998
		A	0	0	0	0
3.10 Profesionales de SMA capacitados	Profesionales	P		65		913,001
		P(a)		65		913,001
		A	0	0	0	0
3.11 Puesta en marcha de la central de SMA	Central	P		1		200,000
		P(a)		1		200,000
		A	0	0	0	0
3.12 Campañas de sensibilización de la población sobre los SMA	Campañas de sensibilización	P		6		3,450,000
		P(a)		6		3,450,000
		A	0	0	0	0
3.13 Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Equipos médicos	P	11	65	3,432,583	21,895,464
		P(a)	6	48	3,210,630	21,895,464
		A	6	6	3,819,011	3,819,011

## Other Cost

Gestión	P			1,663,022	8,575,000
	P(a)			997,813.2	8,575,000
	A			566,589	826,480
Monitoreo y evaluación	P			300,000	1,500,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoreo y evaluación	P(a)			0	1,500,000
		A			0	0
	Auditorias	P			50,000	250,000
		P(a)			0	250,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			6,901,225	157,825,000
		P(a)			4,238,443.2	157,825,000
		A			4,399,629.85	4,659,520.85



## PMR Public Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AOKUMA	03/22/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Intra/Inter Coordination
