

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1107	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/08/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/08/21
<b>Last Update</b>	04/06/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/09/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	CVU Highway Program II	<b>Loan Number</b>	3578/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY, CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO	<b>Sector/Subsector</b>	TRANSPORT-ROAD MAINTENANCE
<b>Team Leader</b>	PEREYRA DA LUZ, ANDRES	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1107	76,000,000	76,000,000	13,500,000	0	89,500,000	76,000,000	76,000,000	100.00%	0
Aggregated	76,000,000	76,000,000	13,500,000	0	89,500,000	76,000,000	76,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

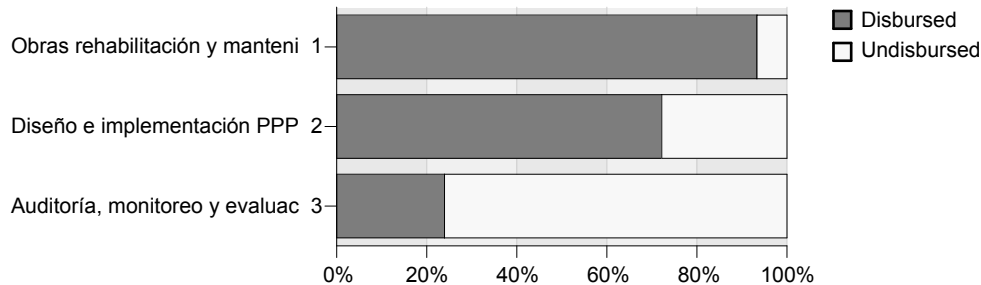

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Conservar el patrimonio vial de la Red Vial Principal

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Valor de Patrimonio Vial Ponderado (PVA/PVM) en la red vial bajo jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	%	0.00	2016	-	P	100.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informe Evolución del Patrimonio Vial, publicado anualmente por la DNV

**Observations:** En elaboración

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			
	No		

**General Development Objectives Nbr. 1:** Disminuir la accidentalidad en la Red Vial Principal

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Índice de accidentes con víctimas (muertos y heridos) en corredores internacionales del país (accidentes por millón de vehículos)	índice	31.40	2016	-	P	27.20
						A	

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas oficiales de accidentes Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			
	No		

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Disminución de los costos de transporte

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Costo de Operación Vehicular (COV) de los tramos intervenidos por el programa (US\$ constantes/vehículo-km) [Valores Promedio por tipo de vehículo]	US\$ constantes/vehículo-km	0.81	2016	P		0.81
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación económica ex post a ser elaborado por el ejecutor aplicando el Highway Development and Management (HDM 4) Corporación Vial de Uruguay (CVU) - DNV

**Observations:** Se toma valor promedio por tipo de vehículo

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa (min/km)	min-km	1.00	2016	P		1.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación económica ex post a ser elaborado por el ejecutor conteniendo aplicando el HDM-4 CVU - DNV

**Observations:** En elaboración

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Incremento del financiamiento privado a la infraestructura vial

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.0	Inversiones en infraestructura vial provenientes de fuentes de financiamiento privado (en millones de dólares)	MUSD	0.00	2016	P		500.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Valor de las ofertas de las firmas adjudicatarias de las Participaciones Público Privadas (PPP) más valor de las emisiones en la Bolsa de los instrumentos estructurados por CVU

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 C1 - Rehabilitación y Conservación de la Red Vial Principal (RVP)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
1.1	Km de caminos interurbanos rehabilitados y/o mantenidos por el programa	Km	P		400		85,300,000
			P(a)	10	519	8,160,716	85,300,000
			A	28	537	6,151,134	83,290,418
1.2	Informes de avance del programa presentados a satisfacción del Banco	informes	P		8		1,400,000
			P(a)	1	8	361,800	1,400,000
			A	1	8	361,800	1,400,000
1.3	Informe conteniendo metodología para evaluación técnica, económica y ambiental de alternativas tecnológicas de repavimentación	informes	P		1		220,000
			P(a)	1	1	220,000	220,000
			A	0	0	0	0
1.4	Auditorías de seguridad vial para los corredores incluidos en el programa	Auditorías	P		4		880,000
			P(a)	4	4	855,697	880,000
			A	0	0	0	24,303

## Component Nbr. 2 C2 - Apoyo técnico y financiero a: (i) el diseño, evaluación y estructuración de proyectos viales a ser financiados por PPP; y (ii) a la estructuración de otros instrumentos financieros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
2.1	Número de estudios de diseño, evaluación y estructuración de proyectos viales a ser contratados como PPP	Estudios	P		5		1,200,000
			P(a)	0	34	135,600	1,200,000
			A	0	34	25,500	1,089,900
2.2	Número de operaciones estructuradas por la CVU de acceso al mercado de capitales (emisión de obligaciones negociables o similares)	Operaciones	P		1		400,000
			P(a)	0	3		530,650
			A	0	3	0	557,500

## Total Cost

Total Cost	P				89,400,000
	P(a)			9,733,813	89,530,650
	A			6,538,434	86,362,121

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
