

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1136	Chief of Operations Validation Date	03/31/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	03/31/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/06/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Montevideo Urban Sanitation Program (PSU V)	Loan Number	3805/OC-UR
Executing Agency	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	BASANI, MARCELLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El ejecutor cuenta con una adecuada capacidad de gestión y amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos lo cual redunda además en una adecuada implementación y cumplimiento con las salvaguardias ambientales y sociales del Banco. A su vez, esto se respalda mediante profusa documentación que da cuenta de los procesos y medidas implementadas, tanto en la gestión de aspectos ambientales como sociales.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1136	60,000,000	60,000,000	9,800,000	0	69,800,000	60,000,000	22,376,961.9	37.29%	37,623,038.1
Aggregated	60,000,000	60,000,000	9,800,000	0	69,800,000	60,000,000	22,376,961.9	37.29%	37,623,038.1

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

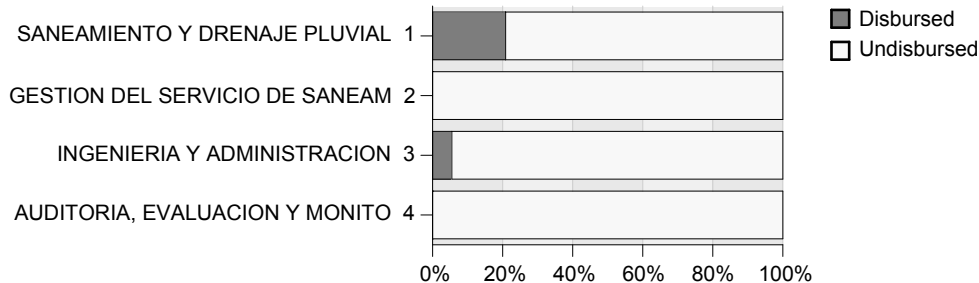

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Calidad de agua de la Bahía de Montevideo

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Carga orgánica diaria vertida a la Bahía de Montevideo en tiempo seco a través del Sistema de Saneamiento.	tonDBO/ día	47.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00
					A	47.00	47.00	47.00	47.00		

Details

Means of verification: Mediciones realizadas por el Laboratorio de calidad ambiental de la Intendencia de Montevideo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Inundaciones en días de lluvias fuertes en Barrio Manga reducidas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Porcentaje de días al año con lluvias fuertes en que el Barrio Manga se inunda.	% de días	100.00	2016	P	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
					A	100.00	100.00	100.00	100.00		

Details

Means of verification: Relevamiento del barrio, por parte del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS), luego de evento con lluvias fuertes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Hogares con conexiones habilitadas a redes de saneamiento en área de proyecto Manga y Casabó incrementadas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Porcentaje de hogares con conexión habilitada a redes de saneamiento en el área de proyecto Manga y Casabó.	% de Hogares	0.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	21.00	31.00	43.00
					A		0.00	0.00	10.00		

Details

Means of verification: Datos suministrados por el Servicio de Administración de Saneamiento (SAS) en base al sistema de conexiones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Ingresos por concepto de facturación de tarifa de saneamiento incrementados en Montevideo

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Facturación por concepto de Tarifa de Saneamiento en Montevideo	Millones de pesos	1.41	2015	P	1,527.00	1,649.00	1,781.00	1,923.00	2,077.00	2,243.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.0	Facturación por concepto de Tarifa de Saneamiento en Montevideo	corrientes	1.41	2015	A	1,534.00	1,664.00	1,720.00	1,947.00			
Details												
Means of verification: Datos suministrados por el SAS. Información Anual.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Obras de saneamiento y drenaje pluvial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Número de hogares en la cuenca del Arroyo Miguelete y Cañada Chacarita con aguas residuales tratadas en el Sistema de Disposición Final Oeste.	Households (#)	P	91,600	93,186	0	8,040,000
			P(a)	91,600	93,186	1,820,000	6,168,704.92
			A	0	0	1,808,138.4	4,309,209.52
1.2	Número de hogares con servicio de saneamiento por red en el Barrio de Manga.	# of households	P	0	6,610	9,998,000	24,544,000
			P(a)	0	6,610	4,445,195.57	14,930,299.55
			A	0	0	6,761,442.8	7,407,602.7
1.3	Sistema de drenaje en el barrio Manga construido	Sistema	P	0	1	4,494,000	14,146,000
			P(a)	0	1	5,040,000	15,772,777.75
			A	0	0	6,831,560.83	7,594,816.01
1.4	Reasentamientos y expropiaciones en el barrio Manga realizadas	Familias y terrenos	P	0	19	0	2,000,000
			P(a)	8	19	182,471.06	1,722,562.21
			A	6	19	120,222.29	1,590,123.21

Component Nbr. 2 Componente II. Mejora de la gestión del servicio de saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Catastro actualizado e incorporación y gestión de usuarios especiales implementado	Programas	P	0	2	430,000	1,300,000
			P(a)	0	2		1,300,000
			A	0	0	0	0
2.2	Programa de conexiones intradomiciliarias diseñando e implementado en Manga y Casabó.	Programas	P	0.49	2.21	830,000	2,000,000
			P(a)	0.49	1.24	0	1,999,999
			A	0.02	0.02	0	42,273

Other Cost

	Ingeniería y Administración	P			2,023,000	5,620,000
		P(a)			1,850,833.33	8,894,354.02
		A			1,651,116.04	3,382,684.02
	Auditoría, Evaluación y Monitoreo	P			10,000	200,000
		P(a)			10,000	198,598.76
		A			8,600.3	18,128.76
	Sin asignación específica	P			3,708,000	7,650,000
		P(a)			0	7,650,000
		A			0	0
	Costos financieros	P			1,287,000	4,300,000
		P(a)			389,604.88	4,786,983.08
		A			492,984.88	1,565,332.69

Total Cost

	Total Cost	P			22,780,000	69,800,000
		P(a)			13,738,104.84	63,424,279.29
		A			17,674,065.54	25,910,169.91

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Número de hogares con servicio de saneamiento por red en el Barrio de Manga.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/25/2021
			Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/25/2021
	Número de hogares en la cuenca del Arroyo Miguelete y Cañada Chacarita con aguas residuales tratadas en el Sistema de Disposición Final Oeste.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/17/2021
	Programa de conexiones intradomiciliarias diseñando e implementado en Manga y Casabó.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/17/2021
			Modify Physical EOP P	SANTIAGOED	03/04/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/17/2021
			Modify Physical P value	SANTIAGOED	03/04/2021
	Reasentamientos y expropiaciones en el barrio Manga realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/17/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SANTIAGOED	03/04/2021
	Sistema de drenaje en el barrio Manga construido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/25/2021
			Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/25/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Project Design
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
