

PMR Public Report

Operation Number	GU-X1005	Chief of Operations Validation Date	04/07/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/07/21
Last Update	03/31/21	Country Representative Validation Date	04/08/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Program for Human Development	Loan Number	GRT/WS-11905-GU
Executing Agency	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION
Team Leader	GOBITZ, HUMBERTO A.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	Guatemala
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	GU-L1039
Borrower			


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La clasificacion es PS debidoo a: (i) negativa de la Municipalidad de San Pedro de otorgar el permiso de construcción para la PTAR en Chivisgüe, que aunque es de la Municipalidad de San Marcos, esta físicamente en la otra jurisdicción municipal; (ii) Se tienen desacuerdos y conflictos con algunos propietarios que viven alrededor de los terrenos de las obras, quienes han denegado el acceso a través de sus propiedades; o propietarios que no están anuentes a ceder el derecho de paso o se oponen a la construcción de la obra, como el caso de la PTAR de Chivisgue donde existe ese problema por inconformidad por los malos olores; desacuerdos entre jurisdicciones municipales para la ubicación de la PTAR de Chivisgüe en San Pedro Sacatepequez condicionando el permiso de construcción hasta que la municipalidad de San Marcos limpie el relleno sanitario a mediados de dic.2020. (iii) Debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19 y las dificultades para resolver los derechos de paso por propiedades privadas se están experimentando retrasos en la ejecución de las obras mayores; lo cual ha conllevado a que, para la fecha del contrato del Programa, que expiró en 10/31/2020, se haya dado una extensión de tiempo para poder finalizarlo hasta el 1 0/31/2022.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1039	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	39,600,000	79.20%	10,400,000
GU-X1005	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	30,800,000	61.60%	19,200,000
Aggregated	50,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	70,400,000	70.40%	29,600,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

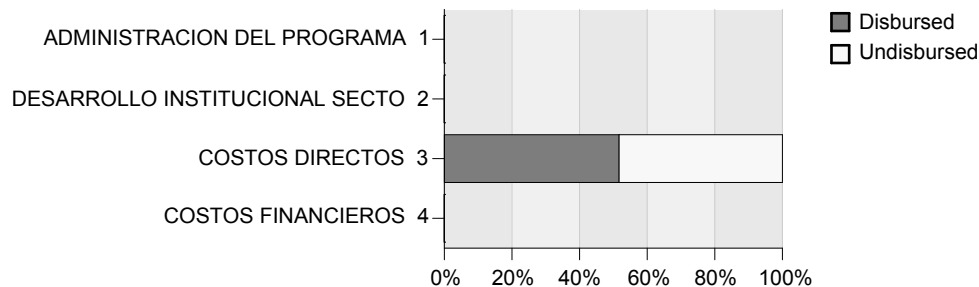

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Publica y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Rectoria sectorial fortalecida y funcionando	Entidades	0.00	2012	P					1.00						1.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Details																
Means of verification: Documentos Legales del Ministerio de Salud creando la direccion de Direccion de agua potable y saneamiento, para ejercer la rectoria del sector.																
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No								

Specific Development Objectives Nbr. 2: Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Entidad ejecutora de Programas sectoriales autonoma funcionando	Entidad	0.00	2012	P					1.00						1.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Details																
Means of verification: Informe de desempeño del Programa a los 5 años de la firma del contrato del contrato de préstamo o cuando se hayan alcanzado el 75 % de avance.																
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No								

Specific Development Objectives Nbr. 3: Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Hogares rurales con sistema de agua potable contruídos o rehabilitados	# of households	0.00	2012	P	200.00	4,600.00	4,600.00	4,700.00	4,160.00						18,260.00
					A	42.00	745.00	789.00	0.00	1,311.00	3,206.00	1,595.00	0.00	0.00		7,688.00
Details																
Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector																
Observations: En la matriz de resultado original, se habían expresado los resultados en forma de porcentaje y número de beneficiarios, por lo que se ha utilizado la ponderación de hogares en función de la tasa promedio definida por la Encuesta Nacional de Vivienda 2011																
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruídos o rehabilitados	# of households	0.00	2012	P		0.00	6,000.00	15,000.00	5,000.00						26,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00		982.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details																
Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector																
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.2	Hogares rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	# of households	0.00	2012	P	300.00	5,800.00	5,800.00	6,000.00	5,340.00						23,240.00
					A	209.00	546.00	789.00	0.00	1,250.00	5,142.00	3,766.00	0.00	0.00		11,702.00
Details																
Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector																
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.4	Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	# of households	0.00	2012	P	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	7,000.00						34,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00		982.00
Details																
Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector																
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.4	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	# of households	0.00	2014	P											
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00		982.00
Details																
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	0	0	1,500,000
			A	0	0	0	0
1.2	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	0	0	1,127,664
			A	0	0	0	1,127,664
1.3	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P		1		700,000
			P(a)	0	1	0	700,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P		335		3,400,000
			P(a)	0	46	0	9,604
			A	0	46	0	9,604
2.2	Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanos	sistemas	P		32		3,000,000
			P(a)	0	17	0	886,085.03
			A	0	17	0	886,085.03
2.3	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P		220		34,908,000
			P(a)	2	56	1,059,501.53	21,853,621.92
			A	0	53	1,091,296	20,389,282.92
2.4	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	sistemas	P		280		23,272,000
			P(a)	2	76	344,613.59	8,990,933.24
			A	0	74	291,368	8,876,712.24
2.5	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		13,272,000
			P(a)	0	8	5,294,710.9	22,494,598.16
			A	0	2	5,419,895	11,211,738.16
2.6	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		8,848,000
			P(a)	0	9	9,740,026.07	35,571,383.85
			A	0	3	7,750,242	16,501,213.85

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P		280		4,000,000
			P(a)	1	113	21,322	1,134,946.55
			A	0	111	67,781	1,063,148.55
3.2	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P		84,000		1,000,000
			P(a)	52	60,508	21,322	982,356.72
			A	0	60,103	68,076	910,559.72
3.3	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P		32		1,500,000
			P(a)	3	9	55,261	287,369.65
			A	3	3	70,680	184,149.65
3.4	Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P		320		500,000
			P(a)	30	90	55,261	281,497.69
			A	30	30	70,680	178,277.69

Component Nbr. 4 Administración del programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración del Programa	P				2,600,000
		P(a)			484,285	4,179,939.19
		A			489,162	3,437,433.49

Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			17,076,303.09	100,000,000
		A			15,319,180	64,775,869.3

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Personas de la municipalidad capacitadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruídos o rehabilitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruídos o rehabilitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruídos o rehabilitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
	Sistemas rurales de agua potable contruídos o rehabilitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/24/2021
Specific Development Objective	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ADELAA	03/24/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Project Management Capacity
