

PMR Public Report

Operation Number	PN-L1121	Chief of Operations Validation Date	04/30/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/26/21	Country Representative Validation Date	05/12/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Sanitation Program for the Districts of Arraijan and La Chorrera - Stage 1	Loan Number	3799/OC-PN, 3799/OC-PN-1, 3799/OC-PN-2
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	CEVALLOS VAREA, MARCO ANTONIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación ha sido aprobada por la Dirección del Banco en cumplimiento con las políticas (se prepararon estudios socioambientales y se realizaron consultas) y no ha iniciado ejecución en campo		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1121	150,000,000	150,000,000	240,123,158	250,000,000	640,123,158	150,000,000	2,997,218.87	2.00%	147,002,781.13
Aggregated	150,000,000	150,000,000	240,123,158	250,000,000	640,123,158	150,000,000	2,997,218.87	2.00%	147,002,781.13

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

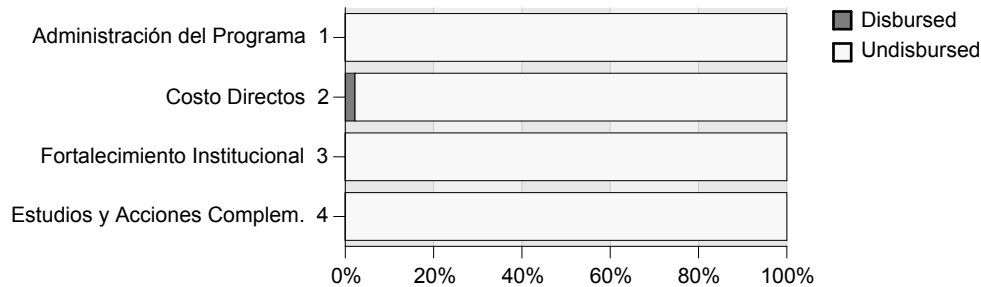

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a apoyar niveles mínimos de consumo de las personas en pobreza, pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad frente a la crisis causada por el COVID-19 en Panamá

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Nivel de ingreso de familias vulnerables (seis deciles más bajos de ingresos por hogar) respecto a nivel de ingreso de familias no vulnerables (cuatro deciles más altos) 12 meses después de inicio de la crisis	%	23.00	2017	2021	P	23.00
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar niveles mínimos de ingreso de las personas afectadas por el COVID-19 en el período inmediato y durante la recuperación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Población en pobreza y pobreza extrema que recibe transferencias monetarias financiadas por el proyecto a través de los pogramas de la red de protección social del país	%	20.00	2020	P		15.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	Población beneficiaria del programa Vale Digital que realiza al menos una compra durante el período en que se apoya el programa con recursos de la operación (beneficiarios activos).	%	79.00	2021	P		79.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 PSACH

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Paquete de Estudios y Diseños completados	Estudios	P	0	1	916,552.37	26,525,968
			P(a)	0	1	916,552.37	26,525,968
			A	0	0	916,552.37	3,166,378.77

Component Nbr. 2 Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Mujeres beneficiarias de programas de transferencias monetarias existentes (Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Bono Alimentario) que reciben transferencias regulares durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la crisis causada por el coronavirus.	# of beneficiaries	P	0	107,270	0	33,607,427.8
			P(a)	0	107,270	0	33,607,427.8
			A	0	0	0	0
2.2	Hombres beneficiarios de programas de transferencias monetarias existentes (Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Bono Alimentario) que reciben transferencias regulares durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la	# of beneficiaries	P	0	6,205	0	16,552,912.2
			P(a)	0	6,250	0	16,552,912.2
			A	0	0	0	0
2.3	Personas con discapacidad beneficiarias del programa Ángel Guardián que reciben transferencias regulares durante los meses de emergencia sanitaria o recuperación.	# of beneficiaries	P	0	19,107	0	4,585,680
			P(a)	0	19,107	0	4,585,680
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Protección para población vulnerable que no se encuentra en los padrones de programas de transferencias, y que trabajaba en el sector informal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Personas del sector informal o trabajadores independientes acreditadas en el programa Vale Digital que realiza al menos una compra financiada con el proyecto durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la crisis causada por el coronavirus.	# of beneficiaries	P	0	549,424	0	54,942,410
			P(a)	0	549,424	0	54,942,410
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Protección para población vulnerable que no se encuentra en los padrones de programas de transferencias, y que ya no trabajan en el sector formal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Personas del sector formal acreditadas en el programa Vale Digital que realiza al menos una compra financiada con el proyecto durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la crisis causada por el coronavirus.	# of beneficiaries	P	0	137,356	0	13,735,602
			P(a)	0	137,356	0	13,735,602
			A	0	0	0	0

Other Cost

Auditoría y evaluación	P			0	50,000
	P(a)			0	50,000
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			916,552.37	150,000,000
	P(a)			916,552.37	150,000,000
	A			916,552.37	3,166,378.77

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design
