

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1372	Chief of Operations Validation Date	10/19/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	Loan Number	3129/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DO PARANA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O Executor segue com dificuldades de engajamento das equipes sociais locais que implementam e acompanham as ações de reassentamento e pós reassentamento dos projetos em curso, o que representam um total de 465 famílias, especificamente as equipes dos CRAS municipais que priorizam as demandas ligadas à pandemia de covid-19 nos municípios. Da mesma forma, permanece a dificuldade de monitorar a implantação dos requisitos ambientais e sociais pelas empresas executoras, gerando o não cumprimento de medidas de boas práticas ambientais nas frentes de obras, tais como: gestão de resíduos, correção de processos erosivos e isolamento de áreas em obras. A implementação de medidas corretivas aos processos de erosões de solo que requerem novas soluções construtivas, exigem que o Executor defina e implemente um Plano de Ação bem alinhado entre equipes de obras e sociais para a conclusão a contento das obras e das etapas do reassentamento. Considerando a permanência das dificuldades já apontadas em outras missões - dificuldade de monitoramento dos aspectos ambientais e sociais, dificuldade de engajamento com as equipes municipais – e considerando-se a situação dos processos erosivos de solo em curso que ainda requerem solução, classifica-se a operação como Parcialmente Insatisfatória.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	54,552,746.82	90.92%	5,447,253.18
Aggregated	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	54,552,746.82	90.92%	5,447,253.18

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

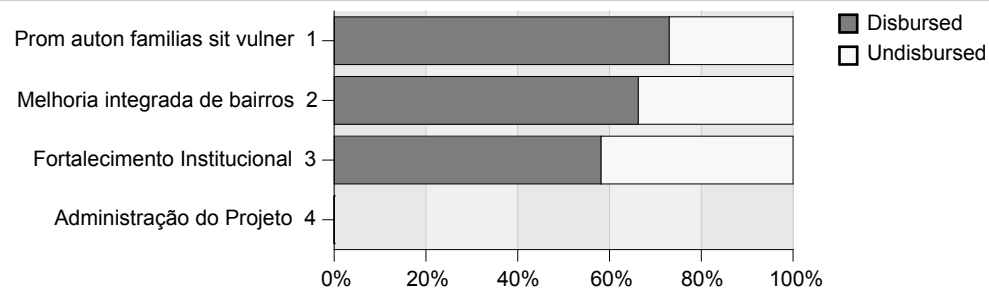

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Condição de vida das famílias mediante ações do Governo melhoradas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados	%	30.00	2016	2022	P	60.00
						A	

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria	%	53.00	2016	2022	P	68.90
						A	

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%	0.00	2014	P					60.00
					A		0.00			
Details										
Means of verification: Sistema de informação do Programa										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%	0.00	2014	P					60.00
					A		0.00			
Details										
Means of verification: Sistema de informação do Programa										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%	0.00	2014	P					50.00
					A		0.00			
Details										
Means of verification: Sistema de informação do Programa										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	P					100.00
					A		0.00			
Details										
Means of verification: Relatório semestral do Programa										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a água potável no domicílio	%	50.00	2014	P					100.00
					A		0.00			
Details										
Means of verification: Relatório semestral do Programa										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0.00	2014	P					90.00
					A		0.00			
Details										
Means of verification: Testes de conhecimento										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiária elaborados	# of beneficiaries	P		22,000		14,410,366
			P(a)	800	23,171	1,032,194.33	10,556,136.58
			A	1,364	23,735	68,687.09	9,592,629.34
1.2	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Municípios	P		130		8,774,200
			P(a)	0	130	0	10,787,522.97
			A	27		319,886.06	11,107,409.03
1.3	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P		53		10,781,000
			P(a)	53	53	1,000,000	10,644,058.29
			A	67	406	241,907.51	9,885,965.8
1.4	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Famílias	P		40,000		10,000,000
			P(a)	20,000	40,000	650,000	15,047,895.21
			A	11,196		405,142.39	14,803,037.6
1.5	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P		3,480		2,522,478
			P(a)	900	3,577	100,000	699,465.6
			A	0	2,577	0	546,465.6
1.6	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P		5,600		7,256,760
			P(a)	70	5,600	600,197.53	4,968,745.52
			A	217	5,735	217,493.32	4,386,041.31
1.7	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	Famílias	P		560		2,522,154
			P(a)	560	560	448,000	448,000
			A	0	0	0	0
1.8	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	Famílias	P		0		0
			P(a)	150,000	150,000	4,500,000	4,500,000
			A	0	0	0	0
1.9	Incentivos fundo a fundo emergencial aos municípios (por COVID-19)	Municípios	P		0		0
			P(a)	0	242	0	1,985,175.83
			A	0	242	0	1,985,175.83
1.10	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas em 243 municípios (Por COVID 19)	capacitações	P		0		0
			P(a)	2,500	3,500	440,000	630,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P		594		17,940,000
			P(a)	249	915	3,800,000	14,890,331.09
			A	0	545	2,592,471.46	10,837,672.3
2.2	Lotes regularizados	Lotes	P		328		6,560,000
			P(a)	188	535	2,940,000	15,119,321.35
			A	0	53	1,429,113.83	9,243,304.93
2.3	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P		22		6,361,544
			P(a)	2	22	375,000	5,181,559.98
			A	1	13	108,680.84	3,040,240.82
2.4	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P		8		3,238,498
			P(a)	1	8	166,000	1,908,787.58
			A	1	6	42,348.14	1,445,135.72

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	Investigações e estudos realizados	Estudos	P		7		1,620,000
			P(a)	1	7	35,900	327,761.84
			A	0	5	2,579.42	274,441.26
3.2	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P		12,300		2,113,000
			P(a)	1,000	12,300	524,060.3	1,886,730.46
			A	1,914	7,982	267,224.57	1,266,224.73
3.3	Módulos do Sistema de informações Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P		6		900,000
			P(a)	1	6	87,647.29	418,507.7
			A	0	5	890.86	313,243.61

Component Nbr. 4 Componente IV: Administração do Projeto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

Administração		P				4,000,000
		P(a)			0	0
		A				0
Contingencia		P				1,000,000
		P(a)			0	0
		A				0

Total Cost

Total Cost		P				100,000,000
		P(a)			16,698,999.45	100,000,000
		A			5,696,425.49	78,726,987.88

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/06/2021

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Technical Design
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Human Resources
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Cost and Budgetary Aspects
