

PMR Public Report

Operation Number	CO-G1017	Chief of Operations Validation Date	10/29/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	10/29/21
Last Update	10/28/21	Country Representative Validation Date	11/02/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program of Drinking Water and Sanitation for the Department of La Guajira	Loan Number	GRT/CF-18453-CO
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Team Leader	ORELLANA AREVALO, EDGAR R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	Colombia
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	CO-L1242, CO-J0009
Borrower			


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto todavía no ha iniciado ejecución de actividades en terreno. El primer desembolso se realizará en diciembre de 2021.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-G1017	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	250,000	5.00%	4,750,000
CO-J0009	7,750,000	7,750,000	0	0	7,750,000	7,750,000	0	0.00%	7,750,000
CO-L1242	104,567,330.77	52,072,625.77	0	5,000,000	57,072,625.77	52,072,625.77	0	0.00%	52,072,625.77
Aggregated	117,317,330.77	64,822,625.77	0	5,000,000	69,822,625.77	64,822,625.77	250,000	0.39%	64,572,625.77

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

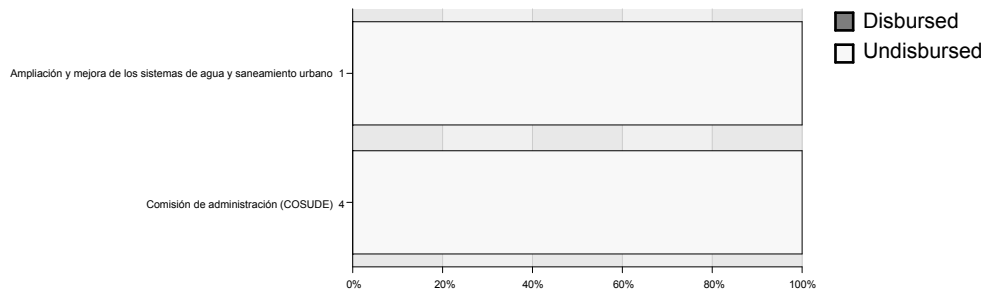

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa Guajira Azul del Gobierno Nacional, de incrementar la población atendida con agua apta para el consumo humano, con continuidad y adecuado saneamiento.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Cobertura de AP en el área urbana del departamento de La Guajira	%	20.00	2019	2025	P	38.00
						A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación final en base a datos del MVCT

Observations: Se considera cobertura de AP el acceso domiciliario con una continuidad mínima de 8 h/día y calidad de acuerdo con la norma nacional.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Cobertura de saneamiento en el área urbana del departamento de La Guajira	%	25.00	2019	2025	P	27.00
						A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación final en base a datos del MVCT

Observations: Se considera cobertura de saneamiento al acceso domiciliario a redes de alcantarillado con el correspondiente tratamiento de aguas residuales o a soluciones individuales queden un adecuado tratamiento a los lodos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de Agua Potable (AP) y saneamiento, en poblaciones urbanas del Departamento de La Guajira, y en particular en aquellas más afectadas por los recientes flujos migratorios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fonseca)	# of households	0.00	2019	P						9,463.00	9,463.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 12 h/día.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

	Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP				P					500.00	500.00
					A						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.1	Continuidad promedio del servicio de AP en áreas de intervención del Programa (Fonseca)	Horas/día	8.00	2019	P						16.00	16.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte del prestador

Observations: La continuidad se refiere a la suma del número de horas con disponibilidad de agua/día.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillado en el barrio El Carmen (Fonseca)	# of households	0.00	2019	P						680.00	680.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.3	Hogares protegidos de riesgo de inundación para el período de retorno de 25 años (Fonseca)	# of households	0.00	2019	P						680.00	680.00
					A							0.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details												
Means of verification: Informe semestral de progreso												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.4	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Urumita)	# of households	0.00	2019	P						2,550.00	2,550.00
					A							0.00
Details												
Means of verification: Informe semestral de progreso												
Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 8 horas por día.												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No				
	Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso mejorado al sistema de AP (Urumita)					P					50.00	50.00
						A						0.00
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.5	Continuidad promedio del servicio de AP (Urumita)	Horas/día	2.00	2019	P						8.00	12.00
					A							
Details												
Means of verification: Reporte del prestador												
Observations: La continuidad se refiere a la suma del número de horas con disponibilidad de agua por día.												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.6	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Riohacha)	# of households	0.00	2019	P						46,160.00	46,160.00
					A							0.00
Details												
Means of verification: Informe semestral de progreso												
Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 11 horas por día												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No				
	Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Riohacha)					P					1,500.00	1,500.00
						A						0.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.7	Continuidad promedio del servicio de AP (Riohacha)	Horas/día	6.80	2019	P						11.00	11.00
					A							

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.9	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fuera de la muestra)	# of households	0.00	2021	P						6,000.00	6,000.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Observations: La meta será definida una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fuera de la muestra)				P						600.00	600.00
					A							0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.10	Incremento promedio en la continuidad del servicio de AP (fuera de la muestra)	Horas/día	0.00	2019	P						4.00	4.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte del prestador

Observations: La línea de base y la meta serán definidas una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.11	Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillado (Fuera de la muestra)	# of households	0.00	2021	P						600.00	600.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Observations: La meta será definida una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la capacidad de gestión de los prestadores locales y apoyar el proceso de regionalización de estos.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Índice de recaudación (importe total cobrado / importe total facturado) (Urumita)	%	35.00	2020	P					60.00	60.00
					A						

Details

Means of verification: Estados financieros anuales operador

Observations: La meta se revisará cuando se haga el plan de aseguramiento de la prestación de Urumita.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Pérdidas por usuario facturado (Riohacha)	M3/usuario/mes	28.10	2019	P					17.00	17.00
					A						

Details

Means of verification: Informes anuales del operador

Observations: https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_688_de_2014_Firmada.pdf

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	% de participantes mujeres en las campañas para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso	%	0.00	2019	P			50.00	50.00	50.00	50.00
					A						

Details

Means of verification: Informes/actas de las campañas

Observations: # de mujeres participantes en campañas/ # total de participantes en campañas

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.8	% de participantes mujeres en cursos de capacitación técnica en plomería y albañilería	%	0.00	2019	P					30.00	30.00
					A						

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Informes/actas de las campañas

Observations: # de mujeres participantes en cursos / # total de participantes en cursos

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.12	Análisis de calidad del agua realizados por la unidad móvil de asistencia técnica, en zonas de intervención del Programa (Fuera de la muestra)	Número de análisis/año	0.00	2019	P					25.00	25.00	50.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Informes empresa departamental de AyS de La Guajira

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento urbano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.1	Sistema de agua potable de Urumita mejorado	Sistema	P		1		2,314,115
			P(a)		1		2,314,115
			A		0		0
1.2	Sistema de agua potable de Fonseca ampliado y mejorado	Sistema	P		1		11,462,587
			P(a)		1		11,462,587
			A		0		0
1.3	Sistema de alcantarillado de Fonseca construido	Sistema	P		1		3,563,144
			P(a)		1		3,563,144
			A		0		0
1.4	Sistema de agua potable de Riohacha mejorado	Sistema	P		1		11,488,625
			P(a)		1		11,488,625
			A		0		0
1.5	Sistemas de agua potable mejorados o ampliados	Sistema	P		3		20,919,415
			P(a)		3		20,919,415
			A		0		0
1.6	Sistemas de alcantarillado mejorados o ampliados	Sistema	P		1		4,592,805
			P(a)		1		4,592,805
			A		0		0
1.7	Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados	Diseño	P		4		736,974
			P(a)		4		736,974
			A		0		0
1.8	Cursos de capacitación técnica en plomería y albañilería	Curso	P		3		51,568
			P(a)		3		51,568
			A		0		0
1.9	Gerencia Integral del Programa (GIP)	Contrato	P	1	1	143,246	6,106,397
			P(a)	1	1	143,246	6,106,397
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Apoyo a la mejora de la gestión institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.1	Sistema de gestión comercial del operador de Urumita mejorado	Sistema	P		1		204,312
			P(a)		1		204,312
			A		0		0
2.2	Unidad móvil de asistencia técnica para la empresa regional (departamental) adquirida	Und.	P		1		204,312
			P(a)		1		204,312
			A		0		0
2.3	Plan de Comunicación del Programa desarrollado e implementado	Plan	P		1		204,311
			P(a)		1		204,311
			A		0		0
2.4	Campañas con enfoque de género para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso desarrolladas e implementadas	Campaña	P		3		306,468
			P(a)		3		306,468
			A		0		0
2.5	Kit de medición de calidad de agua para Corpo Guajira adquiridos	Kit	P		1		102,156
			P(a)		1		102,156
			A		0		0

Other Cost

	Administración UCP	P			174,961	1,914,343.77
		P(a)			174,961	1,914,343.77
		A				0
	Evaluación	P				114,548
		P(a)				114,548
		A				0
	Auditorías	P			28,649	286,545
		P(a)			28,649	286,545
		A				0
	Comisión administración PSG (CO-G1017)	P			250,000	250,000
		P(a)			250,000	250,000
		A				

Total Cost

	Total Cost	P			596,856	64,822,625.77
		P(a)			596,856	64,822,625.77
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Legal Environment
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
