

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1125	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/24/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/30/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	<b>Loan Number</b>	3104/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	<b>Sector/Subsector</b>	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
<b>Team Leader</b>	ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Colombia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Se avanzó con el cumplimiento del Plan de Acción Correctivo de mayo 2021 dentro del cronograma acordado. Se tiene una nueva ubicación para el proyecto de la toma de agua para la planta desalinizadora, se han realizado los estudios socio ambientales y se cuenta con la licencia de Coralina para el punto de toma y se está tramitando la licencia para el punto de vertimiento. La tormenta IOTA impactó la isla y la infraestructura del Programa para lo que se realizó un inventario de daños y plan de respuesta de emergencia que está siendo aplicado.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1125	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	42,985,828.45	61.41%	27,014,171.55
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	42,985,828.45	61.41%	27,014,171.55

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

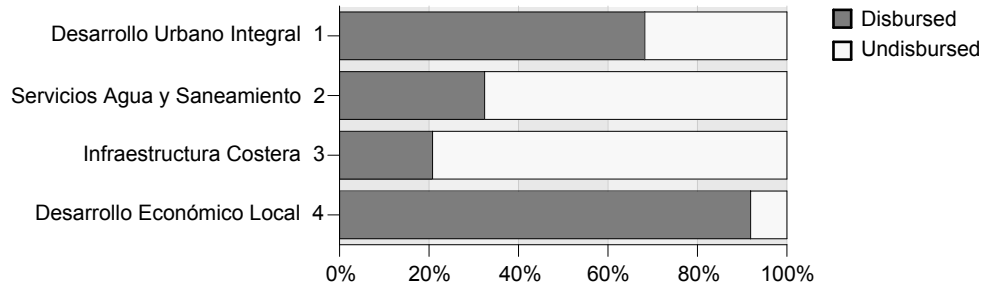

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.90	2013	2022	P	75.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.60	2011	P									30.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Details														
Means of verification: Encuesta de calidad de vida del DANE														
Observations: El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Millones de pesos	64.65	2013	P									93.10
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Details														
Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45.00	2013	P									57.80
					A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Details														
Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Micro y pequeñas empresas desarrolladas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.70	2012	P									47.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Details														

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 4:** Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	# of households	800.00	2013	P	1,000.00	1,500.00	2,000.00					2,500.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7.00	2013	P	7.00	10.00	11.00					12.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 5:** Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
5.1	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	IDF	55.54	2012	P								59.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Desarrollo Urbano Integral

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P		6		12,600,000
			P(a)	1	8	3,133,982	20,637,019
			A	1	7	0	11,921,302
1.2	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P		3		200,000
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	3	0	0
1.3	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	Km	P		0.9		6,753,000
			P(a)	0	0.9	0	148,626
			A	0	0	0	148,626
1.4	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P		1		2,457,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P		1		2,490,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P		25		6,335,000
			P(a)	0	25	5,110,747.15	22,726,985.15
			A	0	0	926,087	2,712,218
2.2	Redes rehabilitadas	Km	P		25		7,919,000
			P(a)	12	39.5	4,051,978.71	12,922,242.71
			A	15	42.5	1,725,540	10,595,804
2.3	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P		1		4,387,000
			P(a)	0	1	0	1,609,329
			A	0	1	0	1,609,329
2.4	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P		1		1,663,000
			P(a)	0	0	1,202,824	2,469,659
			A	1	1	319,358	586,193

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P		3		4,800,000
			P(a)	0	3	0	926,032
			A	0	3	0	926,032
3.2	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P		1.1		3,200,000
			P(a)	0	1.1	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P		4		500,000
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P		3		200,000
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
4.1	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	# of beneficiaries	P		90		240,000
			P(a)	0	90	0	0
			A	0	56	0	0
4.2	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	# of MSMEs	P		95		4,760,000
			P(a)	0	151	0	2,774,055
			A	329	480	0	2,774,055

## Component Nbr. 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
5.1	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P		30		210,000
			P(a)	0	11	0	107,824
			A	19	19	0	5,894
5.2	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P		1		340,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
5.3	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
5.4	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P		30		600,000
			P(a)	0	37	0	164,223
			A	0	37	0	164,223
5.5	Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P				4,500,000
		P(a)			2,193,594.14	4,952,117.14
		A			407,725	2,936,010
	Auditoria	P				500,000
		P(a)			154,049	561,888
		A			0	281,310

Total Cost

	Total Cost	P				70,000,000
		P(a)			15,847,175	70,000,000
		A			3,378,710	34,660,996

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	09/14/2021
	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	09/14/2021
	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	AGIRALDO	09/28/2021

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		-	
	1.2	Management Strategy	Status
		-	
	1.3	Management Strategy	Status
		-	
	1.4	Management Strategy	Status
		-	
	1.5	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Political Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		-	
	2.2	Management Strategy	Status
		-	
	2.3	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
4	Active	Environmental and Social Safeguards
	<b>Response actions</b>	
	4.1	Management Strategy
		Status
		-
	4.10	Management Strategy
		Status
		-
	4.2	Management Strategy
		Status
		-
	4.3	Management Strategy
		Status
		-
	4.4	Management Strategy
		Status
		-
	4.5	Management Strategy
		Status
		-
	4.6	Management Strategy
		Status
		-
	4.7	Management Strategy
		Status
		-
	4.8	Management Strategy
		Status
		-
	4.9	Management Strategy
		Status
		-
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
5	Inactive	Goods, and Services

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		-	
	5.2	Management Strategy	Status
		-	
	5.3	Management Strategy	Status
		-	
	5.4	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		-	
	6.2	Management Strategy	Status
		-	
	6.3	Management Strategy	Status
		-	
	6.4	Management Strategy	Status
		-	
	6.5	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Legal Environment
	Response actions		

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	7.1	Management Strategy	Status
		-	
	7.2	Management Strategy	Status
		-	
	7.3	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		-	

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Stakeholder Priorities
