

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	HA-L1103	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/22/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/01/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Port-au-Prince Water and Sanitation Project III	<b>Loan Number</b>	4353/GR-HA
<b>Executing Agency</b>	DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	PEREZ MONFORTE, SERGIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Grant Financing Product	<b>Country</b>	Haiti
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLIQUE D'HAITI		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	L'Unité d'Exécution du Projet de l'Agence d'Exécution (AE) continue la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du programme. Des consultations publiques additionnelles sont prévues pour les composantes du Programme qui vont se dérouler à Carrefour (Métropole de Port-au-Prince). Les projets en milieu semi ruraux et ruraux vont démarrer fin octobre 2021. Le contrat de la consultante internationale environnementale et sociale (E&S) est terminé et l'AE/DINEPA n'a pas encore recruté son remplaçant, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de livrable à préparer, donc la spécialiste de l'équipe de l'AE continue seule comme responsable des aspects E&S. Des améliorations ont été apportées en ce qui concerne les consultations et la documentation. Pour les travaux achevés, Le PGES des travaux ont été correctement mis en œuvre en conformité avec leur contenu validé au préalable.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1103	0	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	14,969,060.06	23.03%	50,030,939.94
<b>Aggregated</b>	<b>0</b>	<b>65,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>14,969,060.06</b>	<b>23.03%</b>	<b>50,030,939.94</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

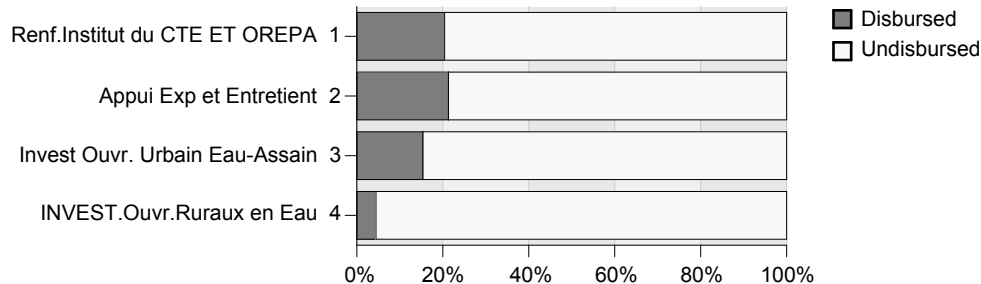

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

No information available for this section

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Résultat I : La DINEPA exerce une réglementation effective au niveau de la DINEPA centrale et la déconcentration au niveau de l'OREPA-Ouest.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
0.0	Nombre de CTEs de la DINEPA qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	CTE	0.00	2016	P					0.00			
					A		0.00	9.00					10.00
Details													
Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
0.1	Nombre de structures de l'OREPA Ouest qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de regulation et de planification	Unité	0.00	2016	P	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00			2.00
					A	0.00	1.00	1.00					0.00
Details													
Means of verification: Rapport annuel de la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Résultat II : Le CTE-RMPP améliore sa viabilité financière

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.1	Nombre de connexions domiciliaires et commerciales actives au CTE-RMPP	Connection active	46,000.00	2016	P	46,000.00	48,250.00	54,740.00	61,640.00	68,200.00			68,200.00
					A	46,000.00	48,000.00	50,868.00	50,015.00			46,000.00	
Details													
Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/Jour	103,000.00	2016	P	103,000.00	159,000.00	169,000.00	183,000.00	183,000.00			183,000.00
					A	103,000.00	130,000.00	114,660.00	94,570.00			103,000.00	
Details													
Means of verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No				

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.2	Indice de recouvrement du CTE-RMPP (% de paiement des factures)	%	54.00	2016	P	54.00	59.00	63.00	66.00	71.00			71.00
					A	54.00	51.00	46.74	46.14				54.00

#### Details

**Means of verification:** Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
1.3	Ratio d'exploitation du CTE-RMPP (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles)	Ratio	0.67	2016	P	0.67	0.90	1.07	1.22	1.32			1.32
					A	0.67	0.80	0.65	0.80				0.67

#### Details

**Means of verification:** Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Résultat III : L'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d'hygiène se sont améliorés dans la RMPP

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.1	Pourcentage de foyer ayant accès à un service d'eau amélioré	%	44.00	2016	P					44.00			60.00
					A								60.00

#### Details

**Means of verification:** Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.2	Nombre de foyers ayant acces a l'eau potable a domicile	Foyer	92,000.00	2016	P	92,000.00	97,600.00	121,600.00	150,000.00	178,400.00			178,400.00
					A	92,000.00	96,000.00	83,868.00	50,034.00				92,000.00

#### Details

**Means of verification:** Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

		Measure		Year									
2.3	Pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable via un kiosque	%	4.50	2016	P	4.50	5.00	5.50	6.00	6.00			6.00
					A	4.50	5.00	6.70	5.00				0.00
Details													
Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.4	Nombre d'heures par jour d'alimentation des ménages à partir d'une connexion du CTE-RMPP	Heure/Jour	3.30	2016	P	4.00	6.00	9.00	12.00	12.00			12.00
					A	3.30	5.00		8.00				3.30
Details													
Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.5	% de femmes qui travaillent dans des kiosques nouveaux ou réhabilités dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville	%	13.00	2016	P	15.00	18.00	23.00	27.00	35.00			20.00
					A	13.00	14.00	18.00	20.00				13.00
Details													
Means of verification: Rapport du dép. Quartiers Défavorisés du CTE													
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.6	% de ménages qui ont des installations pour le lavage des mains, y compris du savon	%	5.00	2016	P	5.00	15.00	30.00	25.00	20.00			20.00
					A	5.00	6.00						5.00
Details													
Means of verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau													
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
2.7	% de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation	%	75.00	2016	P	75.00	75.00	90.00	85.00	85.00			85.00
					A	75.00	75.00						75.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Details													
<b>Means of verification:</b> Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau													
<b>Pro-Gender</b> No				<b>Pro-Ethnicity</b> No									

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Résultat 4 : L'accès aux services d'eau et d'assainissement et à l'hygiène dans des zones rurales de l'OREPA-Ouest

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'assainissement et de higiene amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00				4,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Details													
<b>Means of verification:</b> Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau													
<b>Pro-Gender</b> No				<b>Pro-Ethnicity</b> No									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2022
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'eau amélioré	Foyer	0.00	2016	P	0.00	500.00	3,500.00	4,000.00				8,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Details													
<b>Means of verification:</b> Enquêtes auprès les foyers et inventaire des points d'eau													
<b>Pro-Gender</b> No				<b>Pro-Ethnicity</b> No									

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Composante I : Renforcement institutionnel du CTE-RMPP et de la DINEPA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	Contats par résultats signés (APP)	Contract	P		1	3,200,000	9,000,000
			P(a)	1	1	100,000	2,500,000
			A	0	0	0	29,823
1.2	OREPA NORD dotée de matériel et de personnel pour acquérir l'éligibilité du projet HA-L1135	Unité	P		1		125,000
			P(a)		1		70,365.24
			A		1	0	70,365.24
1.3	Contrats de consultations d'appui à la DINEPA pour la regulation et le suivi des APP signés	Contrat	P		2	52,500	175,000
			P(a)	1	2	25,000	175,000
			A	0	1	0	0
1.4	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'accès à l'assainissement et l'hygiène , exécutées	Campagne	P	1	2	240,000	510,000
			P(a)	1	1	90,000	240,000
			A	1	1	2,416	2,416
1.5	OREPA Ouest dotée de bâtiment et matériel roulant	Unité	P		3	60,595.6	711,595.6
			P(a)	1	4	423,000	711,595.6
			A	1	4	23,600	203,318.23
1.6	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Unité	P		3	130,000	400,000
			P(a)	1	3	50,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.7	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses structures dotées du matériel et de personnel	Unité	P	2	8	300,000	1,300,000
			P(a)	8	20	1,200,000	2,268,185.44
			A	3	13	775,666	1,743,851.44

## Component Nbr. 2 Composante II : Appui au fonctionnement du CTE-RMPP et à l'entretien

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	Accords de subvention au CTE pour la facture de l'EdH signés	Accord	P		1	250,000	950,000
			P(a)	1	2	400,000	1,100,000
			A	0	1	0	649,240.43
2.2	Contrat d'approvisionnement en combustible signé	Contrat	P		1	250,000	750,000
			P(a)	1	2	50,000	750,000
			A	0	1	0	31,462.53
2.3	CTE-RMPP doté du personnel	Unité	P	1	4	100,000	400,000
			P(a)	1	3	20,000	195,000
			A	1	2	737,930	737,930
2.4	Agences du CTE-RMPP dotées de matériel et du personnel	Agences	P		3	60,000	250,000
			P(a)	2	3	60,000	250,000
			A	1	1	57,750	57,750
2.5	Travaux d'amélioration du service réalisés par le CTE	Unité	P	2	4	325,000	750,000
			P(a)	2	3	325,000	750,000
			A	1	1	26,417	26,417

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Composante III : Investissements dans des travaux relatifs à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	Conduites structurantes et de refoulement installées	ml	P	8,000	17,000	3,865,000	12,500,000
			P(a)	4,000	9,500	3,865,000	19,819,128
			A	0	0	415,590	1,417,376.09
3.2	Réservoirs réhabilités ou construits	Réservoir	P	2	3	1,322,075.7	3,115,252.15
			P(a)	0.5	2	400,000	1,899,520.55
			A	0.5	1	1,683,952	2,908,472.55
3.3	Conduites de distribution installées	ml	P	5,000	9,500	3,535,000	10,100,000
			P(a)	5,000	7,300	3,983,827.64	16,983,827.64
			A	0	0	1,873,538	1,873,538
3.4	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	Unité	P	140	400	2,525,000	7,150,000
			P(a)	4	4	100,000	100,000
			A	0	0	0	0
3.5	Connexions installés au niveau des ménages	Connexion	P	11,000	31,500	1,750,000	4,020,000
			P(a)	8,000	22,000	1,800,000	4,020,000
			A	0	0	0	0
3.6	Armoires électriques et d'automatismes réhabilités	Unité	P	2	2	220,000	220,000
			P(a)	2	2	220,000	220,000
			A	0	0	0	0
3.7	Kiosques construits ou réhabilités	Kiosque	P	30	55	310,000	560,000
			P(a)	15	40	310,000	560,000
			A	0	0	0	0
3.8	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers dévavorisés de la RMPP signés	Contrat	P		5	460,000	1,219,600
			P(a)	2	7	425,000	1,219,600
			A	0	3	14,618	34,011.76
3.9	Contrat de supervision des grands travaux signé	Contrat	P		1	400,000	1,088,235
			P(a)	2	6	400,000	1,088,235
			A	4	8	87,125	144,769.67
3.10	Bâtiment du CTE de Ouanaminthe construit	Unité	P		1		250,000
			P(a)	0	1	25,000	167,068.67
			A	0	1	22,841	164,909.67
3.11	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEF réalisées	Unité	P		3		300,000
			P(a)	0	1	25,000	90,156.61
			A	0	1	0	15,156.61
3.12	Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle réalisée	Campagne	P		1	65,000	100,000
			P(a)	1	1	65,000	100,000
			A	0	0	0	0



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 Composante IV : Investissements dans les domaines de l'eau, assainissement et hygiène dans des zones rurales de l'OREPA OUEST

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
4.1	Outil de planification rural developé	Unité	P	1	1	50,000	100,000
			P(a)	1	1	30,000	100,000
			A	0	0	0	0
4.2	Campagnes d'assainissement et d'hygiène réalisées dans 8 Sections communales de l'OREPA Ouest réalisées	Campagne	P	4	8	236,765	511,765
			P(a)	4	8	236,765	511,765
			A	0	0	0	0
4.3	Réseau d'eau potable construites ou rehabilitées	Unité	P	2	4	230,000	350,000
			P(a)	2	4	230,000	350,000
			A	0	0	0	0
4.4	Points d'eau construites ou rehabilités	Unité	P	10	24	2,175,000	4,450,000
			P(a)	6	17	652,500	4,450,000
			A	5	5	71,650	71,650

## Component Nbr. 5 Composante V : Administration du Projet

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
5.1	Formations et échanges avec opérateurs régionaux réalisées	Unité	P	1	4	75,000	211,500.65
			P(a)	2	4	15,000	211,500.65
			A	0	1	0	61,746
5.2	Unité d'exécution dotée du personnel	Unité	P	1	4	529,000	1,952,051.6
			P(a)	1	4	529,000	1,952,051.6
			A	1	3	432,065	872,186.47
5.3	Unité d'exécution dotée du materiel	Unité	P	1	4	75,000	530,000
			P(a)	1	4	200,000	530,000
			A	1	3	56,991	245,514.65
5.4	Audits et supervisions réalisés	Unité	P	1	4	280,000	950,000
			P(a)	2	4	110,000	950,000
			A	1	2	21,269	104,924.34

## Component Nbr. 6 Composante VI : Mise en œuvre de mesures d'atténuation de la pandémie Covid 19

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
6.1	Points de lavage des mains (PLM) dans les sites critiques, construits et opérés	Nombre PLM	P		0		0
			P(a)		400		367,000
			A		1,000		1,146,375
6.2	Campagnes de divulgation concernant les mesures d'hygiène mises en œuvre	Campagnes	P		0		0
			P(a)	0	1		150,000
			A	0	1	6,804	102,453

## Total Cost

	Total Cost	P			23,070,936.3	65,000,000
		P(a)			16,365,092.64	65,000,000
		A			6,310,222	12,715,657.68

## PMR Public Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	09/29/2021

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	4.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Political Environment
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Environmental and Social Factors
