

PMR Public Report

Operation Number	GU-L1169	Chief of Operations Validation Date	10/01/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Road Infrastructure Development Program	Loan Number	4746/OC-GU
Executing Agency	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Sector/Subsector	TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY
Team Leader	CORTES FORERO, RENE ALEJANDRO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Guatemala
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación ha sido aprobada por la Directiva del Banco en cumplimiento con las políticas y declarado elegible pero no ha iniciado ejecución ni realizado acciones que incidan en su desempeño. Sin embargo, se ha realizado el taller de arranque con participación de ESG y sus especialistas socioambientales participa en la revisión de la documentación de la licitación de la primera obra.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1169	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	5,093,938	3.40%	144,906,062
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	5,093,938	3.40%	144,906,062

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

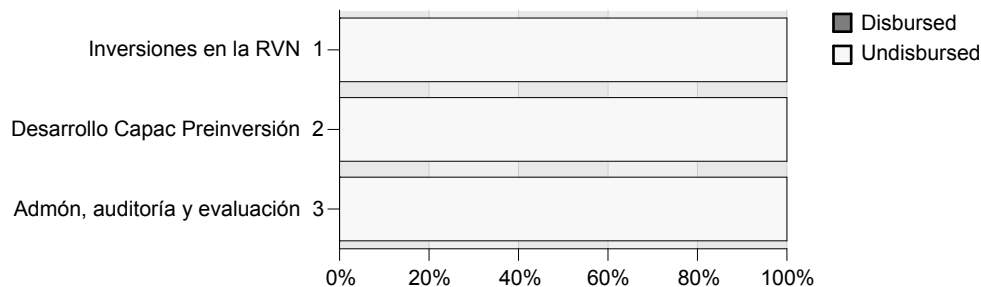

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Movilidad Sostenible de personas y mejora en acceso a servicios básicos y a mercados de consumo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Tiempo Promedio de acceso a los centro de salud y educación	minutos	0.00	2018	2026	P	0.00
						A	

Details

Means of verification: Encuestas

Observations: valores de línea base y metas a ser medidos previo al inicio de obras

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Tiempo promedio de acceso a mercados de consumo	minutos	0.00	2018	2026	P	0.00
						A	

Details

Means of verification: Encuestas

Observations: Se medirá en encuestas de forma desagregada a usuarios (ingreso, ubicación, edad, etc)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Tiempo promedio de acceso a los centros de salud y educación por parte de mujeres	minutos	0.00	2018	2026	P	0.00
						A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Details							
Means of verification: Encuestas							
Observations: valores de línea base y metas a ser medidos previo al inicio de obras							
Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.4	Tiempo promedio de acceso a mercados de consumo por parte de mujeres	minutos	0.00	2018	2026	P	0.00
						A	
Details							
Means of verification: Encuestas							
Observations: Se medirá en encuestas de forma desagregada a usuarios (genero, grupo étnico, ingreso, ubicación, edad, etc)							
Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.5	Tiempo promedio de acceso a los centros de salud y educación por grupo étnico	minutos	0.00	2018	2026	P	0.00
						A	
Details							
Means of verification: Encuestas							
Observations: valores de línea base y metas a ser medidos previo al inicio de obras							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		Yes		
The General Development bjective indicator target is		No					

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.6	Tiempo promedio de acceso a los mercados de consumo por grupo étnico	minutos	0.00	2018	2026	P	0.00
						A	

Details

Means of verification: Encuestas

Observations: Se medirá en encuestas de forma desagregada a usuarios (ingreso, ubicación, edad, etc)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

The General Development
Objective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Reducción de los costos de operación vehicular en los tramos viales intervenidos por el proyecto

Observation: Evaluación económica ex post deberá incluirse en el informe final del proyecto

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.0	Reducción de Costos de Operación Vehicular	Porcentaje	100.00	2018	P		60.00
					A		
Details							
Means of verification: HDM4-VOC							
Observations: Estudio de Costos de Operación Vehicular en base al HDM4-VOC del modelo RED							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reducción de los tiempos de viaje de los usuarios en los tramos intervenidos por el proyecto

Observation: Evaluación económica ex post deberá incluirse en el informe final del proyecto

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.0	Reducción de tiempos de viaje	Porcentaje	100.00	2018	P		55.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuestas							
Observations: Siguiendo la misma metodología que en la evaluación ex ante							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incremento de la movilidad sostenible en los tramos intervenidos por el proyecto

Observation: Evaluación económica ex post deberá incluirse en el informe final del proyecto

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.3	Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA)	Porcentaje	100.00	2018	P		150.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación económica ex post							
Observations: La evaluación deberá incluirse en el informe final del proyecto.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.4	Aumento del número de días por año que las	No. Días	280.00	2018	P		365.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.4	carreteras están en operación	No. Días	280.00	2018	A		
Details							
Means of verification: Cantidad de precipitaciones							
Observations: Reportes servicio meteorológico							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Specific Development Objectives Nbr. 4: Desarrollo de capacidades y preinversión

Observation: Pliegos de Licitaciones realizadas

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
4.0	Número de licitaciones de proyectos con adicionalidad en resiliencia de la infraestructua al Cambio Climático y Seguridad vial	No. Licitaciones	0.00	2018	P		7.00
					A		
Details							
Means of verification: Pliegos de licitaciones realizadas							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en la RVN

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
1.1	Mejoramiento de Tramos Carreteros	Km	P		145.05	18,039,522	127,813,147
			P(a)		145.05	18,039,522	127,813,147
			A		0	0	0
1.2	Construcción puente vehicular Chitomax, Caserio Chitomax	Puente	P		1	3,306,032	17,186,853
			P(a)		1	3,306,032	17,186,853
			A		0	0	0

Component Nbr. 2 Desarrollo de capacidades y preinversión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
2.1	Estudios de preinversión para mejoramiento de tramos carreteros	Estudios	P		4	132,388	989,000
			P(a)		4	132,388	989,000
			A		0	0	0
2.2	Herramientas de Gestión de Proyectos Viales Fortalecidas durante la vida del Proyecto	Herramientas	P		2	293,989	2,646,000
			P(a)		2	293,989	2,646,000
			A		0	0	0
2.3	Unidad Coordinadora de Proyectos BID Fortalecida mediante la Adquisición de Equipo y Mejoramiento de Instalaciones	UCP	P		1	278,000	575,000
			P(a)		1	278,000	575,000
			A		0	0	0
2.4	Plan Anual de Capacitaciones Implementado	Plan	P	1	5	10,000	90,000
			P(a)	1	5	10,000	90,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración, Auditoría y Evaluación	P			21,111	700,000
		P(a)			21,111	700,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			22,081,042	150,000,000
		P(a)			22,081,042	150,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Construcción puente vehicular Chitomax, Caserío Chitomax	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	CAGUIRRE	09/28/2021
			Modify Means of Verification	CAGUIRRE	09/28/2021
	Herramientas de Gestión de Proyectos Viales Fortalecidas durante la vida del Proyecto	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	CAGUIRRE	09/28/2021
			Modify Means of Verification	CAGUIRRE	09/28/2021
	Mejoramiento de Tramos Carreteros	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	CAGUIRRE	09/28/2021
			Modify Means of Verification	CAGUIRRE	09/28/2021
	Plan Anual de Capacitaciones Implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	CAGUIRRE	09/28/2021
			Modify Means of Verification	CAGUIRRE	09/28/2021
	Unidad Coordinadora de Proyectos BID Fortalecida mediante la Adquisición de Equipo y Mejoramiento de Instalaciones	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	CAGUIRRE	09/28/2021
			Modify Means of Verification	CAGUIRRE	09/28/2021

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Governance Framework
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Materialized		Planning
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Materialized		Governance Framework
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
