

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	RG-L1131	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/21/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	10/22/21
<b>Last Update</b>	10/05/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	11/04/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	COMPREHENSIVE SANITATION PROGRAM FOR THE CITIES OF THE URUGUAY RIVER BASIN – PROVINCE OF ENTRE RÍOS	<b>Loan Number</b>	4822/OC-RG
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
<b>Team Leader</b>	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Regional
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	PROVINCIA DE ENTRE RÍOS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	La operación comenzó su ejecución en febrero de 2021 y aún no hay obras en ejecución. La UCP y los municipios contrataron especialistas que realizan el seguimiento socioambiental. Al momento se está avanzando con la identificación de predios y en algunos casos con los trámites de expropiación y cesión de otros predios. Los EIAs presentados hasta el momento para Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay presentan un adecuado abordaje de los temas y medidas de mitigación. Se cuenta con autorizaciones ambientales para Concordia y Gualeguaychú. Para los demás proyectos está en trámite. Los proyectos verterán al río Uruguay, o a alguno de sus afluentes, se requiere que la Comisión Administradora del Río Uruguay les otorgue aprobación.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
RG-L1131	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	25,582	0.03%	79,974,418
<b>Aggregated</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>25,582</b>	<b>0.03%</b>	<b>79,974,418</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

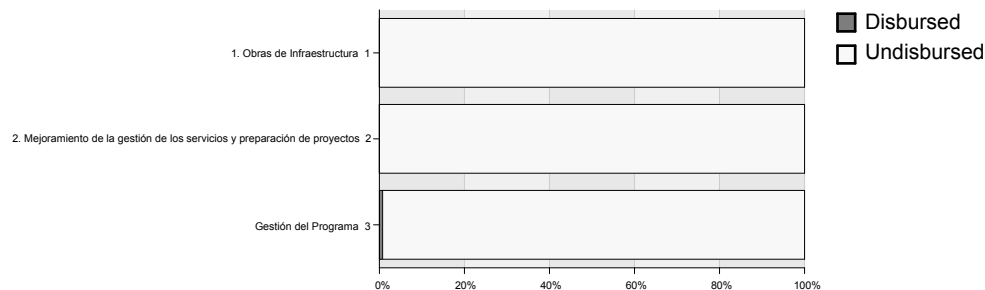

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

No information available for this section

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Objetivo Especifico 1: ampliar la cobertura de desagües cloacales y el tratamiento de las aguas residuales

**Observation:** Resultados esperados: 1- Carga contaminante vertida al río Uruguay disminuida y 2-Cobertura de los servicios de saneamiento ampliada y mejorada

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Caudal medio anual efectivo de aguas residuales tratado	m3/seg	0.39	2021	P				0.48	1.36	1.36
					A						

#### Details

**Means of verification:** informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.

**Observations:** se considerará "aguas residuales tratadas" si el efluente de salida cumple con los parámetros de diseño adoptados en cada proyecto y considerando tipo de tratamiento (pretratamiento/tratamiento primario y/o secundario, según corresponda). El caudal estimado para las metas será el caudal medio anual según diseño de las obras

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Cantidad de materia orgánica removida de los vertidos al río Uruguay	DBO(ton/año)	2,091.00	2021	P					6,637.00	6,637.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Hogares con acceso efectivo a sistemas de saneamiento en las ciudades de intervención del Programa	# of households	63,403.00	2021	P					116,336.00	116,336.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe emitidos por los Municipios / Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente

**Observations:** La rehabilitación comprende reconstrucción, reparación, y mejoramiento de las condiciones del sistema cloacal.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.3	Hogares cuyos efluentes cloacales son tratados en las ciudades de intervención del Programa	# of households	24,268.00	2021	P					116,336.00	116,336.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe emitidos por los Municipios / Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente

**Observations:** corresponde a hogares que cuentan con acceso al sistema de tratamiento adecuado

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo Específico 2: mejorar la capacidad de gestión de los servicios.

**Observation:** Resultados esperados: 3- Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados y 4- Enfoque de género incorporado en las prácticas de los operadores

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Operadores con Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración >= 1).	0.00	2021	P			40.00	60.00	80.00	80.00
				A						

#### Details

**Means of verification:** Informes emitidos por los Municipios

**Observations:** Estados financieros auditados anuales de los operadores y PGRs de los operadores.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Porcentaje de Operadores que implementan al menos una acción de mejora prevista en la estrategia de Género.	0.00	2021	P					40.00	40.00
				A						

#### Details

**Means of verification:** Mediante la Estrategia de Género validada y aprobada por las autoridades de la empresa.

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Porcentaje de mujeres que concluyen satisfactoriamente las capacitaciones de inserción laboral	0.00	2021	P					60.00	60.00
				A						

#### Details

**Means of verification:** Planilla de asistencia de las capacitaciones dictadas

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Obras de Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.1	Colectores principales operando adecuadamente	Km	P	0	51.16	150,603.52	12,516,044.7
			P(a)	0	51.16	150,603.52	12,516,044.7
			A		0	0	0
1.2	Redes cloacales finas operando adecuadamente	Km	P	0	27	8,290.85	2,180,583.14
			P(a)	0	27	8,290.85	2,180,583.14
			A		0	0	0
1.3	Estaciones de bombeo operando adecuadamente	Estaciones	P	0	40	204,102.32	11,141,537.38
			P(a)	0	40	204,102.32	11,141,537.38
			A		0	0	0
1.4	Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes cloacales construidos (planta) y Emisario	Sistema	P	0	5	806,376.06	46,512,528.94
			P(a)	0	5	806,376.06	46,512,528.94
			A		0	0	0

## Component Nbr. 2 Mejoramiento de la gestión de los servicios y preparación de proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.1	Planes de Gestión por Resultados de los operadores de servicios implementados	Planes	P	0	5	0	2,300,000
			P(a)	0	5	0	2,300,000
			A		0	0	0
2.2	Estudios de fortalecimiento provincial y municipal desarrollados	Estudios	P	0	3	0	1,450,000
			P(a)	0	3	0	1,450,000
			A		0	0	0
2.3	Proyectos ejecutivos elaborados/Estudios complementarios de factibilidad y diseño elaborados	Proyectos	P	0	3	0	500,000
			P(a)	0	3	0	500,000
			A		0	0	0
2.4	Diagnóstico y Estrategia de Género para empresas operadoras elaborada, validada y aprobada	Diagnóstico	P	0	5	0	25,000
			P(a)	0	5	0	25,000
			A		0	0	0
2.5	Capacitaciones de inserción laboral realizadas	# capacitaciones	P	0	5	0	25,000
			P(a)	0	5	0	25,000
			A		0	0	0

## Other Cost

	Administración del Programa	P			195,983.45	2,800,000
		P(a)			195,983.45	2,800,000
		A			24,099.5	24,099.5
	Auditorías y Evaluaciones	P			0	400,000
		P(a)			0	400,000
		A			0	0
	Imprevistos	P			0	149,305.84
		P(a)			0	149,305.84
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			1,365,356.2	80,000,000
		P(a)			1,365,356.2	80,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			24,099.5	24,099.5
--	------------	---	--	--	----------	----------

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Planning
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	1.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	1.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Technical Design
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	2.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Governance Framework
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	3.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	3.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Human Resources
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	7.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

**RISKS AND PLANNED RESPONSES**

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
